



## Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2015 r. z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

<b>1. Realizacja i analiza postępów .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Informacje finansowe .....</b>	<b>21</b>
<b>1.3 Analiza jakościowa .....</b>	<b>22</b>
<b>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych .....</b>	<b>31</b>
<b>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu .....</b>	<b>33</b>
<b>4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu .....</b>	<b>33</b>
<b>4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych. 33</b>	
<b>4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej .....</b>	<b>33</b>
<b>5. Informacja o realizacji dużych projektów .....</b>	<b>37</b>
<b>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej .....</b>	<b>42</b>
<b>7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji .....</b>	<b>47</b>
<b>8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej .....</b>	<b>48</b>

Informacje wstępne

<b>PROGRAM OPERACYJNY</b>	<b>Cel:</b> Konwergencja
	<b>Kwalifikowany obszar:</b> Polska, województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
	<b>Okres programowania:</b> 2007-2013
	<b>Numer programu (CCI):</b> CCI 2007 PL 161 PO 003
	<b>Nazwa programu:</b> Rozwój Polski Wschodniej
<b>SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU</b>	<b>Numer sprawozdania:</b> I/2015/PO RPW
	<b>Okres sprawozdawczy:</b> 1 stycznia – 30 czerwca 2015 r.

## 1. Realizacja i analiza postępów

### 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego<sup>1</sup>

Do końca czerwca 2015 r. w ramach PO RPW zostało zakontraktowanych prawie 104% środków EFRR. **Zakończyła się realizacja 136<sup>2</sup>** spośród 308 podpisanych umów o dofinansowanie<sup>3</sup>.

Jednymi z głównych rodzajów wspieranych w ramach PO RPW działań są projekty z zakresu **infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej**, realizowane przez uczelnie, które kształcą studentów i prowadzą badania naukowe, przede wszystkim w obszarze nauk technicznych i matematyczno-przyrodniczych. Ponadto, wspierane są projekty infrastrukturalne uczelni polegające m.in. na budowie i przebudowie oraz wyposażeniu w sprzęt naukowo-badawczy obiektów dydaktycznych, laboratoriów, pracowni komputerowych i bibliotek. W sumie **21 szkół wyższych** zrealizowało 42 projekty, z czego:

- **20** projektów dotyczyło wsparcia **infrastruktury dydaktycznej**, z których skorzystało już ponad **90 tys. studentów**,
- **22** projekty polegały na zakupie **specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego i badawczego** o wartości **ok. 723 mln zł**, co w efekcie przyczyniło się do utworzenia **107,13 nowych etatów badawczych**.

W celu stworzenia warunków dla wzrostu gospodarczego, w makroregionie Polski Wschodniej wsparto działania wpływające na **rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości**. Polegały one m.in. na uzbrojeniu ponad **283 ha terenów inwestycyjnych w 16 miejscowościach<sup>4</sup>**. Na terenach tych ulokowało się już **blisko 100 inwestorów**, którzy prowadzą działalność o charakterze innowacyjnym i tworzą nowe miejsca pracy. PO RPW dał przedsiębiorcom także możliwość prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej poprzez m.in. tworzenie zaplecza B+R w przedsiębiorstwach.

Ze środków Programu doposażono infrastrukturę **11 parków naukowo-technologicznych**. Z ich wsparcia skorzystało dotychczas ponad 330 podmiotów gospodarczych, którzy dzierżawili lub wynajmowali ok. 70% dostępnej powierzchni parków. Przedsiębiorcy najczęściej korzystali z aparatury naukowo-badawczej znajdującej się w ww. parkach w celu realizacji **prac naukowych i rozwojowych** w dziedzinach: **medycyna i zdrowie, nauki rolnicze i techniczne**, które wpisują się w inteligentne specjalizacje gospodarcze Polski Wschodniej. Lokalizacja przedsiębiorstw w parku pozytywnie wpłynęła także na zwiększenie rozpoznawalności marki oraz umocnienie pozycji firmy na głównym rynku jej działalności<sup>5</sup>.

PO RPW zapewnił możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwom, szczególnie tych na wczesnym etapie działalności. Do końca czerwca 2015 r., ponad **2,5 tys. przedsiębiorców**, w tym ponad 2 tys. mikroprzedsiębiorców, otrzymało wsparcie w postaci pożyczek lub poręczeń na łączną kwotę ponad **192 mln zł**. Przedsiębiorcy ci stworzyli ponad **2 tys. miejsc pracy**. Pozyskane środki przedsiębiorstwa przeznaczają na wyposażenie, zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych,

<sup>1</sup> W niniejszej analizie odwołano się do wartości wskaźników pochodzących z Programu zaakceptowanego przez Komisję Europejską w dniu 28 czerwca 2012 r.

<sup>2</sup> 136 umów (z zatwierdzonym wnioskiem o płatność końcową) w ramach PO RPW, w tym w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW - 120 projektów.

<sup>3</sup> 308 umów o dofinansowanie, w tym w ramach osi priorytetowych I-V PO RPW - 290 umów. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym liczba umów zmniejszyła się – rozwiązano 3 umowy na projekty konkursowe w ramach działania II.1.

<sup>4</sup> W Ełku, Elblągu, Kolnie, Zambrowie, Łukowie, Lubartowie, Międzyrzeczu Podlaskim, Janowie Lubelskim, Lublinie, Czarnej Białostockiej, Kielcach, Krośnie, Szczepańcowej k/Krosna, Łańcucie, Olsztynie i Puławach).

<sup>5</sup> Wniosek z ewaluacji „Wsparcie ośrodków innowacyjności w Polsce Wschodniej – ocena pierwszych efektów”, PARP, Warszawa 2014 r.

usługowych bądź handlowych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Rozwój przedsiębiorczości w makroregionie nastąpił także dzięki tworzeniu sieci współpracy zorientowanej na prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej poprzez tworzenie klastrów. W efekcie powstało **15 klastrów m.in. z obszaru budownictwa, branży metalowej, turystyki, e-usług, energetyki**<sup>6</sup>. Powstanie klastrów jest wynikiem współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi. Dzięki realizacji projektów klastrowych możliwe było zintensyfikowanie współpracy partnerów obejmujące m.in. wymianę wiedzy o sposobach produkcji oraz wypracowanie wspólnych produktów klastra.

Przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej, dzięki wsparciu z Programu, mieli też możliwość promowania oferty eksportowej i pozyskiwania nowych kontraktów handlowych poprzez uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych, co przełożyło się na wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą makroregionu. Dzięki licznym targom i misjom wyjazdowym **zawarto kontrakty na łączną kwotę ponad 407 mln zł**. Najczęściej były to firmy z sektora spożywczego, następnie z branży technologii informatycznych i komunikacyjnych, przemysłu morskiego oraz sektora meblowego i lotniczego.

PO RPW odpowiedział także na szczególne potrzeby miast wojewódzkich jako regionalnych ośrodków rozwoju: głównych rynków pracy i centrów świadczenia usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Z uwagi na wzmożoną mobilność, w celu podniesienia komfortu funkcjonowania i życia w miastach, Program współfinansował tworzenie **zintegrowanych systemów transportu zbiorowego**. Do końca czerwca 2015 r. w projektach z zakresu transportu miejskiego<sup>7</sup> zakupiono **423 szt. ekologicznego taboru pasażerskiego**, w tym zakupiono **70 trolejbusów** i rozpoczęto dostawę **15 tramwajów w Olsztynie**. Ponadto wdrożono **12 systemów ITS**, w tym zarządzania ruchem i informacji pasażerskiej. W Olsztynie trwa budowa **11 km nowej sieci tramwajowej**, a w Lublinie wybudowano prawie **28 km nowej sieci trolejbusowej**.

Profesjonalnie zorganizowane centra wystawienniczo-konferencyjne są doskonałym miejscem na promowanie regionu oraz kraju, zarówno pod względem gospodarczym jak i turystycznym. Tego typu obiekty zostały dofinansowane ze środków PO RPW. Spośród 6 realizowanych inwestycji, zakończono budowę **3 obiektów wystawienniczo-konferencyjnych** dysponujących powierzchnią ponad **112 tys. m<sup>2</sup>**. Do końca czerwca 2015 r. w tych obiektach zorganizowano **93 imprezy targowo-wystawiennicze**, w tym 37 wydarzeń o charakterze międzynarodowym oraz 34 imprezy o znaczeniu krajowym. W zorganizowanych wydarzeniach uczestniczyło ponad **334 tys. osób** podczas, których zaprezentowało się blisko **7 tys. wystawców** działających m.in. w branżach: motoryzacyjnej, sportowo-rekreacyjnej, budowlanej, energetycznej, obróbki drewna, technologii laserowych, przemysłu obronnego.

Dla rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców istotne jest także zwiększenie dostępności transportowej makroregionu. Dlatego blisko 1/3 alokacji na Program przeznaczono na wsparcie projektów **infrastruktury drogowej**. Wybudowano i przebudowano łącznie ponad **138 km dróg** w makroregionie, w tym ukończono budowę **9 obwodnic**<sup>8</sup>. Realizacja inwestycji w zakresie obwodnic miast w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich zapewniła usunięcie tzw. „wąskich gardeł” w sieci drogowej Polski Wschodniej. Ponadto, w ramach Programu wsparto **2 inwestycje mostowe na Wiśle** tj. most w Kamieniu łączący województwo mazowieckie i lubelskie oraz most w Połańcu, stanowiący połączenie województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego.

<sup>6</sup> Na koniec czerwca 2015 r. zakończono realizację 12 projektów.

<sup>7</sup> Biorąc pod uwagę także projekty niezakończone.

<sup>8</sup> Frampola, Jarosławia, Przemyśla, Kolbuszowej, Mielca, Stawisk, Jędrzejowa, Osieka i Mrągowa.

Dzięki zakończonym inwestycjom drogowym wykazano **oszczędność czasu w przewozach** (towarowych i pasażerskich) w wysokości **ok. 52 mln euro**. Inwestycje te zwiększyły dostępność do sieci dróg krajowych oraz międzynarodowych, a także do terenów inwestycyjnych, przedsiębiorstw, atrakcji turystycznych, przejść granicznych. Ww. projekty przyczyniają się także do lepszej drożności komunikacyjnej wewnątrz regionu, a ponadto pozytywnie wpłynęły na komfort życia mieszkańców redukując ruch w miastach i tym samym poprawiając bezpieczeństwo.

W PO RPW przeznaczono także środki na promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki w celu wzrost zainteresowania ofertą turystyczną województw Polski Wschodniej. W tym celu zrealizowano kampanię skierowaną do turystów krajowych (w tym mieszkańców Polski Wschodniej) i zagranicznych (Niemcy, Ukraina). Skupiała się przede wszystkim na prezentacji wybranych produktów turystyki aktywnej i specjalistycznej. Ponadto, na wzrost rozwoju turystyki mają mieć wpływ budowane (430 km) i oznakowywane (2 tys. km) trasy rowerowe w makroregionie, które umożliwią turystom aktywne zwiedzanie ciekawych miejsc i zabytków Polski Wschodniej.

Efektom zakończonych dotychczas projektów było **utworzenie u beneficjentów blisko 1,6 tys. nowych etatów**<sup>9</sup>. Dotyczy to stanowisk utworzonych wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, z gwarancją zatrudnienia przez minimum 2 lata i nie związanych wyłącznie z obsługą projektu<sup>10</sup>. Nie jest to ostateczna liczba nowych miejsc pracy, która powstała w ramach dotychczas zakończonych projektów, ponieważ dodatkowe etaty mogą powstać w kolejnych latach po zakończeniu realizacji projektów.

### **Analiza wskaźnikowa**

Do końca czerwca 2015 r. zakończono realizację 136 umów wykorzystując 35% alokacji z PO RPW i osiągając wartości wskaźników w przedziale od 12% do 419%. Zakończenie realizacji pozostałych projektów przewidywane jest na trzeci i czwarty kwartał 2015 r. Uwzględniając czas trwania procesu rozliczania projektów, należy mieć na uwadze fakt, że wnioski o płatność końcową mogą zostać zatwierdzone i wprowadzone do systemu KSI SIMIK dopiero w 2016 r. Oznacza to, że formalnie wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte w 2016 r. Prognozuje się, że w przypadku wszystkich wskaźników programowych (z wyjątkiem jednego<sup>11</sup>) zostaną osiągnięte ich zakładane wartości docelowe powyżej 75%.


<sup>9</sup> Dotyczy wskaźnika *liczba utworzonych miejsc pracy brutto*.

<sup>10</sup> Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej: *The Programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Reporting on Core Indicators for the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund. Working Document No. 7.*


<sup>11</sup> W analizie odniesiono się do wartości docelowych wskaźników PO RPW zaplanowanych do osiągnięcia w 2015 r. Poniżej 75% wartości docelowej w 2015 r. może osiągnąć tylko wskaźnik rezultatu dla osi IV PO RPW *oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych*.

**Oś I Nowoczesna gospodarka**

**Wykres 1. Osiągnięta i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników produktu w osi I**

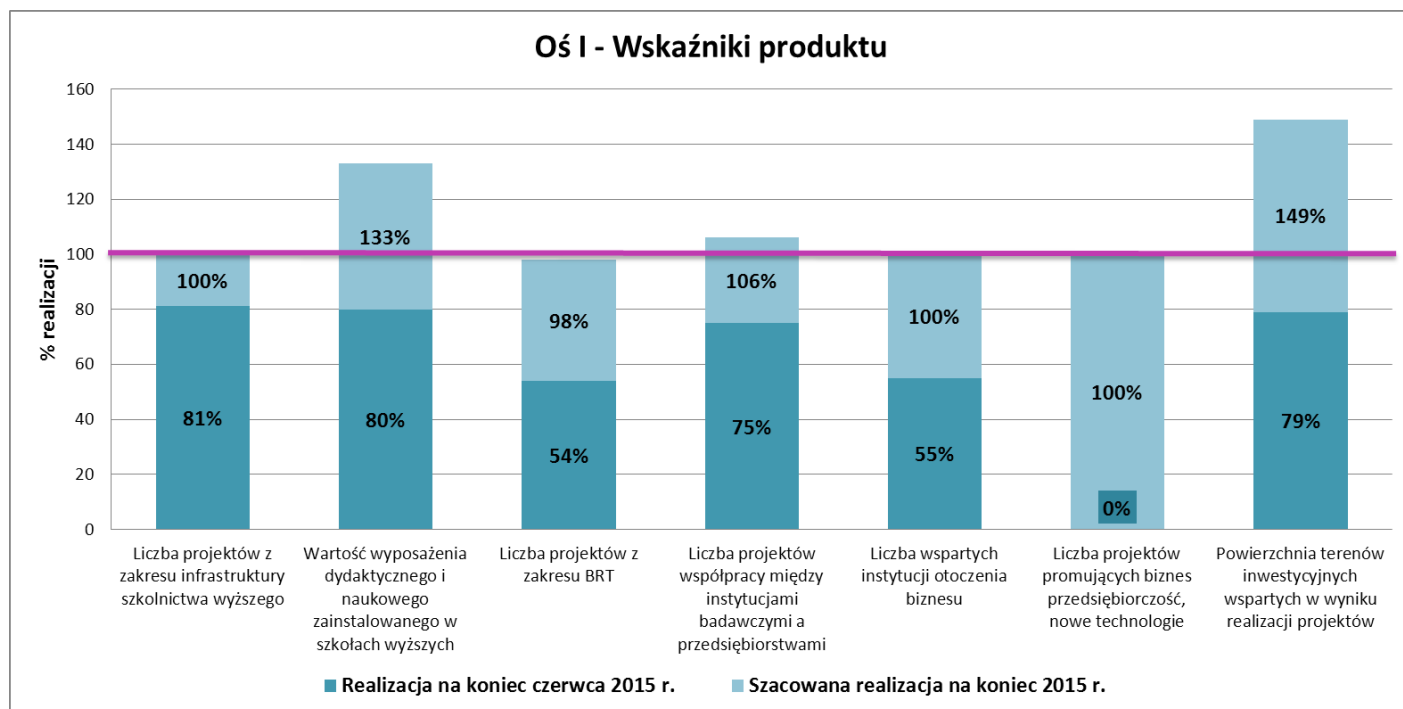

**Wykres 2. Osiągnięta i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników rezultatu w osi I**

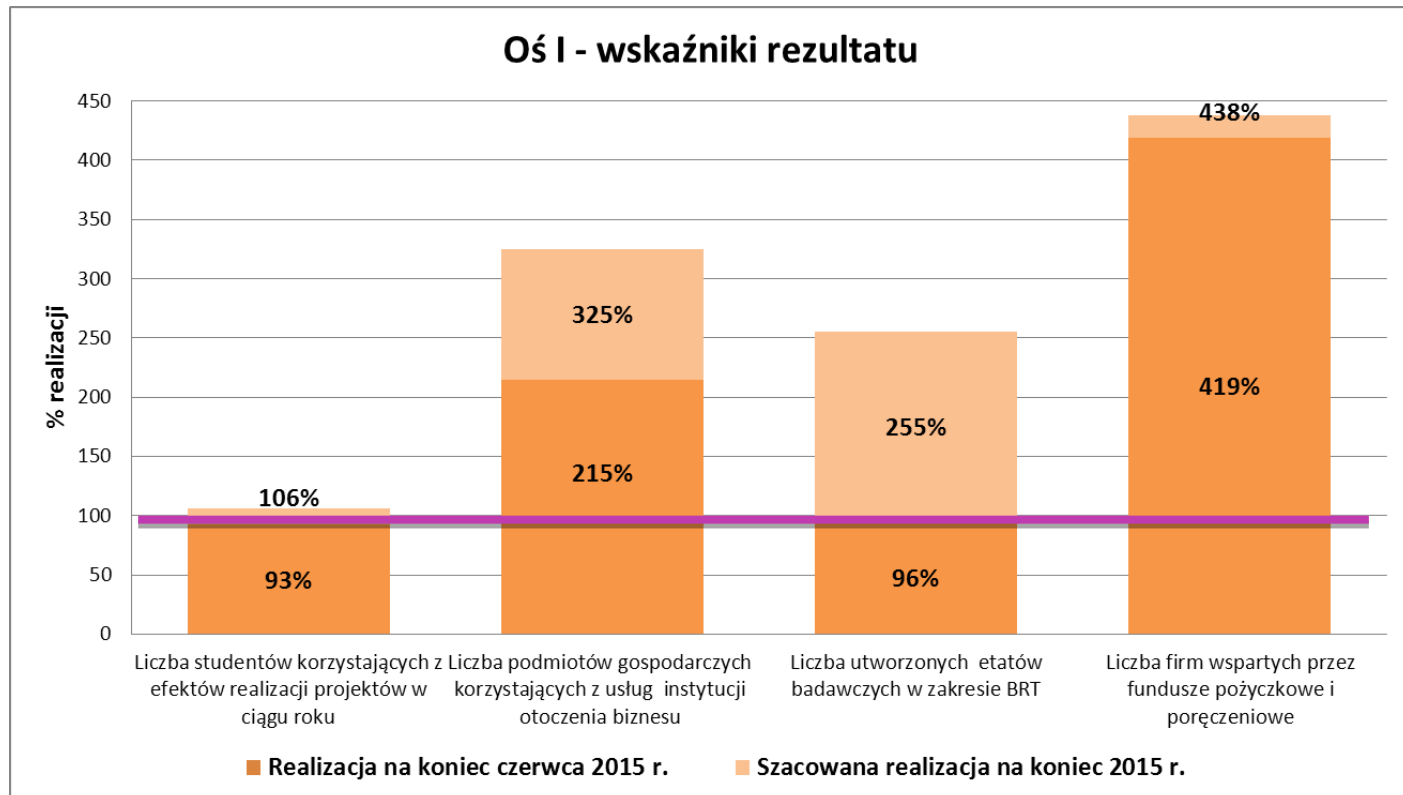

Zgodnie z szacunkami w przypadku I osi priorytetowej *Nowoczesna gospodarka* wartości wskaźników powinny wynieść w 2015 r. od 98% do 438% wartości docelowej. W przypadku pięciu wskaźników ich wartości docelowe zostaną osiągnięte powyżej 125%. Spowodowane jest to :

- większym niż zakładano zainteresowaniem beneficjentów określonymi formami wsparcia (środki na wyposażenie uczelni i utworzenie terenów inwestycyjnych, korzystanie z pożyczek i poręczeń przez przedsiębiorców, usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu dla przedsiębiorców)
- weryfikacją i uzupełnieniem wartości wskaźników w KSI SIMIK 07-13.

Tabela 1. Wskaźniki w osi I wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej

Oś priorytetowa I <i>Nowoczesna gospodarka</i>	Wartość wskaźnika	Realizacja na koniec VI 2015 r. (liczba wskaźników)	Szacowana realizacja na koniec 2015 r. (liczba wskaźników)
	Poniżej 75%	5	0
	75-100%	5	4
	101-125%	0	2
	Powyżej 125%	1	5

#### Oś II *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego*

Wartości wskaźników dla II osi priorytetowej *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* powinny wynieść w 2015 r. powyżej 100% wartości docelowej. W przypadku dwóch wskaźników szacowane wartości będą wyższe niż 125% ich wartości docelowej. Jest to spowodowane rozszerzeniem zakresu osi II o projekty konkursowe dotyczące budowy sieci dostępowej tzw. „ostatniej mili” i podpisaniem na nie 85<sup>12</sup> umów o dofinansowanie w 2014 r. w ramach dwóch rozstrzygniętych naborów.


Tabela 2. Wskaźniki w osi II wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej

Oś priorytetowa II <i>Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>	Wartość wskaźnika	Realizacja na koniec VI 2015 r. (liczba wskaźników)	Szacowana realizacja na koniec 2015 r. (liczba wskaźników)
	Poniżej 75%	4	0
	75-100%	0	1
	101-125%	0	1
	Powyżej 125%	0	2

<sup>12</sup> W związku z rozwiązaniem 7 umów, na koniec I półrocza 2015 r. realizowano 78 projektów konkursowych.

## Oś III Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Wykres 3. Osiągnięcia i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników produktu i rezultatu w osi III

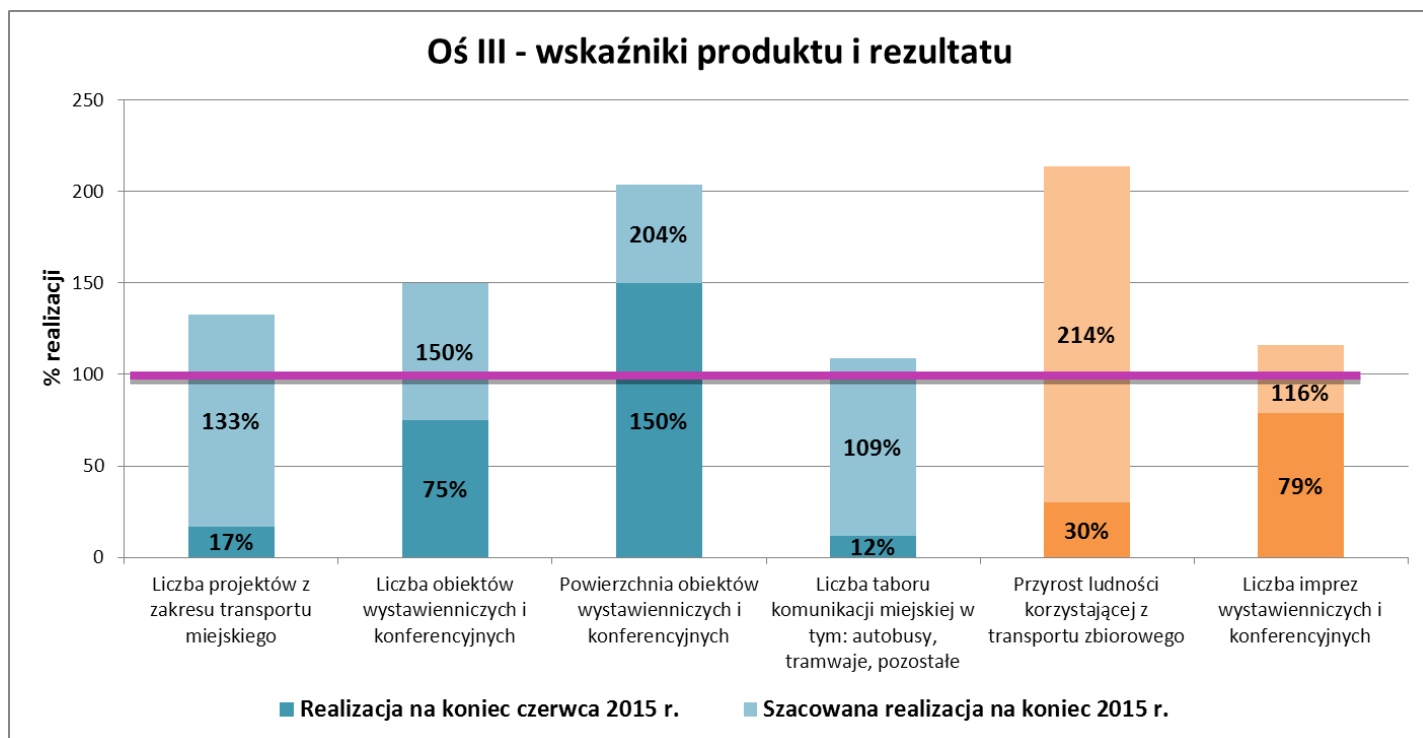

Wartości wskaźników dla III osi priorytetowej *Wojewódzkie ośrodki wzrostu* powinny zostać zrealizowane w 2015 r. na poziomie od 109% do 214%. Prognozuje się, że znacznie wyższe wartości od zakładanych (powyżej 125%) mogą osiągnąć cztery wskaźniki. Wyższe niż zakładane wartości wskaźników dot. projektów transportu miejskiego i obiektów wystawienniczych są skutkiem pojawienia się oszczędności. Dzięki temu możliwa była realizacja większej liczby projektów, niż to początkowo zakładano.


Tabela 3. Wskaźniki w osi III wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej

Oś priorytetowa III <i>Wojewódzkie ośrodki wzrostu</i>	Wartość wskaźnika	Realizacja na koniec VI 2015 r. (liczba wskaźników)	Szacowana realizacja na koniec 2015 r. (liczba wskaźników)
	Poniżej 75%	4	0
	75-100%	1	0
	101-125%	0	2
	Powyżej 125%	1	4



## Oś IV Infrastruktura transportowa

Wykres 4. Osiągnięta i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników produktu i rezultatu w osi IV

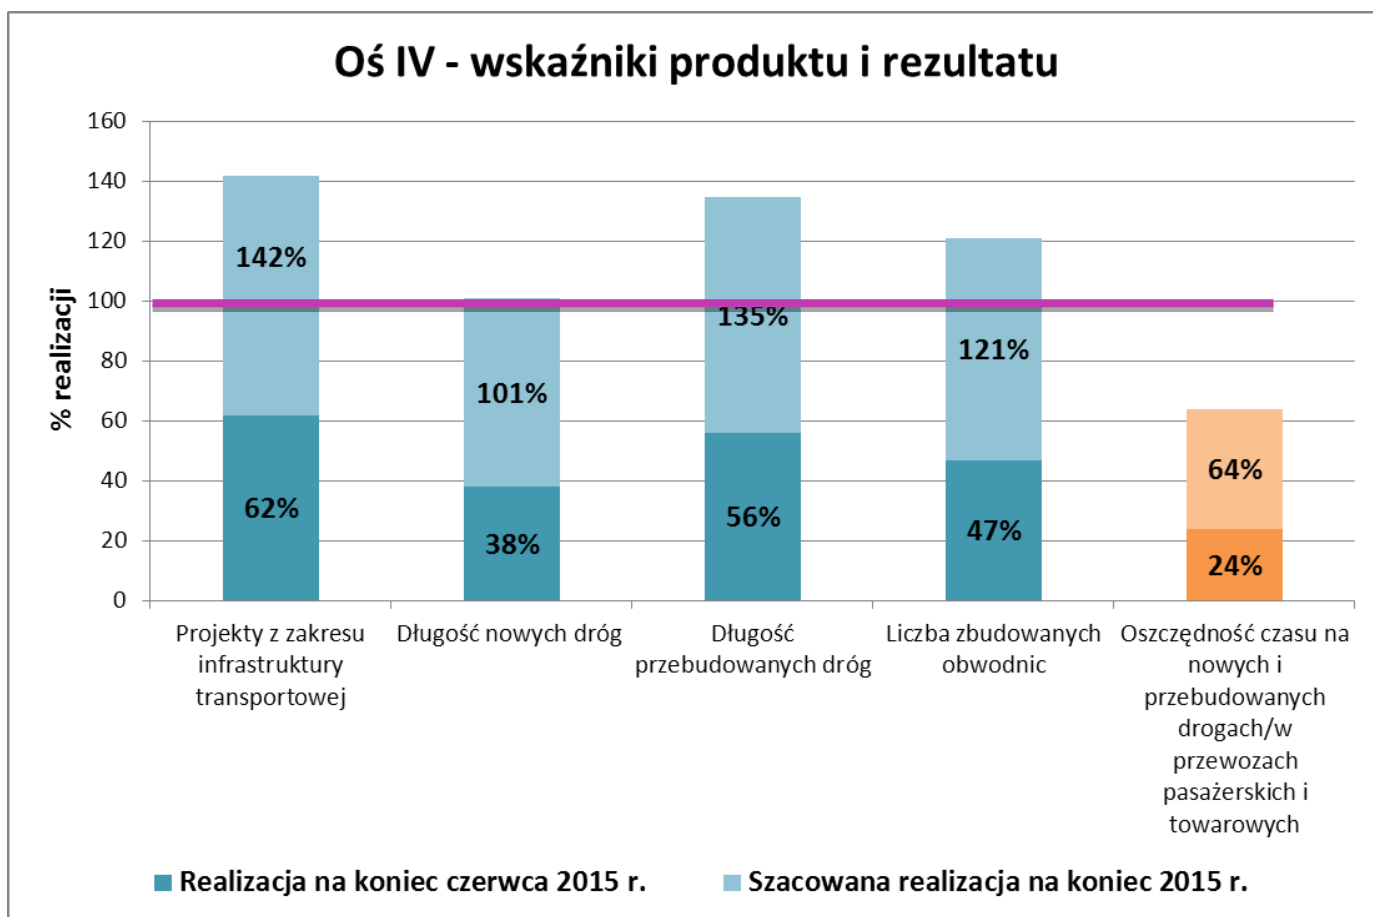

W przypadku IV osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* wartość wskaźników produktu zostaną osiągnięte między 101% a 142% ich wartości docelowej. Wartość powyżej 125% mogą osiągnąć dwa wskaźniki. Środki powstałe w wyniku oszczędności po przetargowych zostały przeznaczone na realizację dodatkowych projektów tym samym wpływając na długości przebudowanych dróg w makroregionie.

Wskaźnik rezultatu *oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* powinien zostać zrealizowany w 2015 r. na poziomie 64% wartości docelowej. Realizacja wartości docelowej wskaźnika na takim poziomie wynika ze specyfiki projektów drogowych. Rezultat ich realizacji można w pełni ocenić po roku od oddania do użytkowania inwestycji tj.:

- po ustabilizowaniu się ruchu,
- po przyzwyczajeniu się użytkowników do nowej drogi,
- po zaniku efektu euforii po otwarciu nowej inwestycji.

Z analizy otrzymywanych danych w zakresie natężenia ruchu można zaobserwować tendencję, że wraz z długością okresu użytkowania inwestycji rosną uzyskane w wyniku ich realizacji wartości wskaźnika rezultatu, stąd zakłada się, że wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta w 2018 r.

Tabela 4. Wskaźniki w osi IV wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej

Oś priorytetowa IV <i>Infrastruktura transportowa</i>	Wartość wskaźnika	Realizacja na koniec VI 2015 r. (liczba wskaźników)	Szacowana realizacja na koniec 2015 r. (liczba wskaźników)
	Poniżej 75%	5	1
	75-100%	0	0
	101-125%	0	2
	Powyżej 125%	0	2

**Oś V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne**


Wartości wskaźników produktu dla V osi priorytetowej *Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne* powinny zostać osiągnięte w blisko 100%. Wartość wskaźnika rezultatu *liczba udostępionych atrakcji turystycznych* może być nawet dwukrotnie wyższa od zakładanej ze względu na fakt, że jego wartość nie była możliwa do oszacowania bez znajomości przebiegu trasy rowerowej. Przebieg trasy zostały określony wstępnie w studium wykonalności odebranym w 2012 r., a następnie zweryfikowany w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej (w latach 2013-2014).

Tabela 5. Wskaźniki w osi V wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej

Oś priorytetowa V <i>Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne</i>	Wartość wskaźnika	Realizacja na koniec VI 2015 r. (liczba wskaźników)	Szacowana realizacja na koniec 2015 r. (liczba wskaźników)
	Poniżej 75%	3	0
	75-100%	1	3
	101-125%	0	0
	Powyżej 125%	0	1

## Oś VI Pomoc techniczna

Wykres 5. Osiągnięta i szacowana na koniec 2015 r. realizacja wskaźników produktu i rezultatu w osi VI

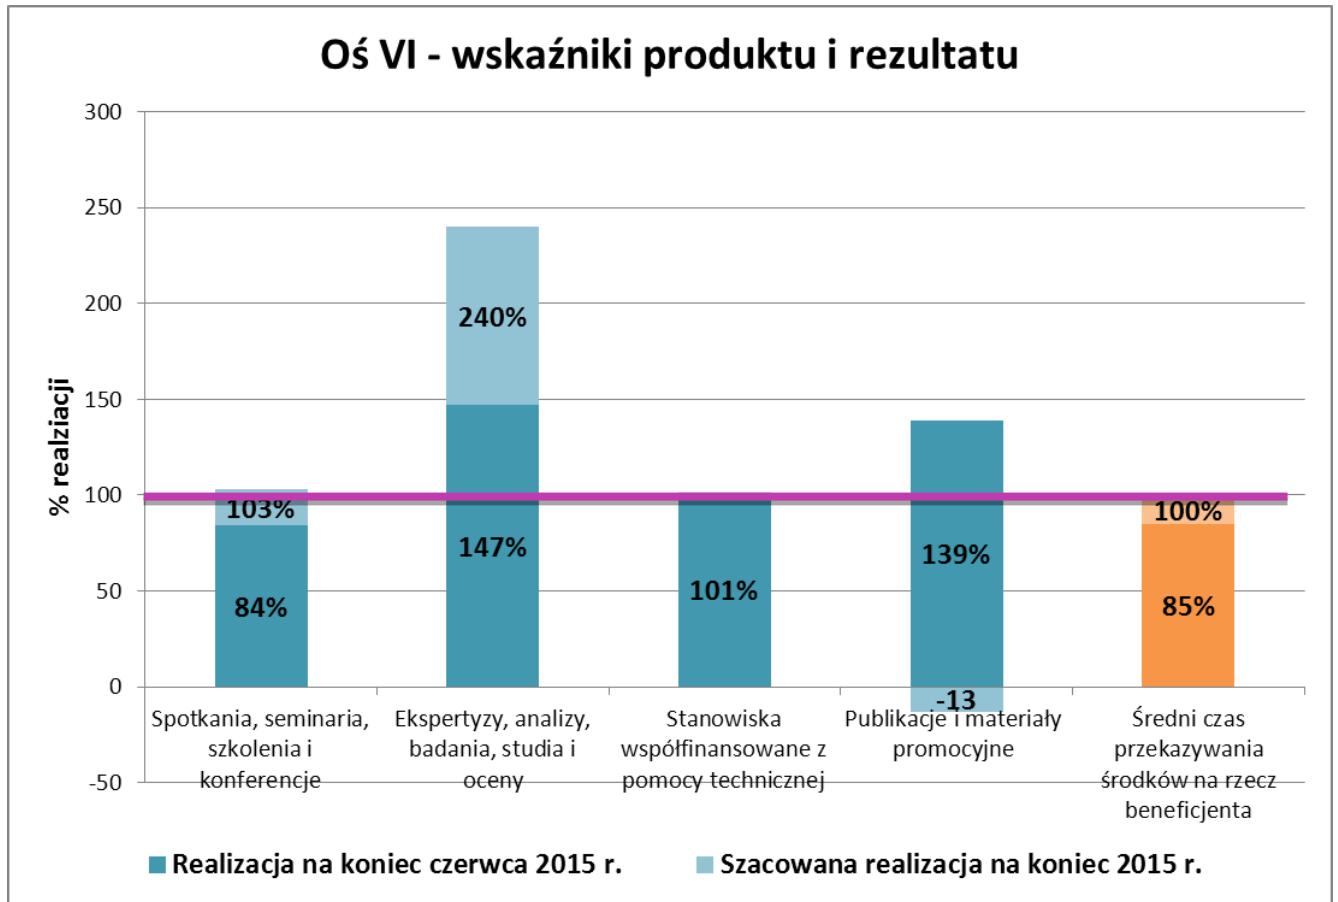

W przypadku wskaźników z VI osi priorytetowej *Pomoc techniczna* ich wartości docelowe zostaną osiągnięte na poziomie od 101% do 240%. Wysoka szacowana na 2015 r. wartość wskaźnika *liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen* (240%) wynika z faktu, że IP zlecała ekspertom zewnętrznym oceny wniosków o dofinansowanie projektów, które były wliczane do wartości tego wskaźnika.

Tabela 6. Wskaźniki w osi VI wg osiągniętego i szacowanego poziomu realizacji wartości docelowej

Oś priorytetowa VI <i>Pomoc techniczna</i>	Wartość wskaźnika	Realizacja na koniec VI 2015 r. (liczba wskaźników)	Szacowana realizacja na koniec 2015 r. (liczba wskaźników)
	Poniżej 75%	0	0
	75-100%	2	1
	101-125%	1	1
	Powyżej 125%	2	1

Szczegółowe informacje na temat realizacji wartości docelowych poszczególnych wskaźników oraz szacowanej ich realizacji w 2015 r. znajdują się w Tabeli 1.

Tabela 7. Postęp rzeczowy programu operacyjnego<sup>13</sup>

Wskaźniki <sup>a)</sup>	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Liczba utworzonych miejsc pracy netto	osoby		Realizacja <sup>b)</sup>	Wartość docelowa wskaźnika na 2013 r. została oszacowana <i>ex-ante</i> w 2006 r. i IZ PO RPW planuje jej weryfikację <i>ex post</i> na zakończenie realizacji Programu po 2015 r.																		
			Wart. docelowa <sup>c)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 610	-	-	-	zostanie oszacowana po 2015 r.
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja <sup>d)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (w tym na obszarach wiejskich)	osoby	P.100 R.100  ( <i>core indicator: 01 jobs created</i> )	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 (0)	50,5 (5,7)	83,5 (9,4)	148,4 (16,6)	317,4 (23)	836,4 (274)	1362,2 (274)	1582,74 (299) <sup>e)</sup>		
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2200 (200)	-	-	2500 (280)	
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			4054 (420,8)
Wpływ zaangażowanych środków PO RPW na wzrost PKB w stosunku do roku bazowego	%		Realizacja	Wartość docelowa wskaźnika na 2013 r. została oszacowana <i>ex-ante</i> w 2006 r. i IZ PO RPW planuje jej weryfikację <i>ex post</i> na zakończenie realizacji Programu po 2015 r.																		
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38	-	-	zostanie oszacowana po 2015 r.
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
I oś priorytetowa – wskaźniki produktu																						
Liczba projektów z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego	szt.	nd	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	7	8	13	17	21		
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	26	
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			26

<sup>13</sup> W Tabeli 7. nie są powtarzane informacje zawarte w tabeli wskaźnikowej formularza sprawozdawczego dotyczącego promocji i informacji (wg wzoru z Załącznika II c do Wytucznych w zakresie sprawozdawczości), załączonego do sprawozdania (wskaźniki dot. informacji, promocji i szkoleń).

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
I oś priorytetowa– wskaźniki produktu																							
Wartość wyposażenia dydaktycznego i naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych	mln zł		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	11,2	29	103,8	160	346,8	410,8	611,4	666,8	722,96			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		600				900			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba projektów z zakresu BRT	szt.	<i>(core indicator: 04 number of RTD projects)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	9	18	25	28	31	35			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		46				65			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami	szt.	<i>(core indicator: 05 number of cooperation project enterprises-research institutions)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	9	12			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		5				16			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości itd.), w tym nowopowstałych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	4	6	6				
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		11				11			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba projektów promujących biznes przedsiębiorczość, nowe technologie	szt.	<i>(core indicator: 40 number of enterprises seeking to promote business, entrepreneurship, new technology)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		1				1			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																		0	1	

Wskaźniki	Jednos tka	Kod odpowiadają cego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
<b>I oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																							
Powierzchnia terenów inwestycyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (w tym parków naukowo-technologicznych)	ha	P.8.1.2 P.9.2.2	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0	0	19,01 (0)	42,2 (0)	95,3 (4,65)	115,6 (4,65)	115,6 (4,65)	144,2 (4,65)	197,4 (11,4)	205,8 (11,4)	281,22 (42,9)	283,45 (38,32) <sup>1)</sup>			
			<b>Wart. docelowa</b>	-		-		-		-		-		-		330 (180)		-		360 (189)			
			<b>Wart. bazowa</b>	0																			
			<b>Szacowana realizacja</b>																				537,33 (183,76)
<b>I oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Liczba studentów korzystających z efektów realizacji projektów w ciągu roku, z tego: - kobiety - mężczyźni	osoby	R.75.1.1. lub R.75.1.2 lub R.75.2.2. lub R.75.2.1 ( <i>core indicator: 37 number of benefiting students</i> )	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 8	164 8	4249	848 4	14059	15363	24 367	47 484	90 598		
			<b>Wart. docelowa</b>	-		-		-		-		-		-		-		95 400		-		96 900	
			<b>Wart. bazowa</b>	0																			
			<b>Szacowana realizacja</b>																				102 395
Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości)	szt.	R. 2.1.2 R. 2.1.3 R. 5.1.1	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	58	58	61	89	262	333		
			<b>Wart. docelowa</b>	-		-		-		-		-		-		-		155		-		155	
			<b>Wart. bazowa</b>	0																			
			<b>Szacowana realizacja</b>																				503
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie BRT – tylko etaty badawcze	szt.	R.101. ( <i>core indicator: 06 research jobs created</i> )	<b>Realizacja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20	36	53	93,8	99,3	97,13 <sup>8)</sup>		
			<b>Wart. docelowa</b>	-		-		-		-		-		-		-		67		-		112	
			<b>Wart. bazowa</b>	0																			
			<b>Szacowana realizacja</b>																				285,33

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>I oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																						
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe	szt.	R. 5.8.1 R. 5.8.3	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 <sup>h)</sup>	0	0		
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0		-		600		
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			
<b>II oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																						
Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	<i>(core indicator: 11 number of projects (Information society))</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0		-		5		
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			
Długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0		-		10 435		
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			
Liczba zainstalowanych węzłów	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0		-		1 062		
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			
<b>II oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																						
Obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego	%		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		0		-		49,67		
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																	0		

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
III oś priorytetowa – wskaźniki produktu																							
Liczba projektów z zakresu zintegrowanego, ekologicznego transportu miejskiego	szt.	<i>(core indicator: 13 number of projects (transport))</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		3		-		6			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3		
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		3		-		4			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Powierzchnia uruchomionych/zmodernizowanych obiektów wystawienniczych i konferencyjnych	m <sup>2</sup>		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 336	43 498	43 498	88 626	112 661			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		62 000		-		74 900			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej w tym: autobusy, tramwaje, pozostałe	szt.	P.25.2.1. P.52.2.1.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	48	48	48 (a-48, t,p-0)	48 (a-48, t,p-0)	48 (a-48, t,p-0)			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		245		-		389			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
III oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu																							
Przyrost ludności korzystającej z transportu zbiorowego	mln osób	<i>(core indicator: 22 additional population served with improved urban transport)</i>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,59	2,59	2,59	2,59			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		5		-		8,6			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				



Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
<b>III oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Liczba zorganizowanych imprez wystawienniczych i konferencyjnych, z tego: lokalne, krajowe, międzynarodowe	szt./rok		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	36	29 (I-5,k-10,m-14)	64 (I-17,k-25,m-22)	64 (I-17,k-25,m-22)		
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	81	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				94 (I-25,k-35,m-34)
<b>IV oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																							
Liczba projektów realizowanych z zakresu infrastruktury transportowej	szt.	(core indicator: 13 number of projects (transport))	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	8	9	13	16			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	26	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				37
Długość nowych dróg	km	P.22.3.1 P.23.1.1 P.22.1.1 (core indicator: 14 km of new roads)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,59	10,1 7	14,9 2	22,20	27,28	27,28	57,61	65,40			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,2	-	-	-	174,4		
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				176,3
Długość przebudowanych dróg	km	P.22.2.1 P.23.2.1 (core indicator: 16 km of reconstructed roads)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	22,23	22,2 3	22,2 3	22,94	31,56	33,03	37,56	72,82				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,9	-	-	-	129,7			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				175,71
Liczba zbudowanych obwodnic	szt.	P.22.3.1	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	6	9				
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	19			
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																	15	<b>17</b>		

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>IV oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																							
Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach/w przewozach pasażerskich i towarowych	mln euro	R.22.1.1, R.22.2.1; R.22.3.1; R.22.3.2; R.23.1.1; R.23.2.1. (core indicator: 20 value for time savings in euro/year stemming from new and reconstructed roads)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,58	8,28	8,70	21,06	29,68	29,68 <sup>j</sup>	40,39	52,32			
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		113,4		-		219,1	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
<b>V oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																							
Długość nowych utwardzonych ścieżek rowerowych	km	P.24.1.1.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		0		-		430	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Długość nowych wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych	km	nd	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		0		-		2000	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				
Liczba projektów z zakresu promocji turystycznej Polski Wschodniej	szt.	nd (core indicator: 34 number of projects (tourism))	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
			Wart. docelowa	-		-		-		-		-		-		-		1		-		1	
			Wart. bazowa	0																			
			Szacowana realizacja																				

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
<b>V oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu</b>																									
Liczba udostępionych atrakcji turystycznych	szt.	nd	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	200		
			Wart. bazowa																						
			Szacowana realizacja																					477	
<b>VI oś priorytetowa – wskaźniki produktu</b>																									
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji	szt.	P.86.1.2. P.86.1.2	Realizacja	0	0	0	5	24	91	165	165	228	228	285	285	330	330	362	362	376					
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	450		
			Wart. bazowa																						
			Szacowana realizacja																					462	
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen	szt.	P.86.1.1.	Realizacja	0	0	0	25	29	37	185	185	209	209	363	363	455	455	644	644	662					
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	450	
			Wart. bazowa																						
			Szacowana realizacja																						1 078
Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej	szt.	P.85.1.1.	Realizacja	0	0	0	26,8	52,5	52,5	60,2	60,2	62,9	62,9	61,7	61,7	63	63	63,36	63,366	64,4					
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	64	
			Wart. bazowa																						
			Szacowana realizacja																						64,40
Liczba publikacji, materiałów promocyjnych ze środków PO RPW	szt.	nd	Realizacja	0	0	0	0	0	47 588	55 884	55 884	96 243	96 243	147 905	147 905	205 728	205 728	226 230	226 230	278 014					
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	200 000	
			Wart. bazowa																						
			Szacowana realizacja																						252 540

Wskaźniki	Jedn. ostka	Kod odpowiadające go wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
VI oś priorytetowa – wskaźniki rezultatu																						
Średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta	dni	nd	Realizacja	0	0	40	40	40	24,5	31,4	31,4 <sup>j)</sup>	31,5	31,5									
			Wart. docelowa	-	-	-	-	-	-	-	37											37
			Wart. bazowa	0																		
			Szacowana realizacja																			

- a) Wiersze zawierające wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.
- b) Wartości podane w wierszu *Realizacja* są prezentowane w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, biorąc pod uwagę datę zatwierdzenia wniosku oraz wykazane w nim osiągnięte wartości wskaźników.
- c) Wartości w wierszu *Wart. docelowa* zostały podane na rok 2013 i 2015 zgodnie z obowiązującym Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (aktualizacja zaakceptowana przez KE w dniu 11 marca 2014 r.).
- d) Wartości podane w wierszu *Szacowana realizacja* zostały oszacowane w oparciu o zadeklarowane w umowach o dofinansowanie (stan na dzień 30 czerwca 2015 r.) wartości docelowe wskaźników. Przyjęto upraszczające założenie, że wartości docelowe wskaźników w umowach zostaną osiągnięte w roku odpowiadającym dacie zakończenia tych projektów.
- e) Wartość wskaźnika *Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (w tym na obszarach wiejskich)* według danych z KSI na koniec czerwca 2015 r. powinna wynosić 1592,74 etatów, gdyż omyłkowo wprowadzono do systemu niepoprawną wartość. W lipcu 2015 r. wartość ta została skorygowana w KSI.
- f) *Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe* na koniec czerwca 2015 r. wynosiła 2 515, ale zgodnie z przyjętym założeniem do tabeli w wierszu *realizacja* wpisywane są wskaźniki wykazane w zatwierdzonym wniosku o płatność końcową. W przypadku tego wskaźnika jego całkowita osiągnięta wartość będzie wykazana w na koniec 2015 r.
- g) Wartość wskaźnika *Liczba utworzonych nowych etatów badawczych* według danych z KSI na koniec czerwca 2015 r. powinna wynosić 107,13 etatów, gdyż omyłkowo wprowadzono do systemu niepoprawną wartość. W lipcu 2015 r. wartość ta została skorygowana w KSI.
- h) W ramach osi IV PO RPW podpisano 37 umów o dofinansowanie, w tym jeden projekt jest podzielony na 3 umowy, a drugi – na 2 umowy, dlatego łączna liczba projektów jest niższa od liczby umów i wynosi 34.
- i) Realizacja wskaźnika *Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych* wyrażonego w zł była na takim samym poziomie w II półroczu 2011 r., I i II półroczu 2012 r. (35,5, mln zł). Różnica w realizacji wartości tego wskaźnika wyrażonego w euro wynika z innego kursu przyjętego w tych okresach sprawozdawczych (w II półroczu 2011 r. – 4,141, w I półroczu 2012 r. – 4,2872, w II półroczu 2012 r. – 4,0809). Do przeliczenia wartości wskaźnika z zł na euro na koniec I półrocza 2013 r. przyjęto kurs 4,2449; w II półroczu 2013 r. – 4,1942, w I półroczu 2014 r. – 4,1637, w II półroczu 2014 r. – 4,3103, a w I półroczu 2015 r. – 4,1893.
- j) Wskaźnik *średni czas przekazywania środków na rzecz beneficjenta* jest monitorowany raz do roku na koniec grudnia, dlatego w tabeli wartość realizacji w I połowie 2015 r. jest podany stan z grudnia 2014 r.

## 1.2 Informacje finansowe

### 1.2.1. Wnioski o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o dofinansowanie projektów. Tym samym liczba złożonych wniosków od początku realizacji Programu do dnia 30 czerwca 2015 r. wynosiła 455 o wartości ogółem wynoszącej 17 573 mln zł.

### 1.2.2. Umowy o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy o dofinansowanie osiągając liczbę 308 umów od początku realizacji Programu. Zwiększyło to wartość kontraktacji środków UE do wysokości 10 297 mln zł. Tym samym, na koniec czerwca 2015 r. wykorzystanie środków EFRR w ramach PO RPW wyniosło 103,55%. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatkowania środków UE o 4,5 punktu procentowego (pp.) alokacji.

### 1.2.3. Wnioski o płatność

Od początku realizacji Programu zatwierdzono wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych równą 10 156 mln zł, w tym środki EFRR wynosiły 7935 mln zł, co stanowiło 79,8% alokacji EFRR na Program. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatkowania środków UE o 6,5 pp. alokacji.

### 1.2.4. Certyfikacja wydatków

Od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego IZ PO RPW sporządziła 111 poświadczeń i deklaracji wydatków do Instytucji Certyfikującej (IC) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości ponad 9532 mln zł, w tym środki EFRR wyniosły 7701 mln zł, co stanowi 77,4% alokacji EFRR na lata 2007 - 2013.

W okresie sprawozdawczym IZ przedłożyła do IC 5 poświadczeń i deklaracji wydatków na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych (stanowiących podstawę certyfikacji) w wysokości 533 mln zł. Umożliwiło to realizację celu certyfikacji<sup>14</sup> na koniec I półrocza 2015 r. na poziomie 113,2%.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. IC poświadczyła do Komisji Europejskiej kwotę wydatków stanowiących podstawę certyfikacji w wysokości 2282 mln euro<sup>15</sup>. Wartość kwoty wnioskowanej do Komisji Europejskiej wyniosła 1 912 mln euro, co stanowi 80,1% alokacji środków EFRR na Program.

<sup>14</sup> Cel wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do Komisji Europejskiej został określony w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów - *Plan wydatkowania środków w 2014 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013*.

<sup>15</sup> Wg kursów przyjętych dla poszczególnych poświadczeń od IC do Komisji Europejskiej.

Tabela 8 .Poziom realizacji celu certyfikacji na I półrocze 2015 r.

Program operacyjny	Dysponent	Rola w systemie wdrażania	Program operacyjny / oś priorytetowa / działanie	Cel wydatków kwalifikowanych do KE (w mln. zł)		Wykonanie celu na koniec I półrocza 2015 r. (w mln zł)	% realizacji celu	
				na 2015 r.	na I półrocze 2015 r.		na 2015 r.	na I półrocze 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PO RPW	Część 34 budżetu państwa	IZ	Cały program (poza projektami GDDKiA)	1344,9	448,3	513,2	38,2	114,5
	Część 39 budżetu państwa	Dysponent nadzorujący beneficjenta	Projekty GDDKiA w ramach działania 4.1	223,4	22,1	19,5	8,7	88,2
	<b>Razem</b>			<b>1 568,3</b>	<b>470,4</b>	<b>532,7</b>	<b>34,0</b>	<b>113,2</b>

### 1.2.5. Płatności z Komisji Europejskiej

W okresie sprawozdawczym kwota refundacji z KE wyniosła 123 mln euro, co stanowi 5,1% alokacji EFRR na Program.

W wyniku płatności okresowych zrealizowanych przez KE, od początku realizacji Programu do dnia 30 czerwca 2015 r. na rachunek programowy PO RPW wpłynęła kwota refundacji w wysokości 1876 mln euro, co stanowi 78,6% alokacji EFRR na Program. Powyższa kwota refundacji obejmuje 110 poświadczeń i deklaracji wydatków złożonych przez IZ do IC od początku realizacji Programu, obejmujących okres do dnia 31 marca 2015 r.

### 1.3 Analiza jakościowa<sup>16</sup>

#### Stopień realizacji PO RPW

W 4 spośród 6 osi zakontraktowano już wszystkie środki. Poziom kontraktacji w II osi priorytetowej kształtował się na poziomie 98%, natomiast w V osi priorytetowej kształtował się na poziomie 97% alokacji.

Analiza stopnia realizacji poszczególnych osi priorytetowych PO RPW pokazuje, że poza VI osią priorytetową dedykowaną pomocy technicznej, najbardziej zaawansowany poziom osiągnięto w I, III i IV osi priorytetowej. Poziom realizacji mierzony kwotą wydatków kwalifikowanych w części EFRR wykazanych we wnioskach o płatność wyniósł w tych osiach odpowiednio: 3 317 mln zł, 1 424 mln zł i 2 716 mln zł, co stanowiło 90,6%, 79,9% i 92,7% alokacji przeznaczanej na te osie.

Natomiast poziom płatności w przypadku V i II osi priorytetowej znacznie wzrósł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego odpowiednio o 4,8 i 12,4 pp., ale nadal był stosunkowo niski w stosunku do pozostałych osi priorytetowych. Łącznie wydatki kwalifikowane w części EFRR wykazane we wnioskach o płatność stanowiły 79,5% alokacji przeznaczanej na program.

#### Nadkontraktacja

W celu pełnego wykorzystania alokacji przyznanej na PO RPW, Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z Ministrem Finansów wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad


<sup>16</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

dostępny limit alokacji Programu, w ramach tzw. nadkontraktacji. Dodatkowe limity zobowiązań docelowo zostały wykorzystane na:

- Oś I w kwocie 140,7 mln zł
- Oś III w kwocie 56,7 mln zł
- Oś IV w kwocie 123,6 mln zł


Środki w większości zostały wykorzystane na dofinansowanie projektów rezerwowych, które znajdują się na Liście Projektów Indywidualnych Programu, projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach rozstrzygniętych naborów konkursowych oraz na zwiększenie dofinansowania dla obecnie realizowanych projektów. Przyjęto, że w końcowej fazie realizacji Programu do jego alokacji zostaną zwrócone środki rekompensujące nadkontraktację w wyniku: realizacji projektów po kosztach niższych niż pierwotnie zakładano, rozwiązania umów o dofinansowanie, uznania części wydatków za niekwalifikowane oraz zwrotów dokonanych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

**Wykres 6. Wartość środków EFRR podpisanych umów o dofinansowanie i wniosków o płatność w odniesieniu do alokacji na oś priorytetową**

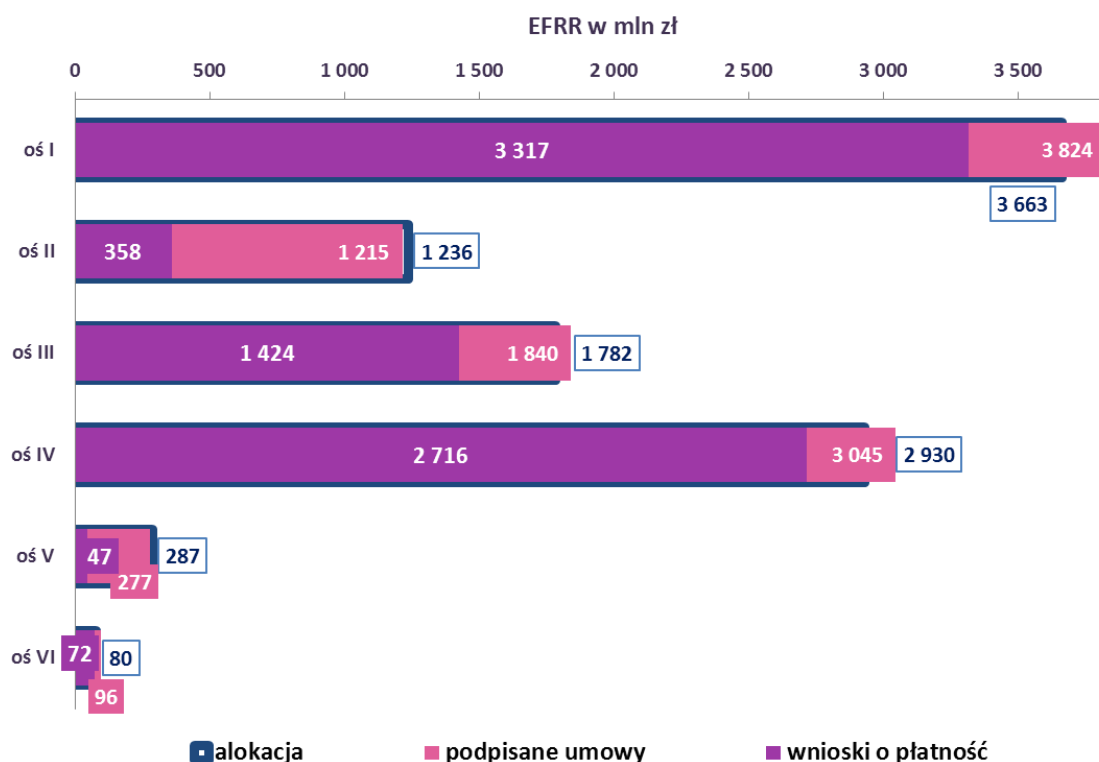

Do końca okresu sprawozdawczego, w ramach PO RPW zakończyła się realizacja 136 spośród 308 podpisanych umów o dofinansowanie. W I półroczu 2015 r. odnotowano przyrost zarówno pod względem liczby, jak i wartości zakończonych projektów. Wartość EFRR dla zakończonych projektów wyniosła 3 480 mln zł, co stanowi 35% alokacji PO RPW.


Wykres 7. Wartość EFRR dla zakończonych projektów w mln zł oraz jako % alokacji przeznaczanej na PO RPW

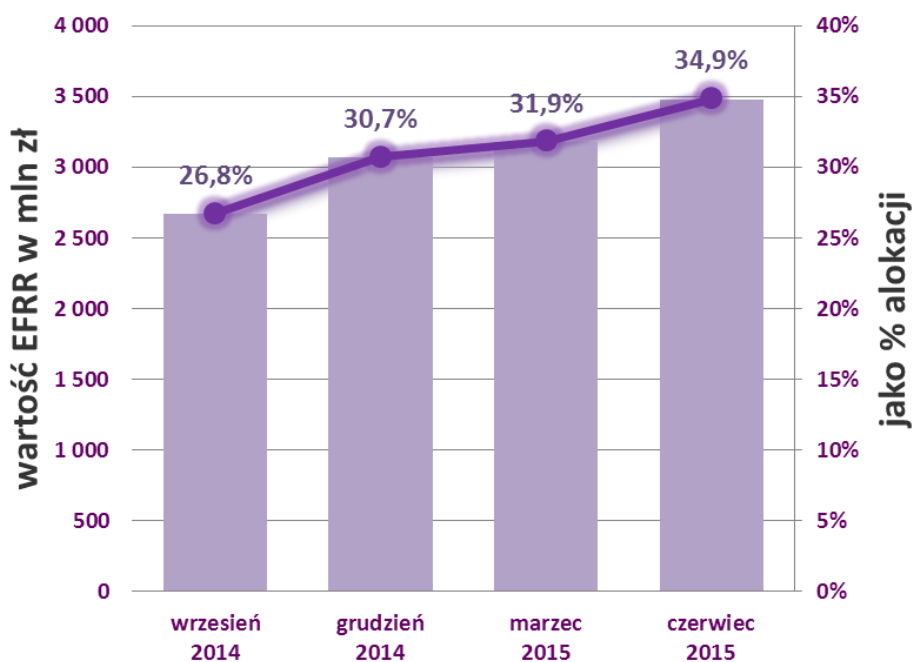

#### Przebieg realizacji Programu w ujęciu regionalnym


Analiza wielkości środków EFRR objętych podpisanymi umowami o dofinansowanie według województw pokazuje, że ponad połowa wszystkich zakontraktowanych w ramach PO RPW środków przypadła województwu lubelskiemu i podkarpackiemu. Najwyższy odsetek płatności w stosunku do środków zakontraktowanych odnotowano w województwie świętokrzyskim. Należy jednak podkreślić, że porównując wartości bezwzględne wykazane we wnioskach o płatność liderami były województwo podkarpackie i lubelskie.

Wykres 8. Struktura dofinansowania EFRR według województw w podpisanych umowach o dofinansowanie

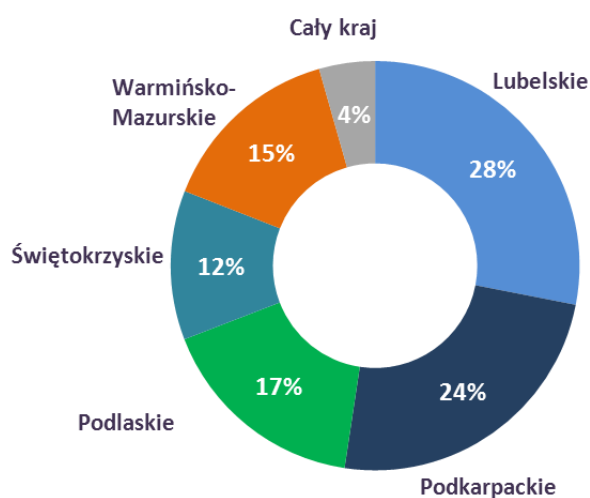



Wykres 9. Struktura dofinansowania EFRR według województw we wnioskach o płatność



Od początku realizacji Programu do końca czerwca 2015 r. w ramach PO RPW podpisano 308<sup>17</sup> umów o dofinansowanie projektów. Liczba i wartość dofinansowania EFRR w poszczególnych województwach Polski Wschodniej przedstawia się następująco:

- lubelskie – 88 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 2890 mln zł
- podkarpackie – 71 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 2504 mln zł
- podlaskie – 38 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 1725 mln zł
- świętokrzyskie – 23 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 1214 mln zł
- warmińsko – mazurskie - 29 umów o wartości dofinansowania z EFRR – 1508 mln zł

Ponadto, podpisano 59 projektów o zasięgu ponadregionalnym o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej 455 mln zł.

#### Aktualizacja zapisów PO RPW 2007-2013 i Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu

W okresie sprawozdawczym nie aktualizowano zapisów PO RPW 2007-2013 i Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu.

#### Aktualizacja Listy Projektów Indywidualnych PO RPW

Aktualizacja LPI w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana tylko raz i zakończyła się 18 lutego 2015 r. W jej wyniku przesunięto z listy rezerwowej na listę podstawową 3 projekty, dla których w I półroczu 2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie:

a) z działania I.3 *Wspieranie innowacji*:

- *Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego - III etap PPNT*
- *Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW*

b) z działania III.1 *Systemy miejskiego transportu zbiorowego*:

<sup>17</sup> W porównaniu do II półrocza 2014 r. rozwiązano sześć umów na projekty konkursowe w działaniu II.1

- Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80)

Ponadto, w związku z wycofaniem się przez beneficjenta z zamiaru realizacji przedsięwzięcia, usunięto jeden projekt rezerwowy z działania I.3 – *Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie jego bazy innowacyjnej.*

Zaktualizowana LPI obejmuje 116 przedsięwzięć o łącznej wartości 12,87 mld zł. Wszystkie projekty znajdują się na liście podstawowej. Ogólna wartość dofinansowania dla projektów podstawowych objętych indykatywnym wykazem wynosi 8,51 mld zł.

### 1.3.1 Postęp prac legislacyjnych

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace w przypadku trzech rozporządzeń:

1. W dniu 9 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane *Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (Dz.U. poz. 767).
2. W dniu 11 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane *Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (Dz. U. poz. 786).
3. Opracowano projekt *rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013*, które miało zastąpić dotychczasowe przepisy w tym zakresie. Prace prowadzono w celu dostosowania obowiązujących przepisów rozporządzenia do wprowadzonych regulacji unijnych w zakresie pomocy publicznej zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014<sup>18</sup> oraz pomocy *de minimis* zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013<sup>19</sup>.

### 1.3.2. Postęp w realizacji osi priorytetowych PO RPW<sup>20</sup>

#### I Oś Priorytetowa Nowoczesna Gospodarka

##### Działanie I.1. Infrastruktura uczelni

W ramach działania I.1 wspierającego budowę i modernizację infrastruktury dydaktycznej uczelni zakontraktowano środki na realizację 26 projektów o wartości EFRR wynoszącej 1349,89 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego zakończono realizację 21 projektów i wydatkowano środki w wysokości 1311,03 mln zł, co stanowi 97,3% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 1,8 pp. Do

<sup>18</sup> Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

<sup>19</sup> Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

<sup>20</sup> Informacje na temat problemów we wdrażaniu poszczególnych działań PO RPW znajdują się w pkt. 2 sprawozdania, a informacje o realizacji wskaźników i postępie rzeczowym w pkt. 1.1 sprawozdania.

końca 2015 r. zostaną dokonane kolejne płatności w ramach 5 projektów pozostających w trakcie realizacji. Podsumowanie rezultatów ww. działania nastąpi w ramach realizowanej w okresie lipiec – październik 2015 r. ewaluacji pt. *Ocena efektów realizacji działania I.1 PO RPW*. W jej wyniku zostanie dokonana przede wszystkim ocena wpływu projektów na poprawę dostępności i jakości usług dydaktycznych na uczelniach znajdujących się w Polsce Wschodniej.

### **Działanie I.2. Instrumenty inżynierii finansowej**

W działaniu trwa realizacja projektu indywidualnego *Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej*, którego beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wartość EFRR projektu wynosi 149,29 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano całą tę kwotę, co stanowi 100% alokacji dostępnej na działanie.

Do końca czerwca 2015 r. *fundusze poręczeniowe i pożyczkowe* zawarły ponad 2,5 tys. umów o wartości wynoszącej 228,66 mln zł na podstawie których udzielono poręczeń i przyznano pożyczki mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Polski Wschodniej.

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców oferowanymi w ramach działania instrumentami finansowymi, w maju 2015 r. BGK ogłosił trzeci konkurs na wybór pośredników finansowych w produkcie Pożyczka Globalna na kwotę 20 mln zł<sup>21</sup>. Dostępne środki pochodziły ze środków uwolnionych po tzw. pierwszym obiegu i z odsetek. W ramach konkursu przedsiębiorcy złożyli 16 wniosków na kwotę 56,5 mln zł stanowiącą 282% alokacji przewidzianej na konkurs. W jego wyniku zostało podpisanych 9 umów z pośrednikami finansowymi.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec listopada 2015 r., a jego efekty zostaną ocenione m.in. w ramach ewaluacji przewidzianej do realizacji w 2016 r.

### **Działanie I.3 Wspieranie innowacji**

W ramach działania I.3 wspierającego poprawę warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej (przede wszystkim przedsięwzięć innowacyjnych), zakontraktowano środki na realizację 84 projektów o wartości EFRR wynoszącej 2155,05 mln zł, w ramach czterech schematów:

- wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności - przeznaczone na budowę, rozbudowę, modernizację i uruchamianie instytucji otoczenia biznesu, takich jak: parki przemysłowe i technologiczne oraz inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości
- wsparcie na wyposażenie – polegające na budowie i wyposażeniu obiektów przeznaczonych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
- wsparcie na tworzenie zaplecza B+R –polegające na tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach
- wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych – polegające na przygotowaniu terenów do działalności inwestycyjnej związane z parkami i inkubatorami.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach projektów wydatkowano kwotę w wysokości 1697,93 mln zł, co stanowi 84,8% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 8,8 pp.

Do końca czerwca 2015 r. zwiększono dofinansowanie dla 11 projektów, co związane było z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji. Ponadto, zawarto 2 umowy o dofinansowanie dla projektów rezerwowych z LPI PO RPW 2007-2013 na kwotę EFRR wynoszącą 30,76 mln zł.

Do końca 2015 r. powinna zostać zakończona realizacja działania, w tym będących w trakcie realizacji 27 projektów. W związku z tym zaplanowano realizację badania ewaluacyjnego pt. *Ocena efektów realizacji projektów działania I.3 PO RPW*<sup>22</sup>. W jej wyniku zostanie dokonana przede wszystkim ocena

<sup>21</sup> Poprzednie konkursy odbyły się w 2012 r. i 2014 r.

<sup>22</sup> Planowany termin realizacji badania – IV kwartał 2015 r –II kwartał 2016 r.

efektów i trwałości projektów w odniesieniu do poprawy dostępności i jakości infrastruktury badawczej na terenie Polski Wschodniej.

#### **Działanie 1.4. Promocja i współpraca**

W ramach działania 1.4 wspierającego przedsiębiorstwa w Polsce Wschodniej w zakresie promocji zagranicznej oraz rozwoju inicjatyw klastrowych w makroregionie, zakontraktowano środki na realizację 38 projektów o wartości EFRR wynoszącej 169,59 mln zł. Realizowane projekty polegają na:

- *tworzeniu sieci centrów obsługi inwestora* (2 projekty) na rzecz których ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem centrów, działaniami informacyjnymi i promującymi realizację projektu (spotkania, konferencje, misje gospodarcze)
- *tworzeniu i rozwoju klastrów* (17<sup>23</sup> projektów). W ramach projektów finansowano działania promujące klastry (realizacja strategii marketingowych klastrów oraz organizacja konferencji, spotkań i seminariów) oraz działania o charakterze technicznym (prowadzenie biur klastrów, tworzenie i obsługę platform internetowych, zakup usług związanych z organizacją wyjazdowych misji branżowych). W sumie w klastrach zrzeszonych jest ponad 500 podmiotów, tj. mikroprzedsiębiorstwa, firmy małe, średnie i duże oraz jednostki naukowe. Według deklaracji uczestników klastrów liczba nowych miejsc pracy od momentu udzielenia wsparcia wzrosła o blisko 120 etatów
- *tworzeniu polityki rozwoju regionalnego* (18 projektów). Ich celem jest budowanie stałej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej, tworzenie i obsługą serwisów internetowych oraz organizowanie konferencji
- *Promocji Gospodarczej Polski Wschodnie* (1 projekt), którego realizacja rzeczowa zakończyła się 30 czerwca 2015 r. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców z Polski Wschodniej, do których przedsięwzięcie było skierowane, dzięki jego realizacji udało się podpisać prawie tysiąc kontraktów na kwotę ponad 407 mln zł. Ponadto odnotowano wzrost eksportu o 45%, sprzedaży o 20%, a produkcji o 17 %. Firmy zatrudniły ponad 430 osób (w tym blisko 420 to mieszkańcy Polski Wschodniej).

Do końca okresu sprawozdawczego z 38 projektów zakończono realizację 29. Wydatkowano środki EFRR w wysokości 159,19 mln zł, co stanowi 96,7 % alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 10,2 pp. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną dokonane płatności w ramach 9 pozostających w trakcie realizacji projektów, co oznacza zakończenie realizacji działania wraz z końcem 2015 roku.

## **II oś priorytetowa – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego**

### **Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)**

W ramach działania II.1 realizowanych jest 5 projektów indywidualnych dotyczących budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, których beneficjentami są województwa Polski Wschodniej oraz 78<sup>24</sup> projektów konkursowych polegających na budowie sieci dostępowej tzw. „ostatniej mili”, wdrażanych przez operatorów telekomunikacyjnych. Wartość EFRR wszystkich ww. projektów wynosi 1214,67 mln zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę w wysokości 357,9 mln zł, co stanowi 29% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 12,4 pp.

#### **W okresie sprawozdawczym**

- Kontynuowano prace budowlane w ramach ww. projektów. Na koniec czerwca 2015 r. z planowanych do wybudowania ponad 10,5 tys. km sieci telekomunikacyjnych:

<sup>23</sup> 15 klastrów realizuje łącznie 17 projektów.

<sup>24</sup> W 2014 r. zawarto 85 umów o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego, na wniosek beneficjentów rozwiązano 7 umów o dofinansowanie.

- wybudowano odcinki o długości ponad 6,9 tys. km,
- w budowie pozostają odcinki o długości prawie 1,9 tys.km,
- do wybudowania pozostaje około 1,7 tys. km.
- W czerwcu 2015 r. Komisja Europejska wydała zgodę na zmianę wartości projektów, w tym wartości dofinansowania oraz zakresu rzeczowego inwestycji w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim.
- Zorganizowano dwa posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej wspierającego realizację projektów indywidualnych. Ich następstwem było sformułowanie wobec beneficjentów rekomendacji dotyczących terminu ukończenia prac budowlanych, przyspieszenia procedur odbioru wybudowanej sieci, konieczności niezwłocznego rozliczenia środków unijnych oraz opracowania ofert świadczenia usług związanych z udostępnieniem sieci (przy ścisłej współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej).
- W trzech z pięciu województw trwały prace w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Operatora Infrastruktury (OI) wraz z dostawą infrastruktury aktywnej w projektach. W ich wyniku, województwo lubelskie podpisało umowę z OI, województwo podlaskie wybrało OI<sup>25</sup>, a województwo świętokrzyskie wysłało zaproszenia do składania ofert wyznaczając termin ich składania na dzień 13 lipca 2015 r.
- Zakończono szkolenia osób zagrożonych tzw. "wykluczeniem cyfrowym" w województwach warmińsko-mazurskim, podkarpackim i lubelskim. W pozostałych dwóch województwach są one nadal realizowane. W sumie do końca czerwca 2015 r. przeszkolono ponad 6,8 tys. osób.
- Beneficjenci projektów indywidualnych prowadzili działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców i samorządów w makroregionie poprzez udostępnianie informacji w prasie, telewizji, Internecie.

#### **Planowany przebieg realizacji działania**

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zakończyć realizację rzeczową projektów indywidualnych i konkursowych co będzie skutkowało złożeniem kolejnych wniosków o płatność końcową. Ponadto, w przypadku projektów indywidualnych nastąpi:

- rozstrzygnięcie postępowań i podpisanie umów<sup>26</sup> na wybór Operatora Infrastruktury w przypadku województwa podlaskiego i świętokrzyskiego,
- zakończenie prac budowlanych i zainstalowanie sprzętu aktywnego w węzłach,
- przekazanie wybudowanej sieci szerokopasmowej do zarządzania Operatorom Infrastruktury, którzy będą sprzedawali hurtowe usługi dostawcom telekomunikacyjnym dostarczającym Internet mieszkańcom makroregionu,
- zatwierdzenie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oferty świadczenia usług przez Operatorów Infrastruktury.

### **III oś priorytetowa – Wojewódzkie ośrodki wzrostu**

#### **Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego<sup>27</sup>**

W ramach działania III.1 wspierającego budowę zintegrowanych systemów miejskiego transportu publicznego w pięciu miastach wojewódzkich Polski Wschodniej zakontraktowano środki na realizację 8 projektów o wartości EFRR wynoszącej 1592,93 mln zł. Spośród nich zakończono realizację projektów miasta Białegostoku i Rzeszowa.

<sup>25</sup> Postępowanie zostało unieważnione

<sup>26</sup> w III kwartale 2015 r.

<sup>27</sup> Projekty Miasta Lublina, Gminy Miasta Rzeszowa, Gminy Miejskiej Kielce oraz Gminy Olsztyn objęte są definicją dużego projektu, zgodnie z art. 39 rozporządzenia 1083/2006 dlatego bardziej szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 5 sprawozdania.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR w wysokości 1222,39 mln zł, co stanowiło 79,7% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 10,7 pp. Do końca 2015 r. zostaną dokonane kolejne płatności w ramach 6 pozostałych projektów, których realizacja powinna zakończyć się w kolejnym okresie sprawozdawczym.

### **Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej**

W ramach działania III.2 wspierającego prace polegające na budowie i modernizacji infrastruktury umożliwiającej organizację kongresów, konferencji, wystaw i targów w Polsce Wschodniej zakontraktowano środki na realizację 6 projektów w wysokości EFRR wynoszącej 247,30 mln zł. Spośród nich zakończono realizację 3 projektów w Kielcach, Ostródzie i Lublinie.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR w wysokości 202,04 mln zł, co stanowi 81,5% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 4,3 pp. Do końca 2015 r. zostaną dokonane kolejne płatności w ramach 3 pozostałych projektów, których realizacja powinna zakończyć się w kolejnym okresie sprawozdawczym.

## **IV oś Priorytetowa Infrastruktura transportowa**

### **Działania IV.1. Infrastruktura drogowa**

W ramach działania IV.1 dofinansowywanych jest 34 projektów<sup>28</sup> polegających na budowie i przebudowie dróg wojewódzkich Polski Wschodniej oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych. Wśród nich są projekty duże, których liczba w okresie sprawozdawczym wzrosła o jeden w związku z faktem, że dotychczas realizowany projekt *Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa* zmienił swój status. Dnia 29 czerwca 2015 r. IZ przesłała do KE dokumentację tego projektu celem potwierdzenia jego wkładu finansowego.

Na rzecz realizowanych projektów zakontraktowano środki w wysokości EFRR wynoszącej 3045,23 mln zł. Spośród nich zakończono realizację 16 projektów, w tym budowę dwóch mostów na Wiśle w miejscowościach Połaniec i Kamień. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR w wysokości 2716,5 mln zł, co stanowi 92,7% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 3,6 pp. Do końca 2015 r. zostaną dokonane kolejne płatności w ramach pozostałych 18 projektów, których realizacja powinna zakończyć się w kolejnym okresie sprawozdawczym.

## **V oś priorytetowa - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne**

### **Działanie V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki**

W ramach działania zrealizowano jeden kompleksowy projekt indywidualny polegający na promocji Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz miejsca atrakcyjnego do pracy i zamieszkania. Wartość dofinansowania EFRR projektu wyniosła 19,37 mln zł. Projekt został zakończony w 2012 r.

### **Działanie V.2. Trasy Rowerowe**

W ramach działania realizowanych jest 6 projektów w ramach dwóch komponentów.

<sup>28</sup> W ramach działania realizowane są 34 projekty, na które podpisanych jest 37 umów, ponieważ jeden projekt jest podzielony na 3 umowy, a drugi – na 2 umowy, dlatego łączna liczba projektów jest niższa od liczby umów

### Komponent budowa tras rowerowych

W jego ramach dofinansowano 5 projektów polegających na budowie i oznakowaniu tras rowerowych. Na ich rzecz zakontraktowano środki w wysokości EFRR 257,72 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR w wysokości 24,73 mln zł, co stanowi 9,6% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 3,76 pp.

Trwa budowa i znakowanie tras rowerowych Polski Wschodniej. Do końca czerwca 2015 r. zakończono budowę pierwszych odcinków trasy w województwach: warmińsko-mazurskim i lubelskim. Realizacja postępu rzeczowo-finansowego projektów jest monitorowana w cyklu miesięcznym i dwutygodniowym. Do końca 2015 r. zostaną dokonane kolejne płatności w ramach projektów, których realizacja powinna zakończyć się w kolejnym okresie sprawozdawczym.

### Komponent promocja tras rowerowych

W ramach działania V.2 dofinansowano projekt promujący trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, na który zakontraktowano środki EFRR w wysokości 21,14 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki w wysokości 3,4 mln zł, co stanowi 1,33% alokacji na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjenta wzrósł o 0,74 pp. Środki te przeznaczono na:

- organizację udziału marki *Green Velo* w targach turystycznych i rowerowych (w tym w ramach Expo w Mediolanie),
- organizację cyklu spotkań informacyjnych m.in. dla przedsiębiorców i środowisk lokalnych zlokalizowanych w korytarzu trasy oraz dziennikarzy krajowych i zagranicznych,
- kontynuację działań promocyjnych w mediach,
- tworzenie bazy Miejsc Przyjaznych Rowerzyście,
- prowadzenie prac nad uruchomieniem docelowej wersji portalu internetowego.

W kolejnym okresie sprawozdawczym kontynuowany będzie monitoring stanu realizacji projektu, w tym koordynacja działań promocyjnych z postępowaniem prac w ramach projektów infrastrukturalnych.

## **VI oś priorytetowa - Pomoc techniczna**

### **Działanie VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu**

W ramach działania od początku realizacji PO RPW dofinansowano ze środków pomocy technicznej 18 projektów o wartość EFRR wynoszącej 95,64 mln zł. Spośród nich zakończono realizację 16 projektów. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki EFRR w wysokości 71,79 mln zł, co stanowi 89,6% alokacji dostępnej na działanie. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł o 1,9 pp.

W okresie sprawozdawczym realizowane były dwa projekty:

- *Roczny Plan Działania IZ PO RPW na 2015 rok* o wartości EFRR wynoszącej 2 306 050,00 zł,
- *Roczny Plan Działania IP PO RPW na 2015 rok* o wartości z EFRR wynoszącej 2 701 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach pomocy technicznej znajdują się w pkt. 6 sprawozdania.

### **2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych**

W okresie sprawozdawczym podczas wdrażania PO RPW zostały zidentyfikowane problemy w przypadku projektów dofinansowywanych z trzech działań: II.1, III.1 i V.2.

## **Działanie II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej**

W ramach działania zidentyfikowano problem przedłużania terminów zakończenia realizacji projektów do końca 2015 r. i związany z tym niski poziom wydatkowania środków. Zostało to spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu prac budowlanych sieci szerokopasmowych. Beneficjenci uzasadniali to koniecznością uzyskania akceptacji przez powiatowe ośrodki geodezyjne dokumentacji powykonawczej dla budowy sieci, a także trybem ich odbiorów.

Na wydłużenie terminu realizacji projektów wpływ miała także przedłużająca się procedura wyboru Operatora Infrastruktury w przypadku projektów województwa podlaskiego i świętokrzyskiego. Wynikało to z trudności w merytorycznym opracowaniu dokumentacji przetargowej w związku ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz procedurą odwoławczą w Krajowej Izbie Odwoławczej.

Natomiast niski poziom wydatkowania środków w działaniu jest także spowodowany niezadawalającym stopniem zaawansowania robót budowlanych w projekcie województwa podkarpackiego. Do końca okresu sprawozdawczego w budowie pozostawało 50% sieci szerokopasmowej.

W związku z powstałymi problemami w realizacji projektów zostały one objęte szczególnym monitorowaniem ze strony IP i IZ PO RPW oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. IZ organizuje cykliczne spotkania z beneficjentem poświęcone realizacji projektu w formie posiedzeń Komitetu Sterującego ds. projektu SSPW. Ich efektem są rekomendacje związane z przyspieszeniem tempa robót budowlanych i rozliczaniem projektu w zaplanowanym terminie.

## **Działanie III.1 – Systemy miejskiego transportu zbiorowego**

W działaniu pojawiło się opóźnienie w realizacji dużego projektu transportu miejskiego miasta Olsztyna na etapie prac projektowych, które miały wpływ na rozpoczęcie robót budowlanych. Spowodowane było to odstąpieniem w 2013 r. przez beneficjenta od umowy z wykonawcą linii tramwajowej ze względu na znaczące opóźnienia w realizacji kontraktu. W związku z tym beneficjent musiał ogłosić ponownie postępowania przetargowe na dokończenie prac projektowych oraz na realizację prac budowlanych (linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów i zajezdni tramwajowej), których realizacja trwa nadal. Opóźnienia w budowie linii tramwajowej skutkowały przesunięciem terminów realizacji pozostałych, skorelowanych zadań dotyczących dostawy taboru tramwajowego oraz wdrożenia systemu ITS.

W celu zakończenia realizacji projektu w zaplanowanym terminie tj. do końca 2015 r., IZ oraz IP monitorują postęp rzeczowy projektu i zidentyfikowane w jego ramach kamienie milowe na podstawie informacji przekazywanych raz na tydzień przez beneficjenta.

## **Działanie V.2 – Trasy rowerowe**

W działaniu zidentyfikowano niski poziom wydatkowania środków wynoszący 10,5% alokacji na działanie na koniec czerwca 2015 r.. Tak stan rzeczy został spowodowany wielomiesięcznymi opóźnieniami w przygotowaniu projektów. W związku z tym, IZ zobowiązała IP do monitorowania realizacji projektów i przedkładania w cyklu miesięcznym i dwutygodniowym szczegółowej informacji o stanie realizacji poszczególnych projektów, w tym kamieni milowych oraz o pojawiających się problemach. Ponadto, IZ organizuje cykliczne spotkania z beneficjentami projektów, w trakcie których omawiane są wszelkie problemy towarzyszące realizacji projektów.



### 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu<sup>29</sup>

### 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <p>1) polityka konkurencji;  2) polityka zamówień publicznych;  3) polityka ochrony środowiska;  4) polityka równych szans.</p>	Data i miejsce:
	14 września 2015 r., Warszawa
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Monika Pałasz
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: .....

#### 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych<sup>30</sup>

W okresie sprawozdawczym wystąpiły problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych (np. dokonywanie wyboru wykonawcy bez zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a ponadto stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert). Niemniej jednak nie spowodowało to problemów z prawidłowym wdrażaniem poszczególnych osi priorytetowych PO RPW.

#### 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

W PO RPW pomoc publiczna udzielana jest beneficjentom w ramach działań: I.3, II.1 i III.2. W ramach **działania I.3** pomoc publiczna stanowi:

- regionalną pomoc inwestycyjną – udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.
- pomoc *de minimis* – udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy „de minimis” (Dz. Urz. WE L 379 z 28 grudnia 2006 r., str. 5).

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach działania I.3 są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (Dz. U. Nr 34, poz. 271).

<sup>29</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. Część ta powinna być wypełniana i przekazywana w ramach sprawozdania opracowywanego za II półrocze a ujęte w niej informacje powinny obejmować dane dotyczące obydwu okresów sprawozdawczych danego roku.

<sup>30</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

W okresie sprawozdawczym w zakresie działania I.3 nie udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej ani pomocy „de minimis” z powodu wygaśnięcia podstawy prawnej udzielania pomocy, na której oparty został wskazany program pomocowy. Ponadto, kontynuowano prace rozpoczęte w IV kwartale 2014 r. zmierzające do dostosowania przepisów rozporządzenia *Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* do nowych regulacji UE w zakresie pomocy publicznej i pomocy „de minimis”.

W przypadku **działania II.1** pomoc publiczna stanowi regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach działania II.1 reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. 2013, poz. 423, z późn. zm.). W grudniu 2013 r. ww. rozporządzenie zostało znowelizowane umożliwiając przyznawanie przez PARP regionalnej pomocy inwestycyjnej do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r. W okresie sprawozdawczym w ramach działania II.1 nie udzielono regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W ramach **działania III.2** pomoc publiczna stanowi regionalną pomoc inwestycyjną i pomoc „de minimis”, udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności określonymi w programie pomocowym, ustanowionym przepisami *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* (Dz. U. Nr 21, poz. 117). W związku z tym, że przepisy ww. rozporządzenia utraciły moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2014 r., w okresie sprawozdawczym nie udzielono nowej pomocy publicznej w ramach tego działania.

Tabela 9. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy „de minimis” od uruchomienia programu w podziale na działania i podstawę udzielenia pomocy

Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą „de minimis”		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą „de minimis”		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy „de minimis”				
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji (w zł)	wg zrealizowanych wniosków o płatność (w zł)	kwota ogółem (w zł)	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
							kwota (w zł)	%	kwota (w zł)	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.=8.+10.	8.	9.=8./7. *100	10.	11.=10./7. *100
I.3 Wsparcie innowacji	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271).	11	11 (135 wniosków o płatność)	710 645 343,23 (kwalifikowalne 542 484 841,38)	343 208 599,82	208 115 458,95	171 023 543,41	82,18%	37 091 915,54	17,82%
II.1* Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423).	77	55 (243 wnioski o płatność)	400 711 982,80 (kwalifikowalne: 321 364 249,06)	51 110 843,29	35 402 332,98	32 303 196,56	91,25%	3 099 136,42	8,75%
III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej	Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. 2009 nr 21 poz. 117)	6	6 (80 wniosków o płatność)	649 317 207,52 (kwalifikowalne: 544 752 116,19)	380 675 316,72	253 627 410,82	215 718 523,69	85,05%	37 908 887,13	14,95%

\*W tabeli nie zostały uwzględnione projekty, dla których umowy o dofinansowanie zostały rozwiązane.

Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą „de minimis”		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą „de minimis”		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy „de minimis”							
				ogółem MŚP		w tym wg wielkości przedsiębiorstwa <sup>31)</sup>					
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji (w zł)	wg zrealizowanych wniosków o płatność (w zł)	kwota (w zł)	%	mikro		małe		średnie	
						kwota (w zł)	%	kwota (w zł)	%	kwota (w zł)	%
12.	13.	14.	15.	16.= 18.+20.+22.	17.= 16./7.*100	18.	19.= 18./16.* 100	20.	21.= 20./16.*100	22.	23.= 22./16.*100
4	4 (35 wniosków o płatność)	163 270 378,35 (kwalifikowalne 120 568 853,74)	63 353 943,22	55 765 326,99	26,80%	0,00	0%	16 587 732,18	29,75%	39 177 594,81	70,25%
68	54 (201 wniosków o płatność)	374 193 621,91 (kwalifikowalne: 302 107 262,38)	51 110 843,29	35 402 332,98	100%	22 536 107,81	63,66%	12 866 225,17	36,34%	0,00	0%
2	2 (22 wnioski o płatność)	194 145 389,42 (kwalifikowalne: 148 324 535,51)	122 117 199,27	90 322 297,68	35,61%	0,00	0%	90 322 297,68	100%	0,00	0%

<sup>31)</sup> Podział zgodny z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

## 5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>32, 33</sup>

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia 1083/2006 w PO RPW przewidziano do realizacji **17 dużych projektów**:

- 5 w ramach działania II.1
- 4 w ramach działania III.1
- 8 w ramach działania IV.1<sup>34</sup>

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba projektów wzrosła o jeden ponieważ projekt *Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica* pierwotnie nie był zgłaszany jako „duży”. W związku ze zwiększeniem kosztu całkowitego projektu (zmiana wykonawcy), zmienił się jego status. Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu został przesłany do akceptacji KE w czerwcu 2015 r.

Do końca czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja 3 dużych projektów z działania IV.1.

Tabela 10. Informacja dotycząca podpisanych umów o dofinansowanie dla dużych projektów

Działanie PO RPW	Liczba podpisanych umów		Wartość EFRR podpisanych umów (w mln PLN)		Wartość EFRR złożonych wniosków o płatność (w mln PLN)	
	do końca poprzedniego okresu spr.	do końca bieżącego okresu spr.	do końca poprzedniego okresu spr.	do końca bieżącego okresu spr.	do końca poprzedniego okresu spr.	do końca bieżącego okresu spr.
Działanie II.1.	5	5	1 029,68	1 029,68	200,09	325,59
Działanie III.1.	4	4	1 165,77	1 165,77	776,02	864,40
Działanie IV.1.	9	10	1 216,16	1 439,10	1 124,77	1 161,93
<b>Razem</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>3 411,61</b>	<b>3 634,54</b>	<b>2 100,89</b>	<b>2 351,92</b>

Tabela 11. Przebieg realizacji dużych projektów w kolejnym okresie sprawozdawczym

Działanie PO RPW	Wartość EFRR planowanych do złożenia wniosków o płatność (w mln PLN)	Przewidywana liczba zakończonych projektów	Wartość EFRR planowanych do zakończenia projektów (w mln PLN)
Działanie II.1.	285,00	5	1 029,68
Działanie III.1.	176,89	3	915,21
Działanie IV.1.	81,38	4	696,05
<b>Razem</b>	<b>543,27</b>	<b>12</b>	<b>2 640,94</b>

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest złożenie wniosków o płatność o wartości EFRR wynoszącej 543,29 mln PLN. Przewiduje się zakończenie realizacji 12 projektów o wartości EFRR wynoszącej 2640,94 mln PLN.

### Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt województwa lubelskiego	Data podpisania umowy - 21 stycznia 2011 r.
<b>Stan zaawansowania projektu</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 maja 2015 r. podpisano umowę z Operatorem Infrastruktury na operowanie i dostawę urządzeń aktywnych</li> <li>• zakończono realizację komponentu szkoleniowego (przeszkolono 1912 osób)</li> </ul>	

<sup>32</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

<sup>33</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

<sup>34</sup> W ramach działania IV.1 PO RPW realizowanych jest 8 dużych projektów, dla których podpisano 10 umów o dofinansowanie (projekt pn. *Likwidacja barier rozwojowych...* - 3 umowy).

<ul style="list-style-type: none"> <li>wybudowano 2747 km sieci z planowanych do wybudowania 2908 km, a w trakcie budowy pozostaje 161 km sieci</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu</li> <li>zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci</li> </ul> <b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r.</b>	
<b>Projekt województwa podkarpackiego</b>	<b>Data podpisania umowy - 11 marca 2011 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>w 2013 r. podpisano umowę z Operatorem Infrastruktury</li> <li>zakończono realizację komponentu szkoleniowego (przeszkolono 1548 osób)</li> <li>wybudowano 268,16 km sieci z planowanych do wybudowania 2013 km, w trakcie budowy jest 1050,66 km sieci, a do wybudowania pozostaje 694,18 km</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu</li> <li>podjęcie działań naprawczych przez beneficjenta w związku z niskim stanem zaawansowania odbiorów i postępu finansowego</li> <li>zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci</li> </ul> <b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r.</b>	
<b>Projekt województwa warmińsko- mazurskiego</b>	<b>Data podpisania umowy - 16 listopada 2010 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>w 2013 r. podpisano umowę z Operatorem Infrastruktury</li> <li>zakończono realizację komponentu szkoleniowego (przeszkolono 1860 osób)</li> <li>wybudowano 1853,97 km sieci z planowanych do wybudowania 2241 km, w trakcie budowy jest 25,93 km, a do wybudowania pozostaje 361,1 km</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu</li> <li>zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci</li> </ul> <b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 listopada 2015 r.</b>	
<b>Projekt województwa podlaskiego</b>	<b>Data podpisania umowy - 15 kwietnia 2011 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>27 czerwca 2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na Operatora Infrastruktury, jednak w kolejnym okresie sprawozdawczym postępowanie unieważniono</li> <li>przeszkolono 1077 osób</li> <li>wybudowano 1298,44 km sieci z planowanych do wybudowania 1852 km, w trakcie budowy jest 557 km, a do wybudowania pozostaje 31,56 km</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>podpisanie umowy z Operatorem Infrastruktury</li> <li>monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu</li> <li>zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci</li> <li>zakończenie komponentu szkoleniowego</li> </ul> <b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r.</b>	
<b>Projekt województwa świętokrzyskiego</b>	<b>Data podpisania umowy – 27 stycznia 2011 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozstrzygnięcie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Operatora Infrastruktury wraz z dostawą sprzętu aktywnego</li> <li>przeszkolono 491 osób</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>wybudowano 750 km sieci z planowanych do wybudowania 1414 km, w trakcie budowy jest 40 km, a do wybudowania pozostaje 624 km</li> </ul>
<p><b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>podpisanie umowy z Operatorem Infrastruktury</li> <li>monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu</li> <li>zakończenie prac budowlanych i odbiór wbudowanej sieci</li> <li>zakończenie komponentu szkoleniowego</li> </ul> <p><b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 października 2015 r.</b></p>

### Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego

<b>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym</b>	<b>Data podpisania umowy 12 listopada 2009 r.</b>
<p><b>Stan zaawansowania projektu</b> Zakończono realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>budowę ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce), pętli i zatok autobusowych, węzła drogowego wraz z przebudową ronda oraz buspasa</li> <li>zakupiono 40 autobusów wraz z automatami mobilnymi i stacjonarnymi do sprzedaży biletów</li> <li>zainstalowano 36 elektronicznych tablic przystankowych</li> <li>wyposażono wszystkie autobusy w monitoring wizyjny</li> <li>wprowadzono System Kieleckiej Karty Miejskiej</li> </ul> <p>Trwa realizacja następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>budowa buspasów, zintegrowanych peronów przystankowych oraz pętli autobusowej wraz z przebudową ulicy na potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej</li> </ul>	
<p><b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizacja zadań w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem</li> </ul> <p><b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2015 r.</b></p>	
<b>Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie</b>	<b>Data podpisania umowy 12 listopada 2012 r.</b>
<p><b>Stan zaawansowania projektu</b> Zakończono realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>budowę zajezdni tramwajowej oraz zajezdni autobusowej, budowę ul. Obiegowej, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz buspasów</li> </ul> <p>Trwa realizacja następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>budowa linii tramwajowej</li> <li>dostawa taboru tramwajowego</li> <li>wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego</li> </ul>	
<p><b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizacja zadań w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz dalsze monitorowanie postępu prac w ramach inwestycji</li> </ul> <p><b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2015 r.</b></p>	
<b>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>	<b>Data podpisania umowy 30 lipca 2012 r.</b>
<p><b>Stan zaawansowania projektu:</b> Realizacja projektu została zakończona. W dniu 30 czerwca 2015 r. beneficjent złożył wniosek</p>	

o płatność końcową.	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola na zakończenie realizacji projektu na przełomie lipca i sierpnia 2015 r.</li> </ul>	
<b>Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie</b>	<b>Data podpisania umowy 1 września 2011 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu</b>	
Zakończono realizację następujących zadań:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>budowę trakcji trolejbusowych wraz z systemami zasilania, Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, w tym: wyposażenie pojazdów, tablice systemu informacji przystankowej i Centrum Obsługi</li> <li>przebudowę ulic i skrzyżowań</li> <li>zakupiono i dostarczono 100 autobusów i 70 trolejbusów</li> </ul>	
Trwa realizacja następujących zadań:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa Systemu Zarządzania Ruchem</li> <li>dostawa samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacja zadań w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem</li> </ul>	
<b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2015 r.</b>	

#### Działanie IV.1. Infrastruktura drogowa

<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień</b>	<b>Data podpisania umowy 3 października 2012 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>roboty budowlane na wszystkich odcinkach zostały zakończone i uzyskano pozwolenia na ich użytkowanie</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>rozliczenie projektu</li> </ul>	
<b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 30 września 2015 r.</b>	
<b>Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych</b>	<b>Data podpisania umowy 3 października 2012 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>roboty budowlane w ramach projektu zostały zakończone, trwa ich odbiór</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>rozliczenie projektu</li> </ul>	
<b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 30 września 2015 r.</b>	
<b>Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61</b>	<b>Data podpisania umowy 12 listopada 2012 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>trwa realizacja robót budowlanych</li> <li>trwa procedura aneksowania umowy o dofinansowanie (wydłużenie terminu realizacji projektu z 30 kwietnia 2015 r. na 30 listopada 2015 r.)</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektu</li> </ul>	
<b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 30 listopada 2015 r.</b>	



<b>Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875</b>	<b>Data podpisania umowy 24 października 2012 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w listopadzie 2014 r. droga została przekazana do użytkowania</li> <li>• złożono wnioski o płatność końcową, przeprowadzono kontrolę na zakończenie projektu, wdrożono zalecenia pokontrolne</li> <li>• trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozliczenie projektu</li> </ul>	
<b>Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa</b>	<b>Data podpisania umowy 27 grudnia 2010 r.</b>
<b>Stan zaawansowania projektu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt pierwotnie nie był zgłaszany jako „duży”, lecz w związku ze zwiększeniem kosztu całkowitego projektu (zmiana wykonawcy), zmienił się jego status</li> <li>• wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu został przesłany do akceptacji KE w czerwcu 2015 r.</li> <li>• w maju 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych</li> <li>• obecnie prowadzone są roboty budowlane</li> </ul>	
<b>Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorowanie postępu realizacji rzeczowej i finansowej</li> </ul>	
<b>Planowana data zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2015 r.</b>	

#### Projekty zakończone

<b>Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28</b>		<b>Data zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2012 r.</b>
<b>Efekty projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wybudowano obwodnicę o długości 3,84 km oraz drogi krajowe o długości 3,44 km</li> <li>• przebudowano 0,71 km dróg krajowych</li> <li>• oszczędność czasu w przewozach pasażerskich wyniosła 25 mln zł/rok, a w towarowych 9,6 mln zł/rok</li> </ul>	
<b>Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa</b>		<b>Data zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2013 r.</b>
<b>Efekty projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wybudowano obwodnicę o długości 11,31 km</li> <li>• oszczędność czasu w przewozach towarowych i pasażerskich wyniosła 40 mln zł/rok</li> </ul>	
<b>Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78</b>		<b>Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2013 r.</b>
<b>Efekty projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wybudowano obwodnicę o długości 7,86 km</li> <li>• oszczędność czasu w przewozach pasażerskich wyniosła 8,8 mln zł/rok, a w towarowych 8,4 mln zł/rok</li> </ul>	

#### Zmiany na Indyktywnej liście dużych projektów PO RPW

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany na Indyktywnej liście dużych projektów PO RPW.

## 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W okresie objętym sprawozdaniem ze środków pomocy technicznej w ramach PO RPW korzystały IZ i IP PO RPW. Działania realizowano na podstawie 2 projektów:

- 1) *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2015 dla Instytucji Zarządzającej - okres realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.*
- 2) *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2015 dla Instytucji Pośredniczącej – okres realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.*

### Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na 2015 r. dla Instytucji Zarządzającej

Całkowita wartość projektu wynosi 2 713 000,00 zł, w tym EFRR 2 306 050,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. z kwoty przeznaczonej na I półrocze, tj. 1 598 971,50 zł wydatkowano kwotę 286 527,21 zł, co stanowiło 17,92% zaplanowanych środków.

Wsparcie wdrażania i zarządzania PO RPW ze środków pomocy technicznej PO RPW realizowane było poprzez:

- 1) **podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników** wykonujących zadania w ramach PO RPW, na co zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 20 000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 590,00 zł, co stanowiło **2,95% zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszt szkolenia pracownika.
- 2) **pokrycie wydatków na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej**, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 195 000,00 zł, z której wydatkowano 21 903,38 zł, co stanowiło **11,23% zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty:
  - delegacji krajowych i zagranicznych pracowników
  - abonamentu i połączeń telefonicznych
  - usług pocztowych i kurierskich
  - wykonania kopii/wydruków dokumentów związanych z PO RPW
- 3) **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które na I półrocze 2015 roku zarezerwowano kwotę w wysokości 890 003,50 zł, a wydatkowano kwotę 207 835,30zł, co stanowiło **23,35% zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty:
  - obsługi cateringowej spotkania poświęconego planowanemu do realizacji w ramach POPW 2014-2020 działaniu *Platformy startowe dla nowych pomysłów*
  - obsługi cateringowej spotkania rocznego dla PO RPW 2007-2013 z Komisją Europejską
  - obsługi cateringowej spotkania Grupy Roboczej KM POPW ds. Transportu i przedsiębiorczości
  - obsługi cateringowej II posiedzenia Komitetu Monitorującego POPW
  - obsługi cateringowej Komitetu Monitorującego PORPW
  - organizacji i obsługi I posiedzenia Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej
  - organizacji i obsługi spotkania dot. omówienia wyników negocjacji z Komisją Europejską w zakresie ostatecznego kształtu programów planowanych do realizacji na obszarze makroregionu Polski Wschodniej w perspektywie finansowej 2014-2020
  - usług zastępstwa procesowego, nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w odniesieniu do spraw wnoszonych po wyczerpaniu procedury odwoławczej wynikającej z systemu realizacji PO RPW
  - usług doradztwa prawnego w zakresie przygotowania do wdrażania POPW 2014-2020
  - usług zastępstwa prawnego na etapie postępowania administracyjnego przed WSA oraz nadzorowanie postępowań administracyjnych

- usług zastępstwa procesowego, nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w odniesieniu do spraw wnoszonych po wyczerpaniu procedury odwoławczej wynikającej z systemu realizacji PO RPW
  - opinii prawnej dot. występowania pomocy publicznej w komponencie promocyjnym projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej*
  - ekspertyzy w zakresie przeglądu i uzupełnienia procedur systemu kontroli PO RPW 2007-2013 w kontekście działań antykorupcyjnych i zwalczania nadużyć finansowych oraz przygotowania założeń systemu kontroli POPW na lata 2014-2020
  - opinii prawnej dot. interpretacji art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia KE nr 651/2014 w kontekście planowanych przez MliR kryteriów selekcji wniosków o dofinansowanie działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I *Przedsiębiorcza Polska Wschodnia*
  - tłumaczeń pisemnych i ustnych
  - podróży członków Komitetu Monitorującego PO RPW 2007-2013 i POPW 2014-2020
- 4) **realizację działań informacyjno-promocyjnych**, na które na I półrocze 2015 r. zarezerwowano kwotę w wysokości 170 573,50 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 16 309,63 zł, co stanowiło **9,56% zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty:
- składu i druku teczek konferencyjnych i notatników A4, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz ulotek dot. POPW 2014-2020
  - streszczenia POPW 2014-2020
- 5) **realizację działań kontrolnych**, na które w 2015 r. nie rezerwowano żadnych środków. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. nie dofinansowano żadnych wydatków.
- 6) **realizację działań ewaluacyjnych**, na które zarezerwowano w I półroczu 2015 r. kwotę w wysokości 323 394,50 zł, z której wydatkowano 39 888,90 zł, co stanowiło **12,33% zaplanowanych środków**. W tym obszarze dofinansowano koszty:
- wykonania IV etapu badania ewaluacyjnego pt.: *"Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020"*
  - usług doradczych w zakresie wskaźników w ramach PO RPW i POPW.

Tabela 12. Wskaźniki realizacji projektu dla RPD IZ PO RPW

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
<i>Wskaźniki produktu</i>					
<i>Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji</i>	szt.	0	46	8	17,39
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	szt.	0	8	2	25,00
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych</i>	szt.	0	22 250	21 501	96,63
<i>Delegacje zagraniczne</i>	szt.	0	16	3	18,75
<i>Delegacje krajowe</i>	szt.	0	35	41	117,14
<i>Tłumaczenia</i>	szt.	0	10	6	60,00

#### Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2015 dla Instytucji Pośredniczącej

Całkowita wartość projektu wynosi 3 177 909,54 zł, w tym EFRR 2 701 000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. z kwoty przeznaczonej na I półrocze, tj. 1 735 765,62 zł wydatkowano kwotę 1 043 876,54 zł, co stanowiło **60,14% zaplanowanych środków**. Niski poziom wydatkowania środków w I półroczu (z wyjątkiem działań kontrolnych) jest związany z planowanym przeniesieniem ich wydatkowania na IV kwartał 2015 roku.

Wsparcie działań Instytucji Pośredniczącej ze środków pomocy technicznej PO RPW realizowane było poprzez:

- 1) **podnoszenie kwalifikacji**, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 48 450,00 zł, z której wydatkowano kwotę 11 301,82 zł, co stanowiło **23,33% zaplanowanych środków**. W ramach kategorii dofinansowano koszty szkoleń dla pracowników IP PO RPW.
- 2) **pokrycie wydatków na funkcjonowanie IP**, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 1 047 799,56 zł, z czego wydatkowano kwotę 689 896,09 zł, co stanowiło **65,84% zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty:
  - wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umowy zlecenia
  - delegacji krajowych
  - wynajmu powierzchni biurowej
  - usług telekomunikacyjnych
  - leasingu operacyjnego samochodów służbowych
- 3) **pokrycie kosztów realizacji PO RPW**, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 203 711,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 102 464,40 zł, co stanowiło **50,30% zaplanowanych środków**. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. dofinansowano koszty usług cateringowych oraz usług doradczych w zakresie projektów PO RPW.

- 4) realizację działań informacyjno-promocyjnych, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 230 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 14 391,00 zł, co stanowiło **6,26% zaplanowanych środków**. W ramach działań informacyjno-promocyjnych dofinansowano koszty opracowania projektów graficznych, składu, produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych dotyczących PO RPW.
- 5) realizację działań ewaluacyjnych, na które nie rezerwowano żadnych środków na I półrocze 2015 r. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. nie dofinansowano żadnych wydatków. Wszystkie wydatki są zaplanowane na II półrocze 2015 r.
- 6) realizację działań kontrolnych, na które zarezerwowano na I półrocze 2015 r. kwotę w wysokości 205 804,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 225 823,23 zł, co stanowiło **109,73% zaplanowanych środków**. Dofinansowano koszty kontroli projektów.

Tabela 13. Wskaźniki realizacji projektu dla RPD IP PO RPW

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stożenie realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
<i>Wskaźniki produktu</i>					
<i>Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>64,40</i>	<i>67,92</i>	<i>105,46</i>
<i>Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>3,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>171,00</i>	<i>26,00</i>	<i>15,20</i>
<i>Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Od rozpoczęcia realizacji PO RPW dofinansowano ze środków pomocy technicznej 18 projektów. Ich łączna wartość wyniosła **112 521 455,17 zł**, z czego dofinansowanie EFRR wyniosło **95 643 013,37 zł**.

Tabela 14. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu w zł
1.	Szkolenia	---	2 839 463,50
2.	Promocja i informacja	---	18 469 521,16
3.	Zatrudnienie	---	30 882 513,01
4.	Sprzęt komputerowy	---	2 065 594,39
5.	Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych	---	7 163 750,93
6.	Ekspertyzy/doradztwo	---	23 714 336,15
7.	Ewaluacje	---	2 358 095,08
8.	Kontrola/audyt	---	2 489 032,32
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	---	495 052,08
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	---	260 111,17
11.	Inne	---	4 905 543,58
12.	Razem	18	95 643 013, 37

## **7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji<sup>35</sup>**

Wszystkie działania w zakresie informacji i promocji PO RPW w okresie sprawozdawczym prowadzone przez IZ i IP PO RPW były zgodne z Planem Komunikacji PO RPW.

Szczegółowe informacje na temat działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO RPW zrealizowanych w I półroczu 2015 r. znajdują się w załączniku 2 do sprawozdania zgodnym z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości.

---

<sup>35</sup> Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Anna Jaworska
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. 22 273 82 16 E-mail: Anna.Jaworska@mir.gov.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	14 września 2015 r., Warszawa
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Monika Pałasz
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. 22 273 82 01 Fax. 22 273 89 14 E-mail: Monika.Palasz@mir.gov.pl
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
.....	
