



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO

UNIA
EUROPEJSKA



**Sprawozdanie okresowe
za I półrocze 2009 r.
z realizacji PO RPW 2007-2013
i aktualny stan wdrażania Programu
(wg stanu na 30 września 2009 r.)**

**Agnieszka Kapciak
Dyrektor
Departamentu Programów Ponadregionalnych, MRR**

**Komitet Monitorujący PO RPW 2007-2013
16 listopada 2009 r.**

Plan prezentacji

- I. **Sprawozdanie okresowe z realizacji PO RPW w I półroczu 2009 r. – informacje ogólne**
- II. **Istotne zmiany w procesie wdrażania PO RPW**
- III. **Postęp rzeczowy i finansowy we wdrażaniu PO RPW na dzień 30 września 2009 r.**
- IV. **Problemy we wdrażaniu PO RPW oraz podjęte działania zaradcze i działania mające na celu przyspieszenie wydatkowania środków**
- V. **Duże projekty**
- VI. **Wykorzystanie pomocy technicznej i działania informacyjno-promocyjne**

I. Sprawozdanie okresowe z realizacji PO RPW 2007-2013 w I półroczu 2009 r.

- Dokument został sporządzony zgodnie ze wzorem i terminem wynikającymi z *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości* z dnia 29 maja 2008 r.
- IZ PO RPW przekazała sprawozdanie **do wiadomości** IK NSRO, IC oraz IZ POPT w dniu 31 sierpnia 2009 r.
- Dokument przedłożony Członkom KM PO RPW uwzględnia uwagi zgłoszone przez IK NSRO i IC

II. Istotne zmiany w procesie wdrażania PO RPW 2007-2013

1. Zmiana PO RPW 2007-2013 przyjęta decyzją KE

Zmiana miała na celu umożliwienie realizacji projektu w ramach działania I.2 dot. organizacji i wzmocnienia systemu prowadzenia działalności reporenczeniowej dla funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej

- Beneficjent: Bank Gospodarstwa Krajowego
- Wartość projektu EFRR w euro: 20 mln
- % alokacji Programu: 0,88

2. Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO RPW 2007-2013

- zmiany z dnia 12 sierpnia 2009 r. dot. działania I.2 w zakresie:
 - alokacji na działanie z 5 do 20 mln euro z EFRR
 - celu i uzasadnienia działania
 - typów beneficjentów i grup docelowych
 - trybu przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie oraz ich oceny
- zmiany z dnia 27 kwietnia 2009 r. dot. m.in.:
 - aktualizacji systemu wyboru projektów i LPI
 - zaleceń dla beneficjentów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 - doprecyzowania typów beneficjentów, grup docelowych, przykładów projektów w działaniach I.4 i III.2


3. Wejście w życie aktów prawnych dla PO RPW

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej *na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych* w ramach PO RPW 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej *na rozwój ośrodków innowacyjności* w ramach PO RPW 2007-2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej *na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej* PO RPW 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 117)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej *na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego* w ramach PO RPW 2007-2013 (Dz. U. Nr 61, poz. 503)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO RPW 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 1129)




III. Postęp rzeczowy i finansowy we wdrażaniu PO RPW 2007-2013 wg stanu na 30 września 2009 r.


Liczba podpisanych umów o dofinansowanie oraz ich wartość jako % alokacji EFRR na Program wg okresów (Osie Priorytetowe I-V)

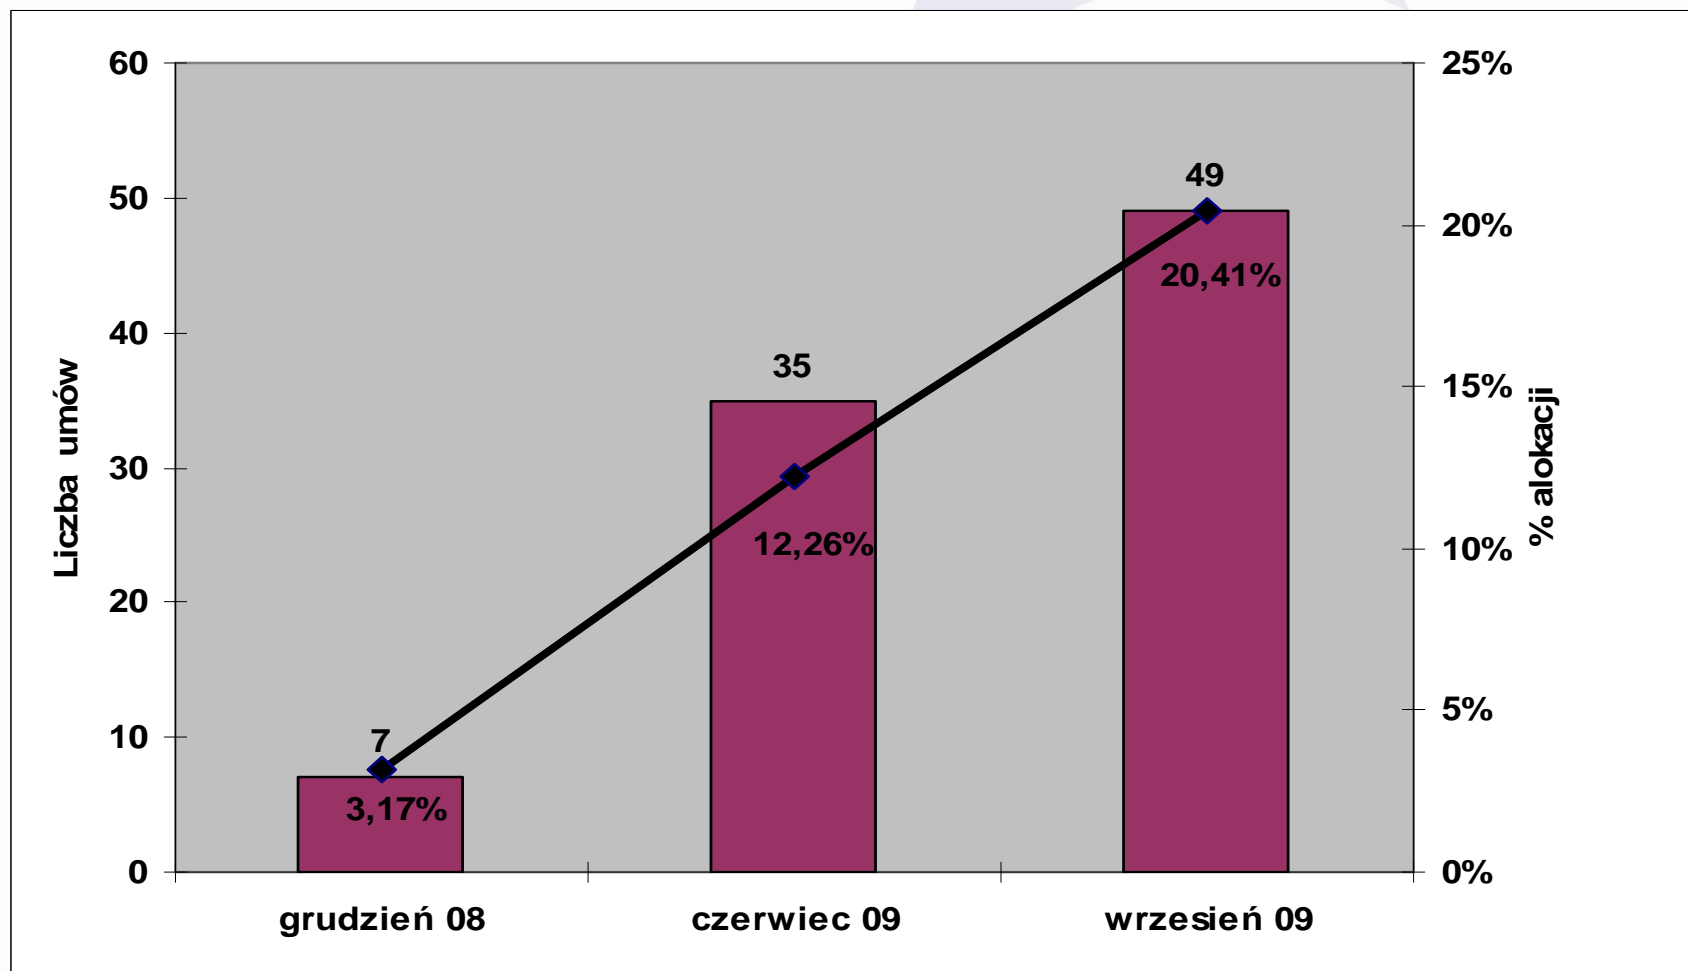


Liczba zatwierdzonych wniosków oraz podpisanych umów od początku realizacji programu wg województw (Osie I-V)

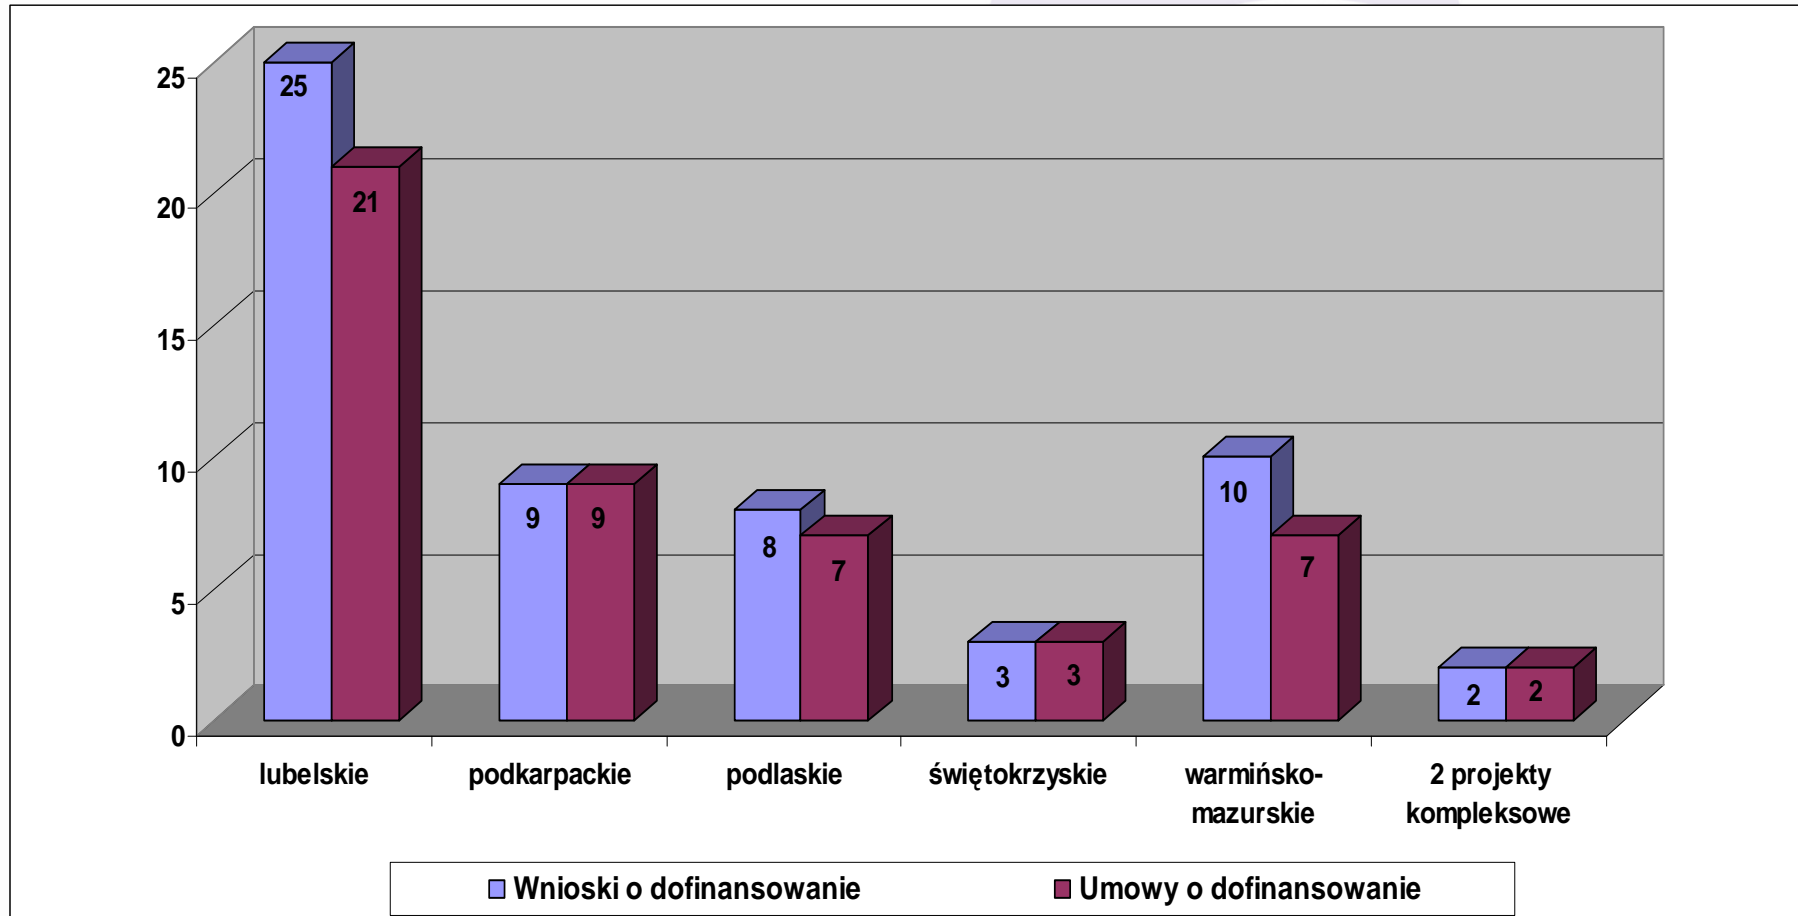


Wartość EFRR zatwierdzonych wniosków oraz podpisanych umów od początku realizacji programu w mln zł

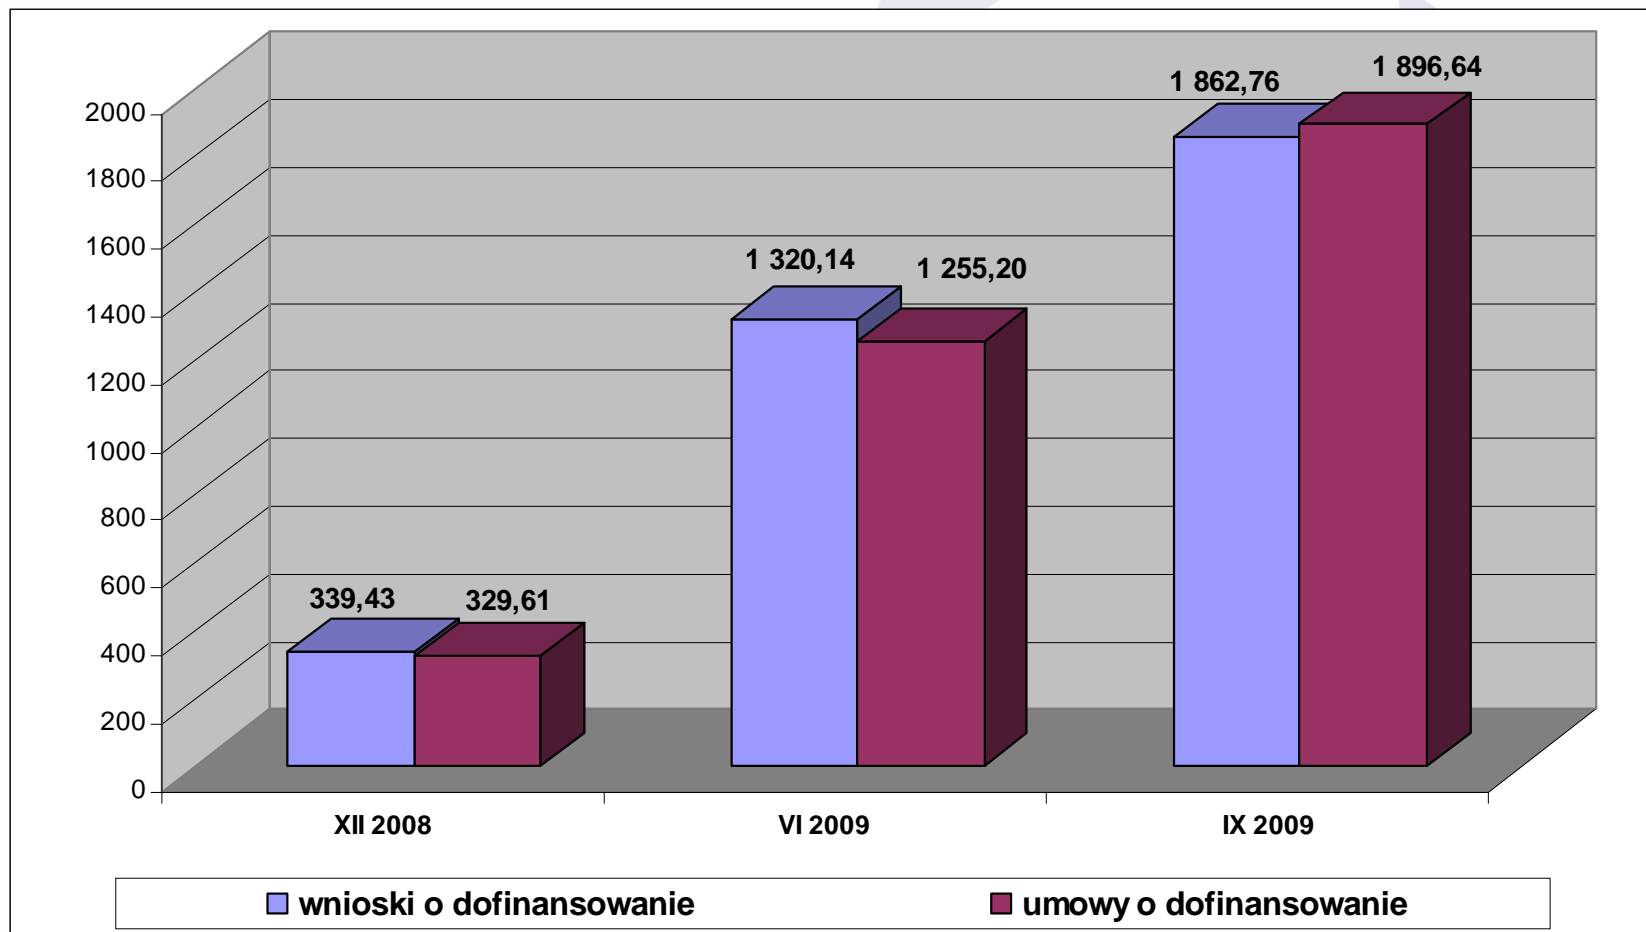


Wartość EFRR zatwierdzonych wniosków oraz podpisanych umów od początku realizacji programu wg województw w mln zł (osie I-V)

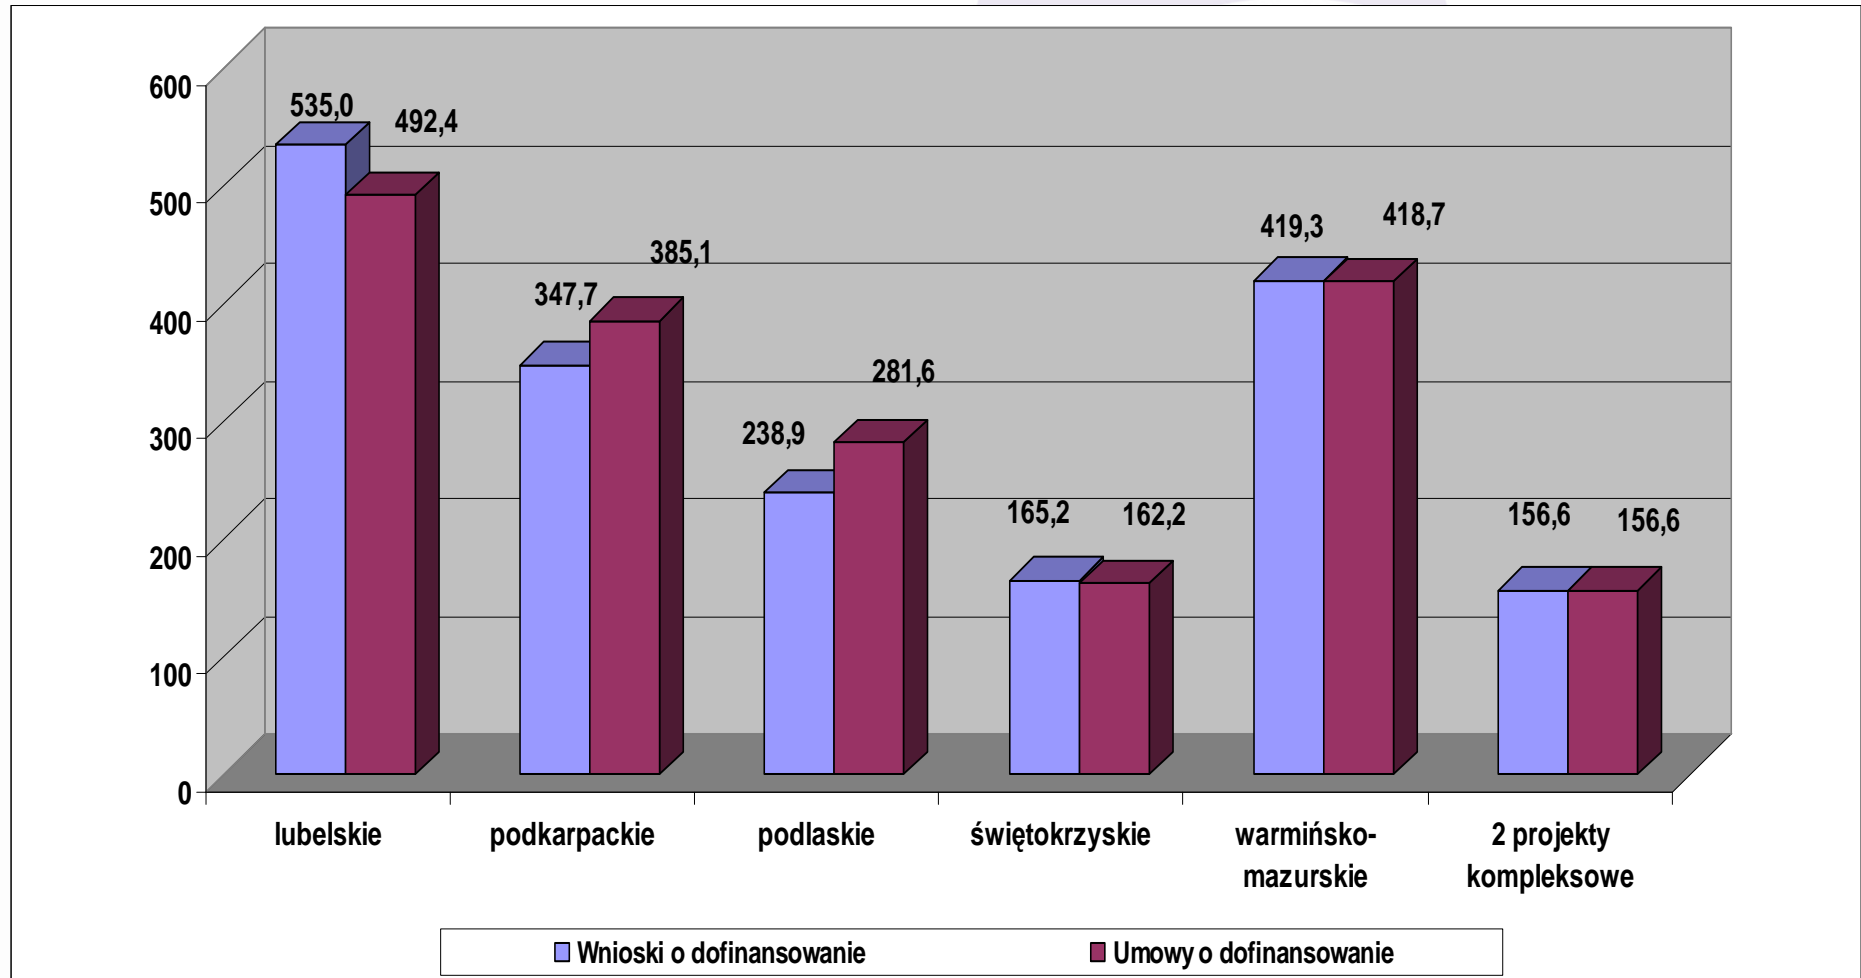


Liczba i wartość EFRR zatwierdzonych wniosków od początku realizacji programu wg osi priorytetowych I-V (w mln zł)

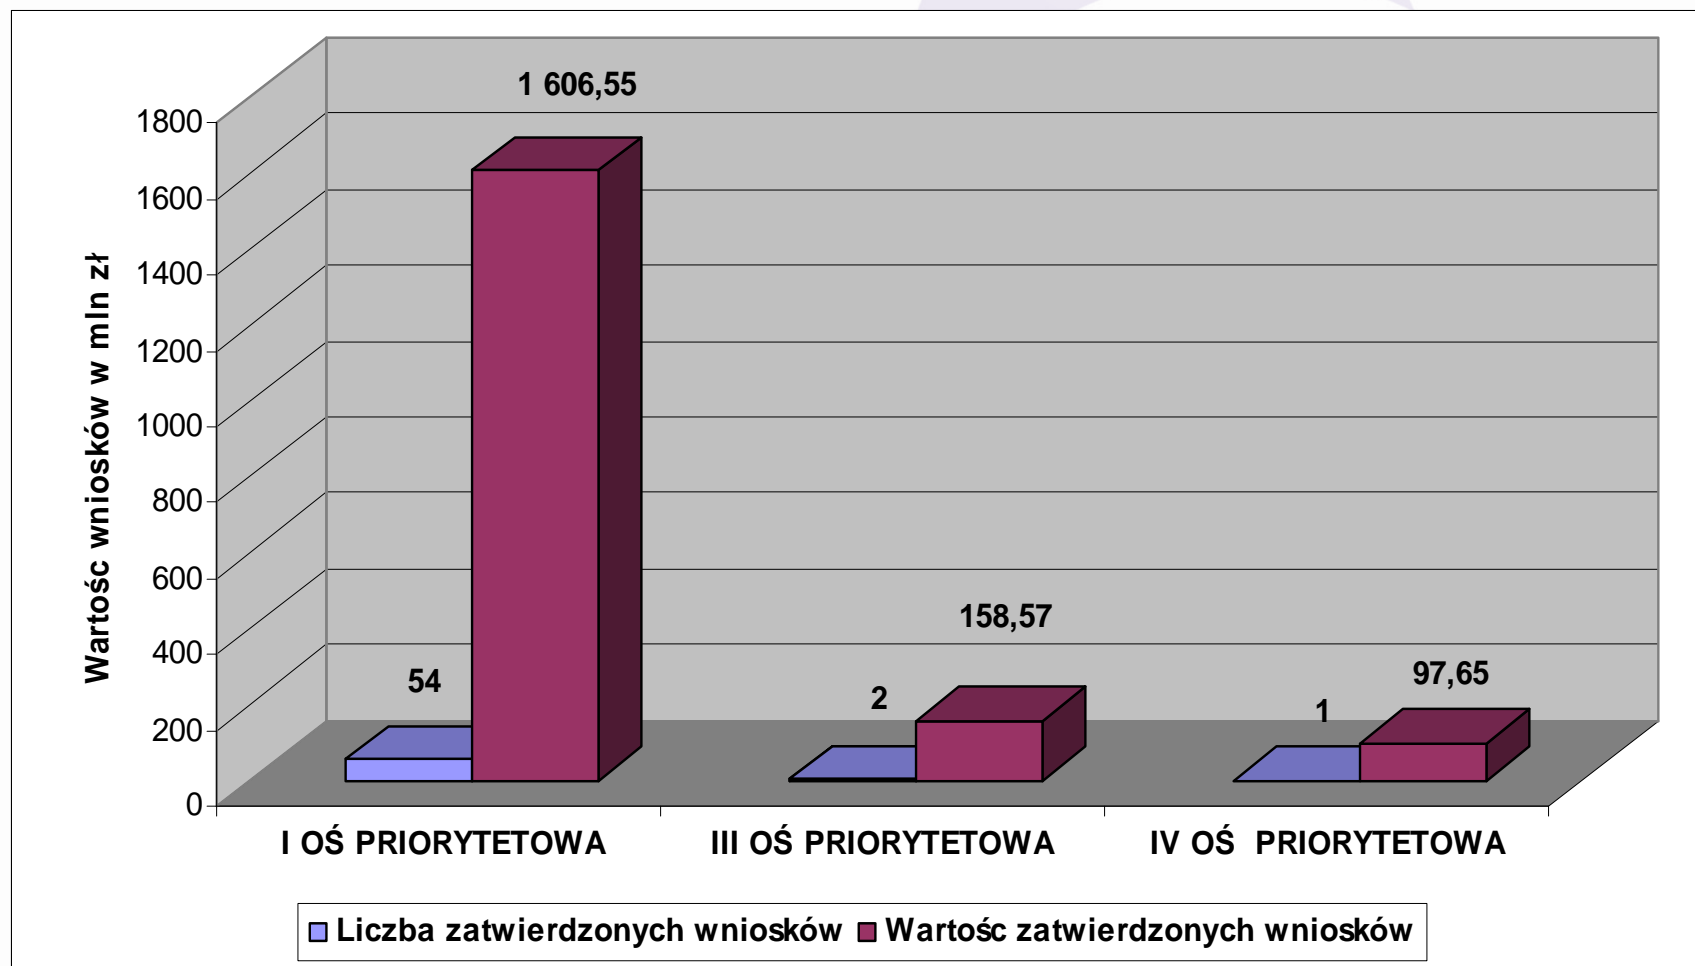

Liczba i wartość EFRR podpisanych umów od początku realizacji programu wg osi priorytetowych (I-V) (w mln zł)

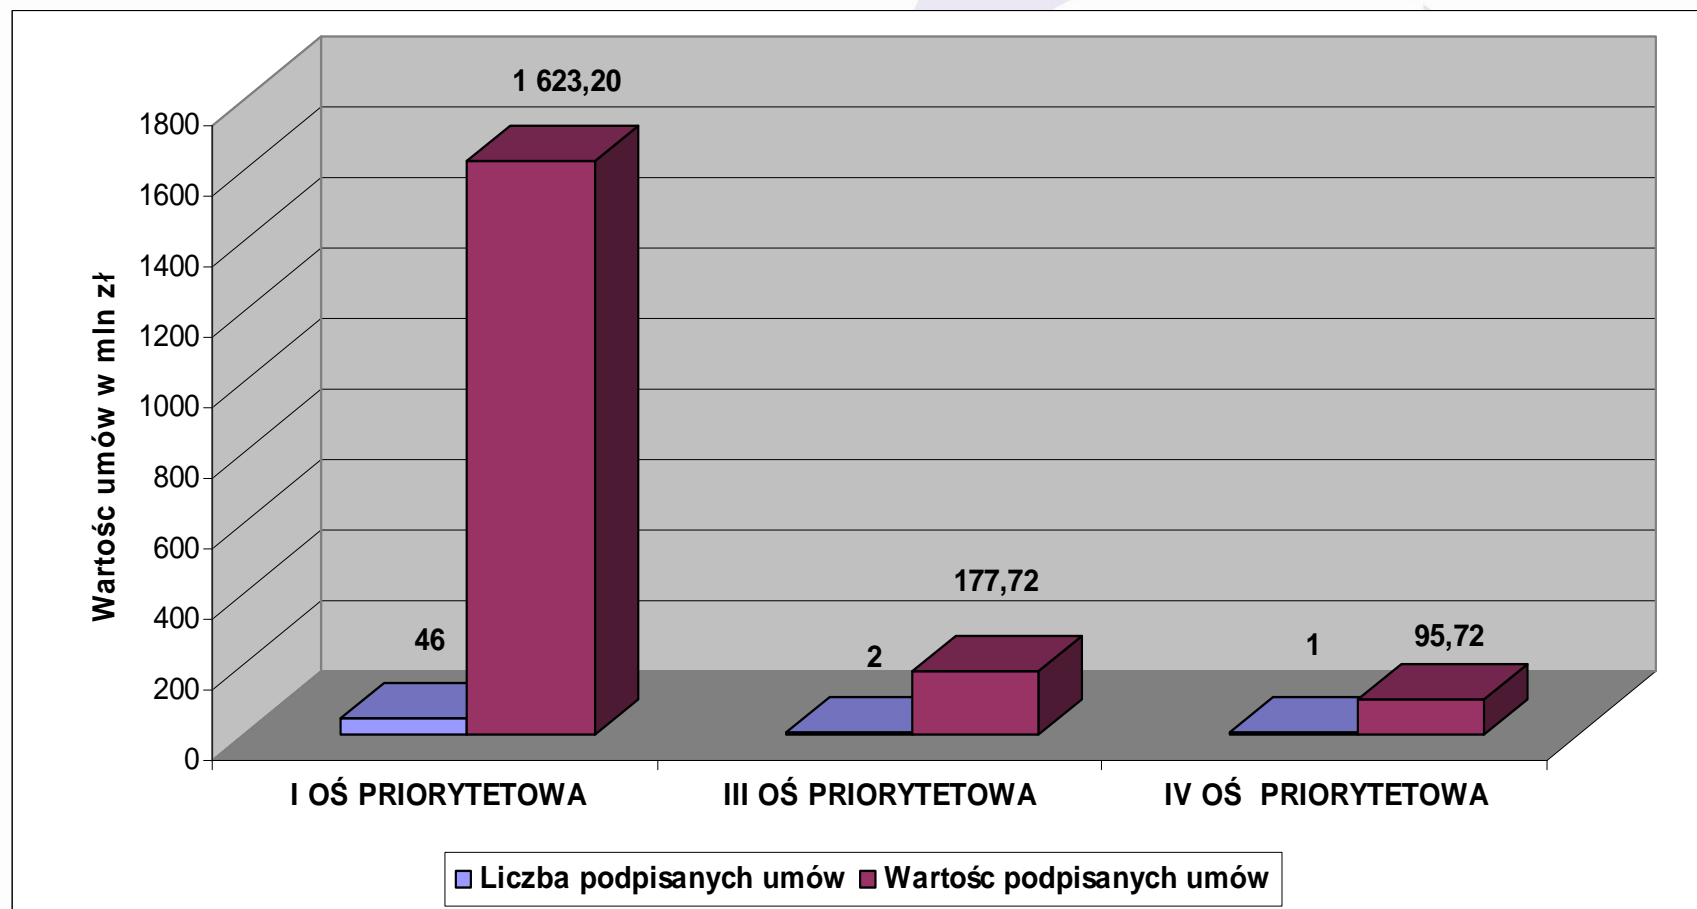

Cel certyfikacji i wykonanie

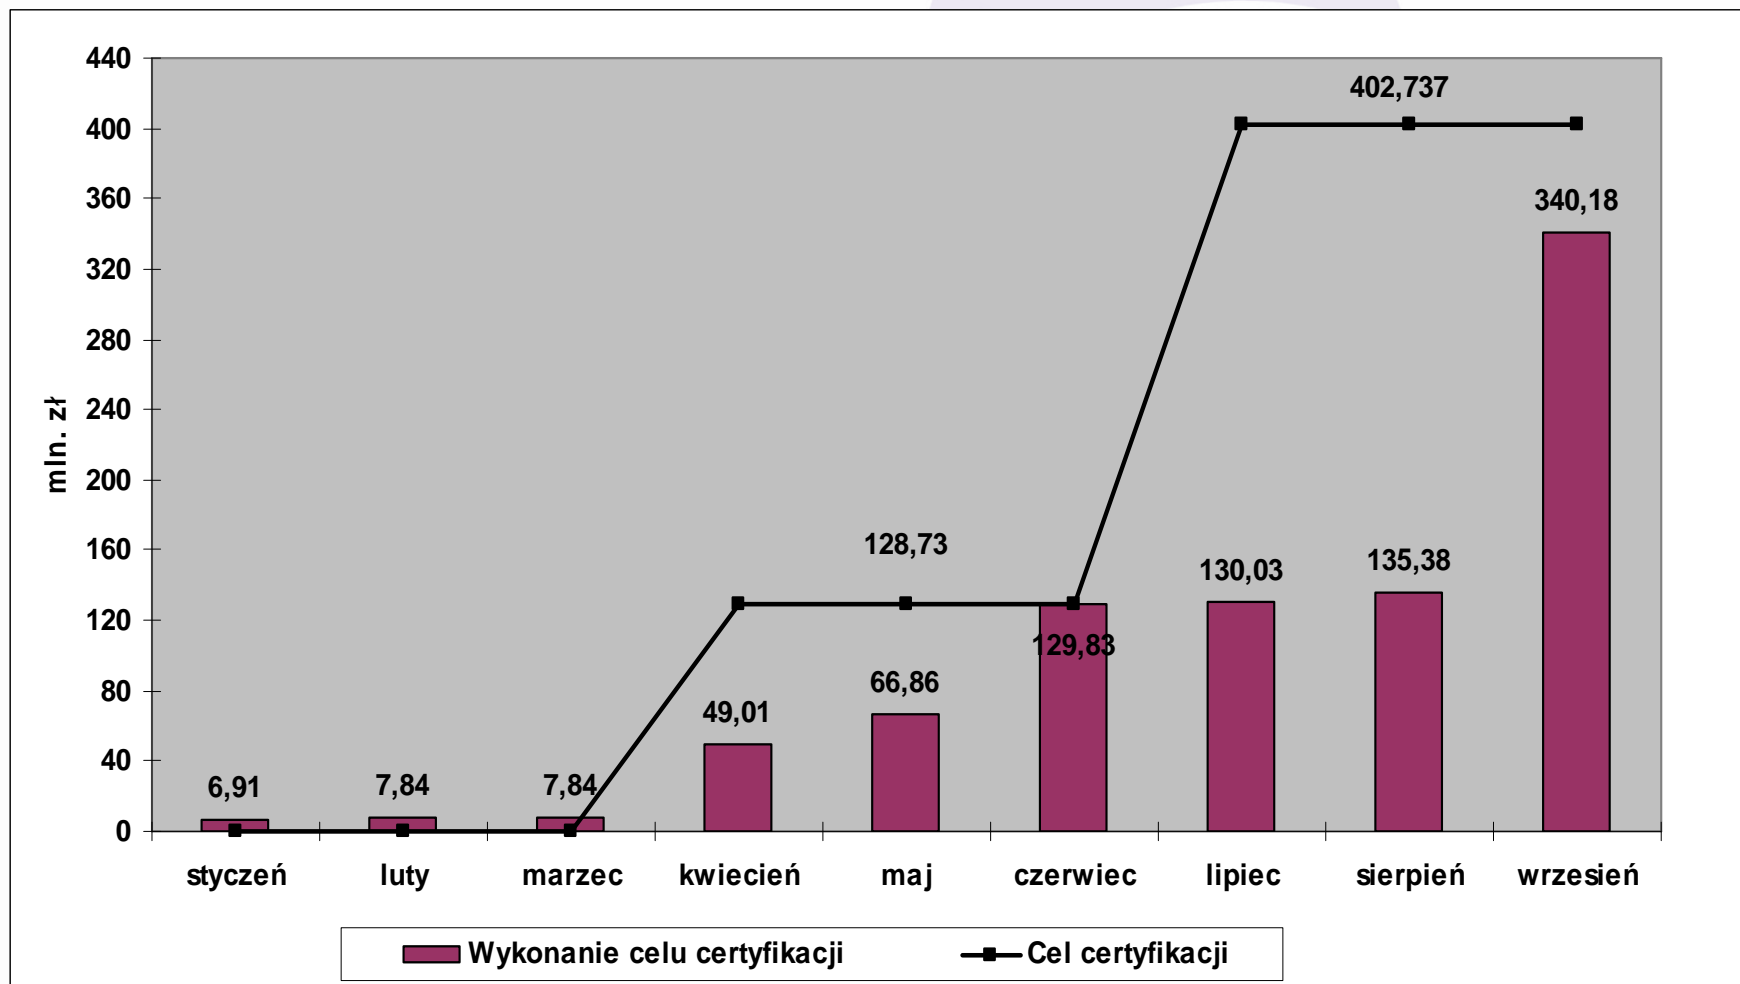

I OŚ PRIORYTETOWA



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Działanie I.1 Infrastruktura uczelni stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% alokacji
21	1 248 186 385,59 PLN	872 352 726,40 PLN	61,38 %
zawarte umowy o dofinansowanie			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% realizacji zobowiązań
17	1 045 773 987,33 PLN	806 587 170,85 PLN	56,75 %
certyfikacja wydatków			
ogółem	wydatki kwalifikowane (ogółem)	wydatki kwalifikowane (EFRR)	% realizacji zobowiązań
98 761 940,99 PLN	96 899 158,30 PLN	78 613 217,47 PLN	5,53 %

Działanie I.1 Infrastruktura uczelni

stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

lista projektów indywidualnych

W ramach działania zaplanowano realizację 26 projektów indywidualnych, w tym:

- 17 projektów zakontraktowano
- 4 projekty są w trakcie oceny merytorycznej bądź na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie
- 1 projekt podlega ocenie formalnej
- 3 wnioski o dofinansowanie zostaną złożone do końca 2009r.
- 1 (ostatni) wniosek zostanie złożony w kwietniu 2010 r.

Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej (1/4)

Stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

Działanie wdrażane jest przez **Bank Gospodarstwa Krajowego** w ramach projektu pn. „**Reporeczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej**”

- Data zawarcia umowy **31.VIII.2009 r.**

zawarte umowy o dofinansowanie			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% realizacji zobowiązań
1	98 294 117,63 PLN	83 550 000,00 PLN	100 %
certyfikacja wydatków			
ogółem	wydatki kwalifikowane (ogółem)	wydatki kwalifikowane (EFRR)	% realizacji zobowiązań
98 294 117,63 PLN	98 294 117,63 PLN	83 550 000,00 PLN	100 %

Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej (2/4)


Przedmiotem projektu jest organizacja i wzmocnienie systemu funduszy, prowadzących działalność poręczeniową w pięciu województwach Polski Wschodniej, wyłonionych w trybie konkursowym.

Realizacja projektu przyczyni się do:

- poprawy dostępności przedsiębiorców z obszaru Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finansowania
- podniesienia gotowości przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP, do inwestowania,
- bezpośredniego wsparcia większej grupy docelowej niż przy wsparciu w formie dotacyjnej dla MSP dzięki mechanizmowi odnawialności (mechanizm dźwigni finansowej) czyli wielokrotnemu udostępnianiu środków.

Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej (3/4)

Schemat realizacji projektu

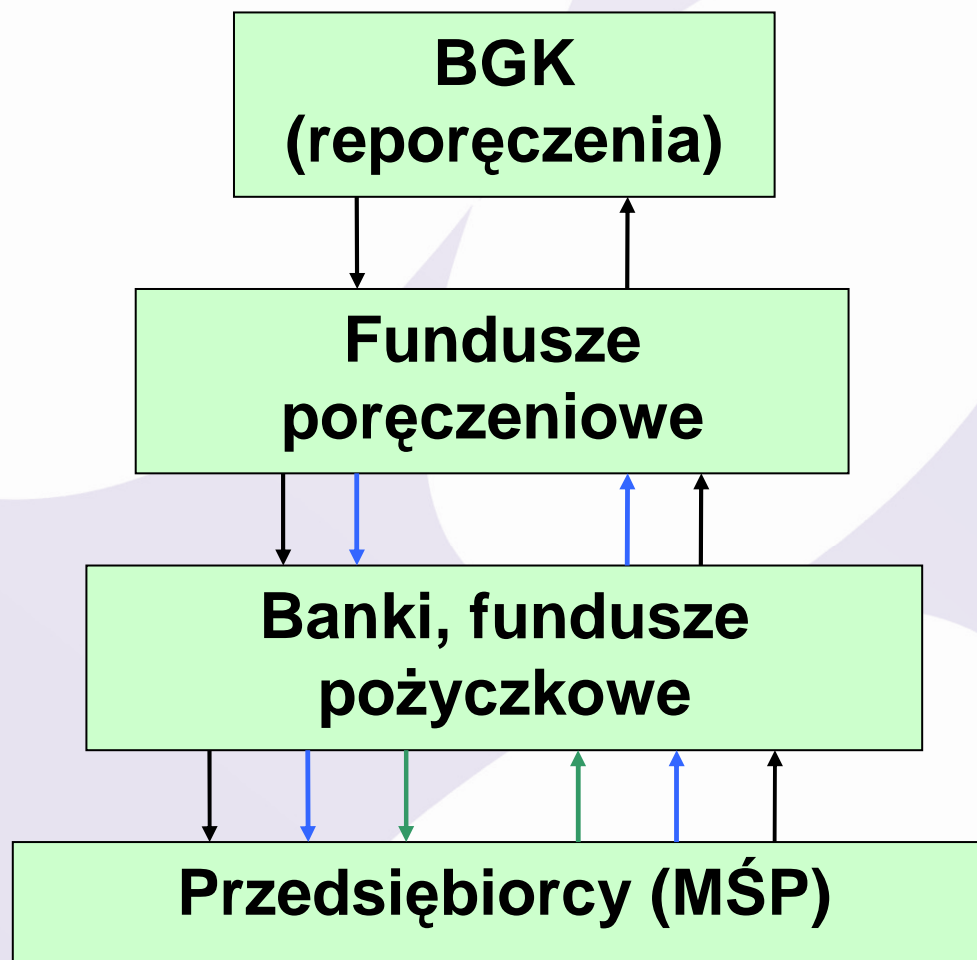

Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej (4/4)

Działania zrealizowane

- Przygotowano produkt – trzy rodzaje reporczeń:
 - płatności,
 - transakcji,
 - portfelowe;
- Opracowano instrukcje udzielania reporczeń oraz regulaminy wewnętrzne
- Przygotowano wnioski do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie zasad realizacji reporczeń

Działania planowane do realizacji w IV kw. 2009 i I kw. 2010 r.

- Przygotowanie oferty konkursowej
- Ogłoszenie konkursu dla funduszy poręczeniowych

Działanie I.3 Wspieranie innowacji stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% alokacji
42	1 090 269 982,47 PLN	798 090 801,26 PLN	48,25 %
zawarte umowy o dofinansowanie			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% realizacji zobowiązań
27	871 019 250,05 PLN	659 966 120,58 PLN	39,90 %
certyfikacja wydatków			
ogółem	wydatki kwalifikowane (ogółem)	wydatki kwalifikowane (EFRR)	% realizacji zobowiązań
39 240 454,07 PLN	37 684 678,05 PLN	34 099 496,60 PLN	2,06 %

Konkurs w ramach działania I.3 Wspieranie innowacji

Nabór projektów w ramach Działania I.3 trwał od 6 marca do 30 września 2009 r.

Obowiązywała forma konkursu otwartego – ocena wniosków odbywała się systematycznie w miesięcznych rundach

Konkurs w działaniu I.3 PO RPW	alokacja EFRR w mln euro	ilość złożonych wniosków	Wnioskowana wartość dofinansowania złożonych wniosków w mln euro	ilość zawartych umów	wartość udzielonego dofinansowania w mln euro	wartość projektów zatwierdzonych - rezerwowych w mln euro
wyposażenie i B+R	89,60	30	147,23	14	88,64	26,39
tereny inwestycyjne	22,40	7	11,18	2	3,38	*trwa ocena projektów
ogółem	112,00	37	158,41	16	92,02	26,39

Działanie I.3 Wspieranie innowacji

stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

lista projektów indywidualnych

W ramach działania zaplanowano realizację 30 projektów indywidualnych, w tym:

- 11 projektów zakontraktowano
- 2 projekty są w trakcie oceny merytorycznej
- 1 projekt znajduje się w ocenie formalnej
- 4 wnioski o dofinansowanie powinny zostać złożone do końca 2009 r.
- 10 zostanie złożonych w 2010 r.
- 1 (ostatni) wniosek zostanie złożony w IV kwartale 2011 r.
- z jednym beneficjentem rozwiązano pre-umowę

Działanie I.4 Promocja i współpraca (1/8)

stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% alokacji
19	168 947 085,66 PLN	139 173 444,78 PLN	83%
zawarte umowy o dofinansowanie			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% realizacji zobowiązań
1	85 999 999,14 PLN	73 099 999,27 PLN	43%
certyfikacja wydatków			
ogółem	wydatki kwalifikowane (ogółem)	wydatki kwalifikowane (EFRR)	% realizacji zobowiązań
0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0%

Działanie I.4 Promocja i współpraca (2/8)

Działania zrealizowane do 30 września 2009 r.

- Przeprowadzono w terminie od 20 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w obszarach:
 - „stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora”
 - „tworzenie i rozwój klastrów”
 - „tworzenie polityki rozwoju regionalnego”
- Zawarto umowę o dofinansowanie z projektem indywidualnym w obszarze „promocja”

Działania planowane do końca 2009 r.

- Zakończenie I rundy konkursu projektów
- Zawarcie umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów zatwierdzonych do realizacji w I rundzie konkursu
- Przygotowanie II rundy konkursu

Działanie I.4 Promocja i współpraca (3/8)

Wyniki konkursów

Konkurs w działaniu I.4 PO RPW	alokacja EFRR w mln euro	ilość złożonych wniosków	Wnioskowana wartość dofinansowania złożonych wniosków w mln euro	ilość projektów zatwierdzonych	wartość dofinansowania w projektach zatwierdzonych w mln euro	szacunkowa wartość wolnych środków w mln euro
stworzenie sieci współpracy	8,10	2	6,66	2	5,82	2,28
tworzenie i rozwój klastrów	10,01	16	13,65	9	5,86	4,15
tworzenie polityki rozwoju regionalnego	5,00	6	1,28	5	1,06	3,94
ogółem	23,11	24	21,59	16	12,74	10,37

Działanie I.4 Promocja i współpraca (4/8)

Promocja gospodarcza Polski Wschodniej

Działanie wdrażane jest przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ramach projektu pn. „Program promocji gospodarczej Polski Wschodniej”.

Data zawarcia umowy: 29.VII.2009 r.

Wartość projektu ogółem: 86 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR: 73,1 mln PLN

Uroczyste otwarcie Programu nastąpiło 23.IX.2009 r.

Działanie I.4 Promocja i współpraca (5/8)

Promocja gospodarcza Polski Wschodniej

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

- badania marketingowe i analizy gospodarcze
- opracowanie i wdrożenie identyfikacji wizualnej
- działania promocyjne (PR, kampania promocyjna w mediach krajowych i zagranicznych)
- produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych
- wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych
- organizacja seminariów i konferencji
- udział w konferencjach i seminariach
- udział w forach gospodarczych
- udział w imprezach targowo-wystawienniczych
- wizyty studyjne przedstawicieli Polski Wschodniej
- budowa i utrzymanie portalu gospodarczego
- działania promujące projekt

Działanie I.4 Promocja i współpraca (6/8)

Promocja gospodarcza Polski Wschodniej

działania zrealizowane w III kw. 2009 r.

- opracowanie *Analizy ekonomicznej potencjału gospodarczego Polski Wschodniej*
- konferencja promocyjna Programu z udziałem inwestorów
- wydanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie

działania realizowane i planowane w IV kw. 2009 r.

- rozpoczęcie prac nad *Strategią komunikacji marketingowej Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej na lata 2009-2015*
- udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości *Barcelona Meeting Point* (27.10-1.11 2009 r.)
- ogłoszenie konkursu na wykonanie identyfikacji wizualnej Programu (termin realizacji: do końca IV kw. 2009)
- przeprowadzenie przetargu na wykonanie badań ewaluacyjnych ex-ante Programu (termin realizacji: do końca I kw. 2010)

Działanie I.4 Promocja i współpraca (7/8)

Promocja gospodarcza Polski Wschodniej

działania realizowane i planowane w IV kw. 2009 r. (c.d.)

- kontynuowanie działań związanych z przygotowaniem, organizacją, obsługą i udziałem w:
 - **misjach gospodarczych:** przygotowanie listy gospodarczych misji wyjazdowych na rok 2010 oraz ich harmonogramu
 - **forach gospodarczych:** rozpoczęcie współpracy z partnerami zewnętrznymi w celu identyfikacji potencjalnych partnerów handlowych oraz wybór imprezy
 - **wizytach studyjnych:** przygotowanie listy wizyt studyjnych na 2010 r.
 - **imprezach targowo-wystawienniczych:** nawiązanie współpracy z partnerami zewnętrznymi w celu identyfikacji potencjalnych partnerów handlowych oraz wyboru targów i imprez wystawienniczych, przygotowanie dokumentacji na konkurs do udziału w targach i wystawach oraz zarezerwowanie powierzchni wystawienniczej na trzy międzynarodowe imprezy targowe w 2010 r.;

Działanie I.4 Promocja i współpraca (8/8)

Promocja gospodarcza Polski Wschodniej

działania realizowane i planowane w IV kw. 2009 r. (c.d.)

- ogłoszenie przetargu na produkcję publikacji dla Programu: katalogów poddostawców, albumu promocyjnego, ulotek, publikacji nt. sektorów o dużym potencjale rynkowym
- zorganizowanie dwóch konferencji prasowych: listopad (strategia, priorytetowe rynki i sektory), grudzień (system identyfikacji wizualnej projektu)
- ogłoszenie przetargu na budowę portalu gospodarczego Polski Wschodniej oraz jego obsługę merytoryczną

działania planowane do realizacji do końca kwietnia 2010 r.

- zakończenie badań ewaluacyjnych ex-ante Programu
- zakup mediów dla projektu: czasy antenowe, radiowe, billboardy, akcje informacyjne
- sfinansowanie tłumaczeń oraz wydanie publikacji dla Programu: katalogów poddostawców, albumu promocyjnego, ulotek, publikacji nt. sektorów
- organizacja konferencji i seminariów dla inwestorów zainteresowanych Polską Wschodnią
- organizacja misji gospodarczych dla eksporterów

II OŚ PRIORYTETOWA



Działanie II.1

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (1/3)

- W styczniu br. **odebrano I etap** studium wykonalności - „Szczegółowy model i metodyka realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”.
- **Trwały prace** nad oceną dokumentacji **do II etapu** studium wykonalności - „Wykonanie szczegółowych studiów wykonalności dla 5 województw Polski Wschodniej”.

Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli IZ PO RPW stwierdziła istnienie licznych wad i dwukrotnie odmówiła odbioru opracowania – przewidywany termin zakończenia prac **IV kwartał 2009 r.**

Działanie II.1

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (2/3)

- Przygotowano i podpisano **porozumienie trójstronne** pomiędzy: IZ PO RPW, IP PO RPW, Zarządami Województw Polski Wschodniej w celu określenia obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją projektu.
Data podpisania porozumień: **7 lipca 2009 r.**
- Odbyły się **dwa spotkania** z operatorami telekomunikacyjnymi.
Cel:
 - przedstawienie głównych założeń projektu
 - przedstawienie modelu współpracy z operatorami
 - przedstawienie sposobu funkcjonowania sieci szerokopasmowej oraz omówienie rekomendowanych rozwiązań dla projektu

Działanie II.1

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (3/3)

- Powołano Komitet Sterujący ds. projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” składający się z przedstawiciela IZ PO RPW oraz członków zarządów województw Polski Wschodniej.
Data powołania: **21 października 2009 r.**
- Zostanie przeprowadzonych 5 indywidualnych notyfikacji pomocy publicznej (MRR będzie pełniło rolę koordynatora).
- Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie dla dużego projektu do KE – przewidywany termin **III kwartał 2010 r.**

III OŚ PRIORYTETOWA



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Działanie III.1

Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% alokacji
2	447,2 mln PLN	327,9 mln PLN	23,3%
zawarte umowy o dofinansowanie			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% realizacji zobowiązań
1	161,7 mln zł PLN	117,4 mln zł	7,7%
certyfikacja wydatków			
ogółem	wydatki kwalifikowane (ogółem)	wydatki kwalifikowane (EFRR)	% realizacji zobowiązań
72,89 mln PLN	71,64 mln PLN	71,64 PLN	4,7%

Działanie III.1

Systemy miejskiego transportu zbiorowego

stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.
lista projektów indywidualnych

W ramach działania zaplanowano realizację 6 projektów indywidualnych, w tym:

- 1 projekt zakontraktowano,
- dla 1 projektu trwa przygotowanie umowy o dofinansowanie i dokumentacji, która zostanie przekazana do KE,
- 3 wnioski o dofinansowanie powinny zostać złożone w 2010r.,
- 1 (ostatni) wniosek zostanie złożony w III kwartale 2011 r.

Działanie III.2

Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

Stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% alokacji
2	229,3 mln zł PLN	79,5 mln PLN	20,7%
zawarte umowy o dofinansowanie			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% realizacji zobowiązań
1	203,6 mln PLN	60,4 mln zł zł	15,4%
certyfikacja wydatków			
ogółem	wydatki kwalifikowane (ogółem)	wydatki kwalifikowane (EFRR)	% realizacji zobowiązań
0,0 PLN	0,0 PLN	0,0 PLN	0%

Działanie III.2

Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.
lista projektów indywidualnych

W ramach działania zaplanowano realizację 5 projektów indywidualnych, w tym:

- 1 projekt zakontraktowano
- 1 wniosek nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej
- 2 wnioski o dofinansowanie powinny zostać złożone do końca 2010 r.
- 1 projekt zostanie przy najbliższej aktualizacji LPI usunięty na wniosek beneficjenta

IV OŚ PRIORYTETOWA



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Działanie IV.1 – infrastruktura drogowa (1/3)


Stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% alokacji
2	414,0 mln PLN	231,8 mln PLN	8,3 %

zawarte umowy o dofinansowanie			
liczba	wartość (ogółem)	wartość (EFRR)	% realizacji zobowiązań
1	199,3 mln PLN	95,7 mln PLN	3,4 %

certyfikacja wydatków			
ogółem	wydatki kwalifikowane (ogółem)	wydatki kwalifikowane (EFRR)	% realizacji zobowiązań
7,9 mln PLN	6,2 mln PLN	6,2 mln PLN	0,2 %

Działanie IV.1 – infrastruktura drogowa (2/3)

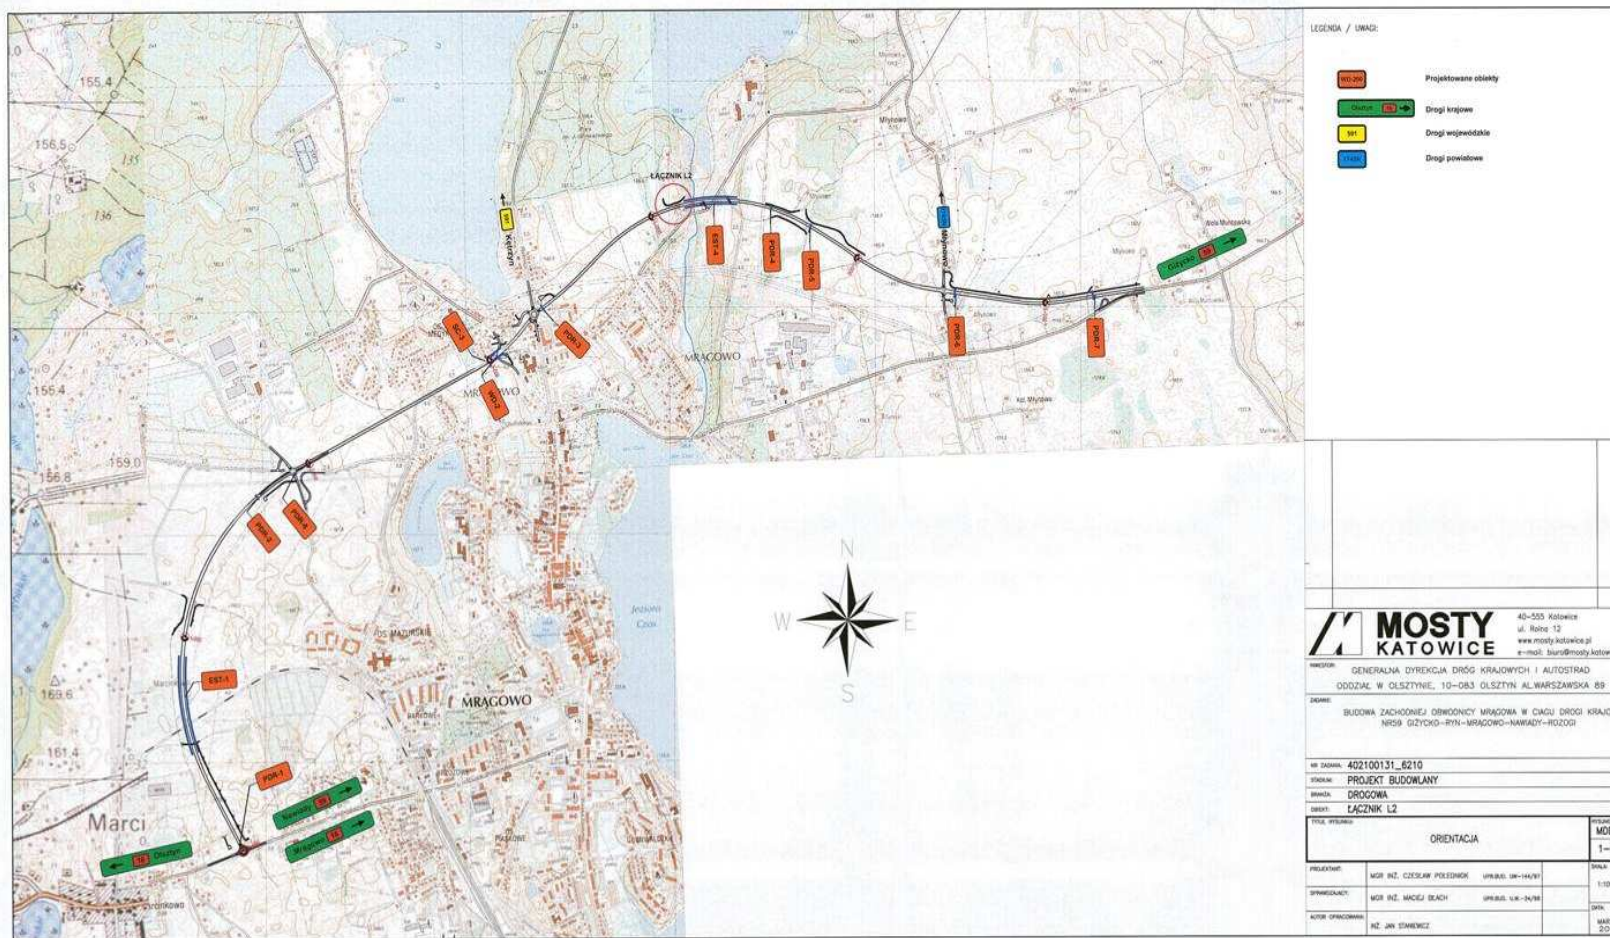

Projekt Obwodnicy Mrągowo

Projekt „Zachodnia obwodnica Mragowa w ciągu drogi krajowej nr 59” – plac budowy



Działanie IV.1 – infrastruktura drogowa (3/3)

Planowane działania:

do końca 2009 r. beneficjenci złożą:

- **7 kolejnych** wniosków o dofinansowanie
- wartość dofinansowania z EFRR: 445,1 mln PLN (ogółem 1 030,5 mln PLN)
- **16,0 %** alokacji EFRR dla IV osi priorytetowej

w 2010 r. – 10 kolejnych wniosków o dofinansowanie

w 2011 r. – 8 wniosków o dofinansowanie

V OŚ PRIORYTETOWA

Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki

Stan wdrażania na dzień 30.09.2009 r.

- 17.09.2009 r. Polska Organizacja Turystyczna złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
- wartość projektu: **24 041 176,51 PLN**
- wartość dofinansowania z EFRR: **20 435 000,03 PLN**
(100 % alokacji)
- projekt jest w trakcie oceny formalnej

Działanie V.2 Trasy rowerowe

- Opracowano ponadregionalny **przebieg trasy** przygotowany na podstawie zgłoszeń 5 województw Polski Wschodniej, który został poddany ogólnopolskim konsultacjom społecznym.
- W trybie udzielenia zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę na przygotowanie **studium wykonalności** dla projektu.
- Zawarcie umowy z wykonawcą **do końca 2009 r.** (czas realizacji zamówienia określono na 12 miesięcy).

IV. Problemy we wdrażaniu PO RPW 2007-2013 oraz podjęte działania zaradcze i działania mające na celu przyspieszenie wydatkowania

1. Problemy związane z oceną oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Zmiana polskiego systemu ocen oddziaływania na środowisko opóźniła realizację harmonogramów przygotowania projektów w ramach działania III.1 i IV.1 PO RPW

Środki zaradcze:

- IZ PO RPW uruchomiła procedurę „project pipeline” - weryfikacja prawidłowości sporządzonych przez beneficjentów dokumentów projektowych, tj. raporty o oddziaływaniu na środowisko i studia wykonalności
- IP PO RPW w zakresie ocen oddziaływania na środowisko na bieżąco weryfikuje przygotowywaną przez beneficjentów dokumentację posiłkując się zewnętrznym ekspertem

2. Opóźnienia w kontraktacji i problemy z przygotowaniem części projektów do realizacji

- problemy w realizacji procedury udzielania zamówień publicznych
- problemy prawne związane z dzierżawą nieruchomości

Podjęte działania zaradcze:

- spotkania informacyjne z beneficjentami Działania I.3
- szkolenia dla beneficjentów Działania I.4 nt. rozliczania projektów
- szkolenie dla beneficjentów działania III.1 i IV.1 dot. nowelizacji ustawy z 19 sierpnia 2008 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw*

3. Działania mające na celu przyspieszenie wydatkowania środków w ramach PO RPW

- **rozszerzenie katalogu beneficjentów mogących korzystać z zaliczek na poczet realizacji projektów** w celu umożliwienia przedsiębiorcom szerszego dostępu do środków UE
- **zasada przekazywania i rozliczania w ramach realizowanych projektów w pierwszej kolejności środków będących wkładem UE**
- **zasada rozliczania i certyfikacji do KE wydatków poniesionych w pierwszych fazach realizacji dużego projektu, jeszcze przed zatwierdzeniem tego projektu przez KE**
- **możliwość ujmowania w poświadczeniach zaliczek przekazanych przez beneficjentów wykonawcom**
- **zmiany w procedurze uruchamiania rezerwy celowej budżetu państwa** poprzez zwiększenie częstotliwości przekazywania środków
- **złagodzenie wymogów w zakresie wnoszenia przez beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu** (pod kątem wartości zabezpieczenia i okresu jego ustanowienia)

V. Duże projekty



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI




**MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO**


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Liczba i wartość dużych projektów w ramach PO RPW ze względu na ich ogólną wartość wg osi priorytetowych (w mln EUR)

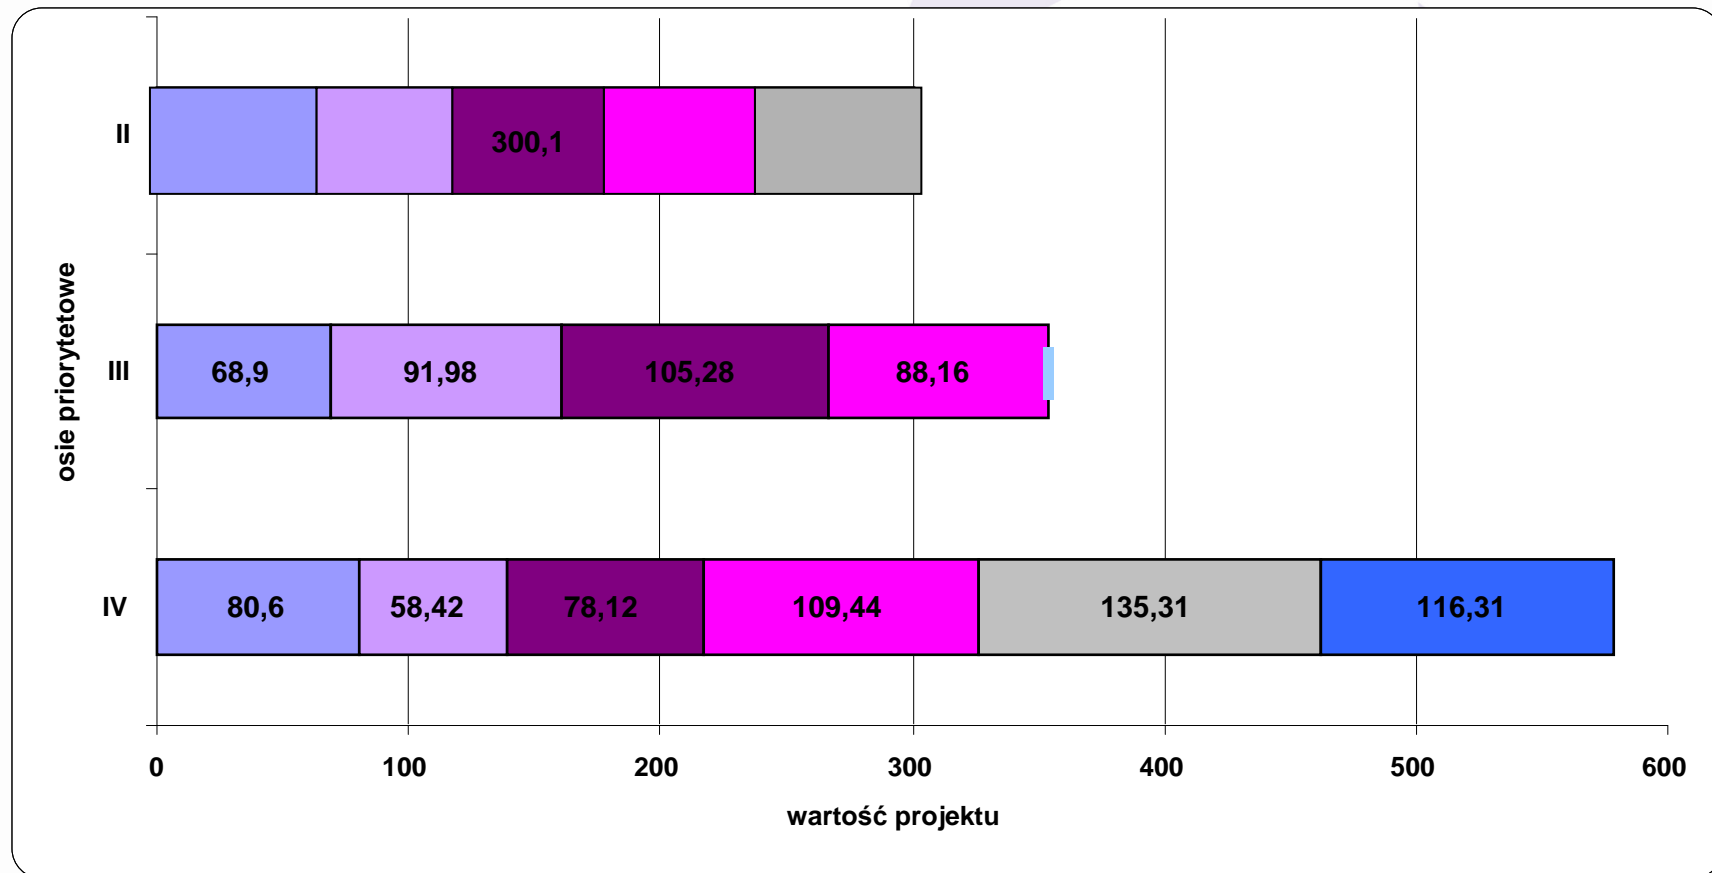

Planowane terminy przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wniesienia wkładu wspólnotowego dla dużych projektów

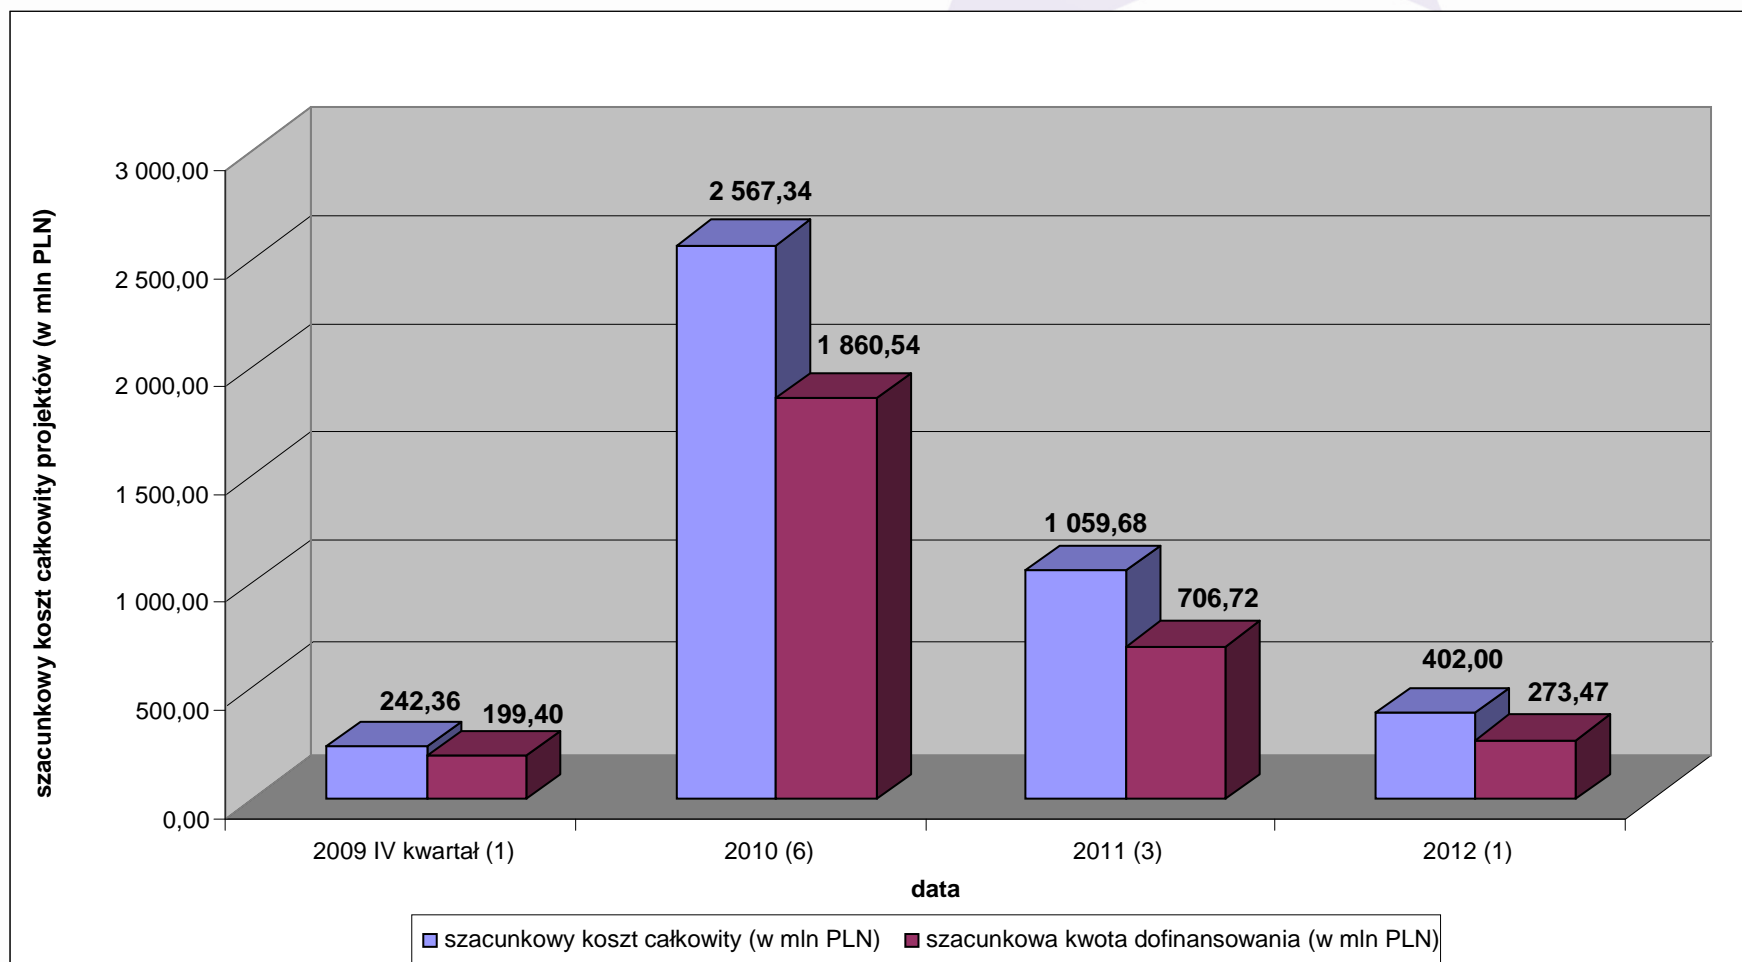

VI. Wykorzystanie pomocy technicznej oraz działania informacyjno-promocyjne w ramach PO RPW 2007-2013



Realizacja Pomocy Technicznej IZ i IP PO RPW

Wydatkowanie wg stanu na dzień 30 września 2009 r.


- **IZ PO RPW** – 971 696,10 zł
- **IP PO RPW** – 4 156 844,34 zł*

Pomoc Techniczna obejmuje m.in.:

- 1) **Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji**, w tym szkolenia indywidualne i grupowe, konferencje, studia podyplomowe
- 2) **Roczny Plan Funkcjonowania Instytucji Zarządzającej/ Pośredniczącej**, w tym wynagrodzenia, delegacje krajowe i zagraniczne, leasing, koszty usług telekomunikacyjnych, wynajmu powierzchni biurowej, koszt materiałów biurowych
- 3) **Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych**
- 4) **Roczny Plan Kosztów Realizacji PO RPW**, w tym koszty ekspertyz, oceny projektów, tłumaczeń, organizacji KM, koszty doradztwa prawnego
- 5) **Roczny Plan Kontroli**
- 6) **Roczny Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych**

* Dane z 31.08.2009 r.

Wysokość środków na realizację działań w ramach Rocznych Planów Działań PT

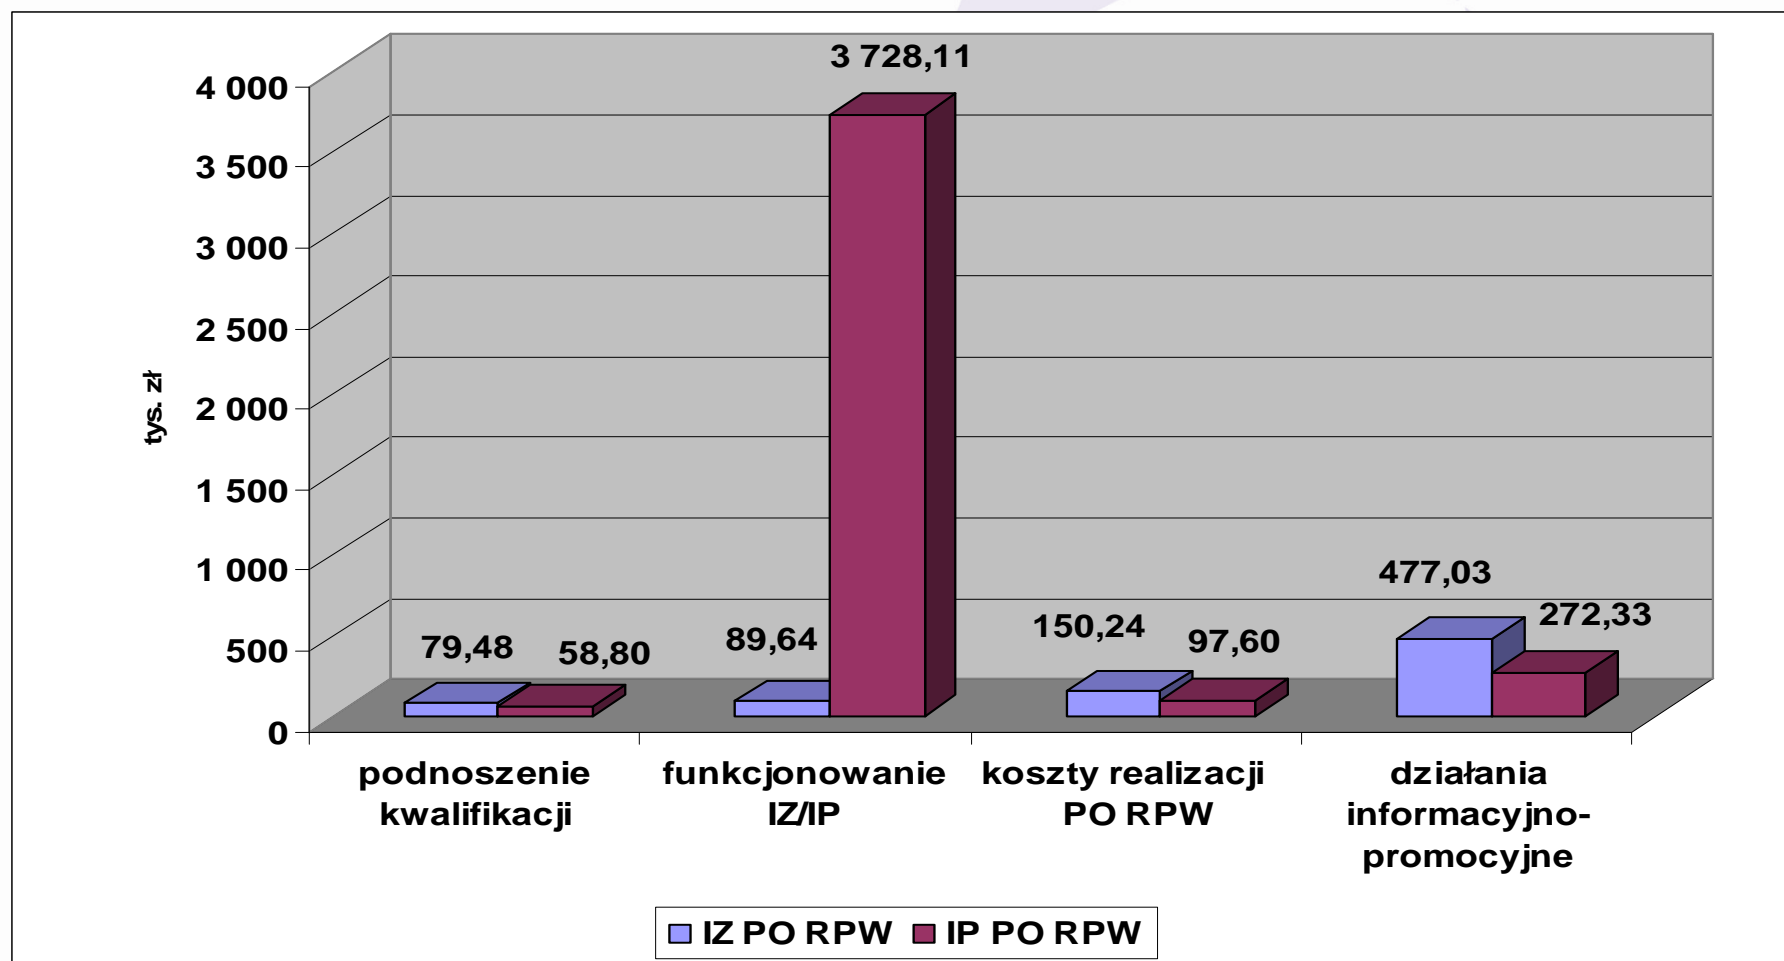

Działania informacyjno-promocyjne w ramach PO RPW

- **ogólnopolska i regionalna kampania promocyjna PO RPW**
(IV kwartał 2009 r.)
- **kampanie informacyjne** w prasie i radio o naborach do konkursów w ramach PO RPW
- **publikacje nt. PO RPW** - materiały programowe, broszury i ulotki dla beneficjentów i innych interesariuszy
np. Kryteria wyboru projektów ramach PO RPW, A na Wschodzie zmiany. Magazyn na temat realizacji PO RPW, Proces ewaluacji PO RPW. Broszura informacyjna, Sprawozdanie roczne z realizacji PO RPW w 2008 r.
- **konferencje prasowe** dot. podpisywania umów z beneficjentami
- **szkolenia dla beneficjentów**
- **dystrybucja materiałów promocyjnych PO RPW** (m.in. podczas II Forum Funduszy Europejskich)

Dziękuję za uwagę

www.polskawschodnia.gov.pl
