



# ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



ROZWÓJ  
POLSKI WSCHODNIEJ  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO

UNIA  
EUROPEJSKA



# Sprawozdanie roczne za 2008 r. z realizacji PO RPW 2007-2013

Agnieszka Kapciak  
Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych  
IZ PO RPW

Komitet Monitorujący PO RPW 2007-2013  
19 czerwca 2009 r.

- W sprawozdaniu rocznym IZ PO RPW uwzględniono dane zawarte w sprawozdaniu rocznym Instytucji Pośredniczącej (IP) PO RPW
- Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez Instytucję Koordynującą NSRO (IK NSRO) – wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w wersji przedłożonej członkom KM PO RPW
- W prezentacji uwzględniono także najbardziej aktualne dane na temat wdrażania PO RPW – stan na koniec maja br.

# SPIIS TREŚCI

## **I. System instytucjonalny PO RPW**

I.1. Audyt zgodności dla PO RPW

I.2. Rozporządzenia dla PO RPW

I.3. Zmiany w Programie, Uszczegółowieniu i na LPI  
PO RPW

## **II. Stan wdrażania PO RPW wg Osi**

## **III. Zidentyfikowane problemy we wdrażaniu PO RPW**

## **IV. Uproszczenia w systemie wdrażania PO RPW**

# I. System instytucjonalny PO RPW

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.1. Audyt zgodności

- Rozpoczęcie audytu zgodności PO RPW – 4 stycznia 2008 r.
- Instytucja Audytowa oceniła, że system zarządzania i wdrażania PO RPW zapewnia właściwą realizację PO RPW, ale dodatkowo zaleciła:
  - opracowanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania I.2,
  - zapewnienie funkcjonalności systemu LSI zlokalizowanego w IP,
  - uzupełnienie wzoru umowy o dofinansowanie o sankcje – korekty finansowe związane z nie przestrzeganiem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszystkie zalecenia IA zostały wdrożone przez IP i IZ w okresie sprawozdawczym.

- Zakończenie z wynikiem pozytywnym w lutym 2009 r.

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.2. Rozporządzenia dla PO RPW

### Prace nad rozporządzeniami w okresie sprawozdawczym

#### **Rozporządzenie ogólne**

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO RPW 2007-2013 r.

**Weszło w życie w dniu 21 października 2008 r.**

Dz. U. 2008 Nr 187, poz. 1152, dzięki czemu jest możliwe składanie wniosków o dofinansowanie oraz podpisywanie umów przez beneficjentów

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.2. Rozporządzenia dla PO RPW cd.

### Prace nad rozporządzeniami w I półroczu 2009 r.

#### Działanie I.3

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach PO RPW 2007-2013 stanowiące program pomocowy.

**Weszło w życie w dniu 4 marca 2009 r.**, dzięki czemu jest możliwe składanie wniosków o dofinansowanie oraz podpisywanie umów przez beneficjentów (Dz. U. 2009 Nr 34, poz. 271)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach PO RPW 2007-2013.

**Weszło w życie w dniu 8 maja 2009 r.**, dzięki czemu jest możliwe składanie wniosków o dofinansowanie oraz podpisywanie umów przez beneficjentów (Dz. U. 2009 nr 70, poz. 604)

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.2. Rozporządzenia dla PO RPW cd.

### Działanie I.4

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach PO RPW 2007-2013.

**Weszło w życie w dniu 16 marca 2009 r.**, dzięki czemu jest możliwe składanie wniosków o dofinansowanie oraz podpisywanie umów przez beneficjentów (Dz. U. 2009 Nr 61, poz. 503)

### Działanie III.2

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach PO RPW 2007-2013.

**Weszło w życie w dniu 10 lutego 2009 r.**, dzięki czemu jest możliwe składanie wniosków o dofinansowanie oraz podpisywanie umów przez beneficjentów (Dz. U. 2009 Nr 21, poz. 117)

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.3. Zmiany w Programie

27 kwietnia 2009 r. projekt zmian w PO RPW został zaakceptowany przez Radę Ministrów, a następnie przesłany do akceptacji przez Komisję Europejską.

Zmieniony dokument wejdzie w życie po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską.

Zmiana dot. zakresu wsparcia z funduszy kapitału zaangażowanego (seed capital) na wsparcie systemu re-poręczeń.

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.3. Zmiany w Uszczegółowieniu PO RPW

### Prace nad uszczegółowieniem w okresie sprawozdawczym

**Zmiana „Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla PO RPW 2007-2013”** (dokument zatwierdzono 27 października 2008 r.).

Zmiany były spowodowane m.in.:

- koniecznością doprecyzowania opisu niektórych działań PO RPW, ( I.4 Promocja i Współpraca i V.2 Trasy rowerowe)
- aktualizacją LPI
- zmianami Wytycznych MRR i wymagań w zakresie ochrony środowiska

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.3. Zmiany w Uszczegółowieniu PO RPW

### Prace nad uszczegółowieniem w I półroczu 2009 r.

**Zmiana „Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla PO RPW 2007-2013”** (dokument zatwierdzono 27 kwietnia 2009 r.).

Zmiany były spowodowane m.in.:

- modyfikacją formuły przeprowadzania konkursów w ramach PO RPW,
- aktualizacją procedury odwoławczej projektów wybieranych w trybie konkursowym zgodnie ze zmienioną ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr. 227, poz. 1658, z późniejszymi zmianami).

Trwają prace nad kolejną wersją dokumentu, wynikające ze zmian w programie operacyjnym, zaakceptowanych przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia br. Wejście w życie nowej wersji nastąpi po zaakceptowaniu zmian w PO RPW przez Komisję Europejską.

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.3. Zmiany na LPI

### Prace nad zmianą LPI w okresie sprawozdawczym

**I aktualizacja z dnia 19 lutego 2008 r., w wyniku której:**

- **zaktualizowano informacje o projektach**  
(weryfikacja opisów projektów, ich tytułów i nazw beneficjentów oraz wartości),
- **wskazano beneficjentów projektów promocyjnych,**  
tj. promocji gospodarczej oraz promocji turystycznej Polski Wschodniej.

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.3. Zmiany na LPI cd.

### II aktualizacja z dnia 31 lipca 2008 r. w wyniku której:

- **usunięto 2 projekty (I Oś Priorytetowa):**
  - „Przygotowanie terenów pod inwestycje „Track-Wschód” zgłoszony do realizacji przez Gminę Olsztyn
  - „Budowa części C Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Naukowego Centrum Badawczo Rozwojowego Politechniki Białostockiej wraz wyposażeniem laboratoryjnym”  
(Zakres powyższego projektu zostanie zrealizowany w ramach projektu: „Centrum nowoczesnego kształcenia Politechniki Białostockiej” zgłoszony do realizacji przez Politechnikę Białostocką)
- **zaktualizowano informacje o projektach**  
(weryfikacja opisów projektów, ich tytułów i nazw beneficjentów oraz wartości)

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.3. Zmiany na LPI cd.

### Prace nad zmianą LPI w I półroczu 2009 r.

**III aktualizacja z dnia 28 stycznia 2009 r.** była spowodowana rezygnacją dwóch beneficjentów z realizacji projektów:

- „Przygotowanie terenów pod inwestycje na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" - Podstrefa Starachowice, (Wnioskodawca – Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”)
- „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych” (Wnioskodawca – Gmina Starachowice).

# I. System instytucjonalny PO RPW

## I.3. Zmiany na LPI


### Prace nad LPI w I półroczu 2009 r.

#### **IV aktualizacja - w trakcie**


- do 29 czerwca 2009 r. trwają konsultacje społeczne związane z wpisaniem nowych projektów na LPI
- trwa weryfikacja danych o projektach, tj. przegląd stanu przygotowania projektów oraz weryfikacja informacji o projektach w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie

## 2. Stan wdrażania PO RPW wg Osi


# Liczba złożonych i zatwierdzonych wniosków oraz podpisanych umów od początku realizacji programu wg Osi Priorytetowych stan na maj 2009 r.

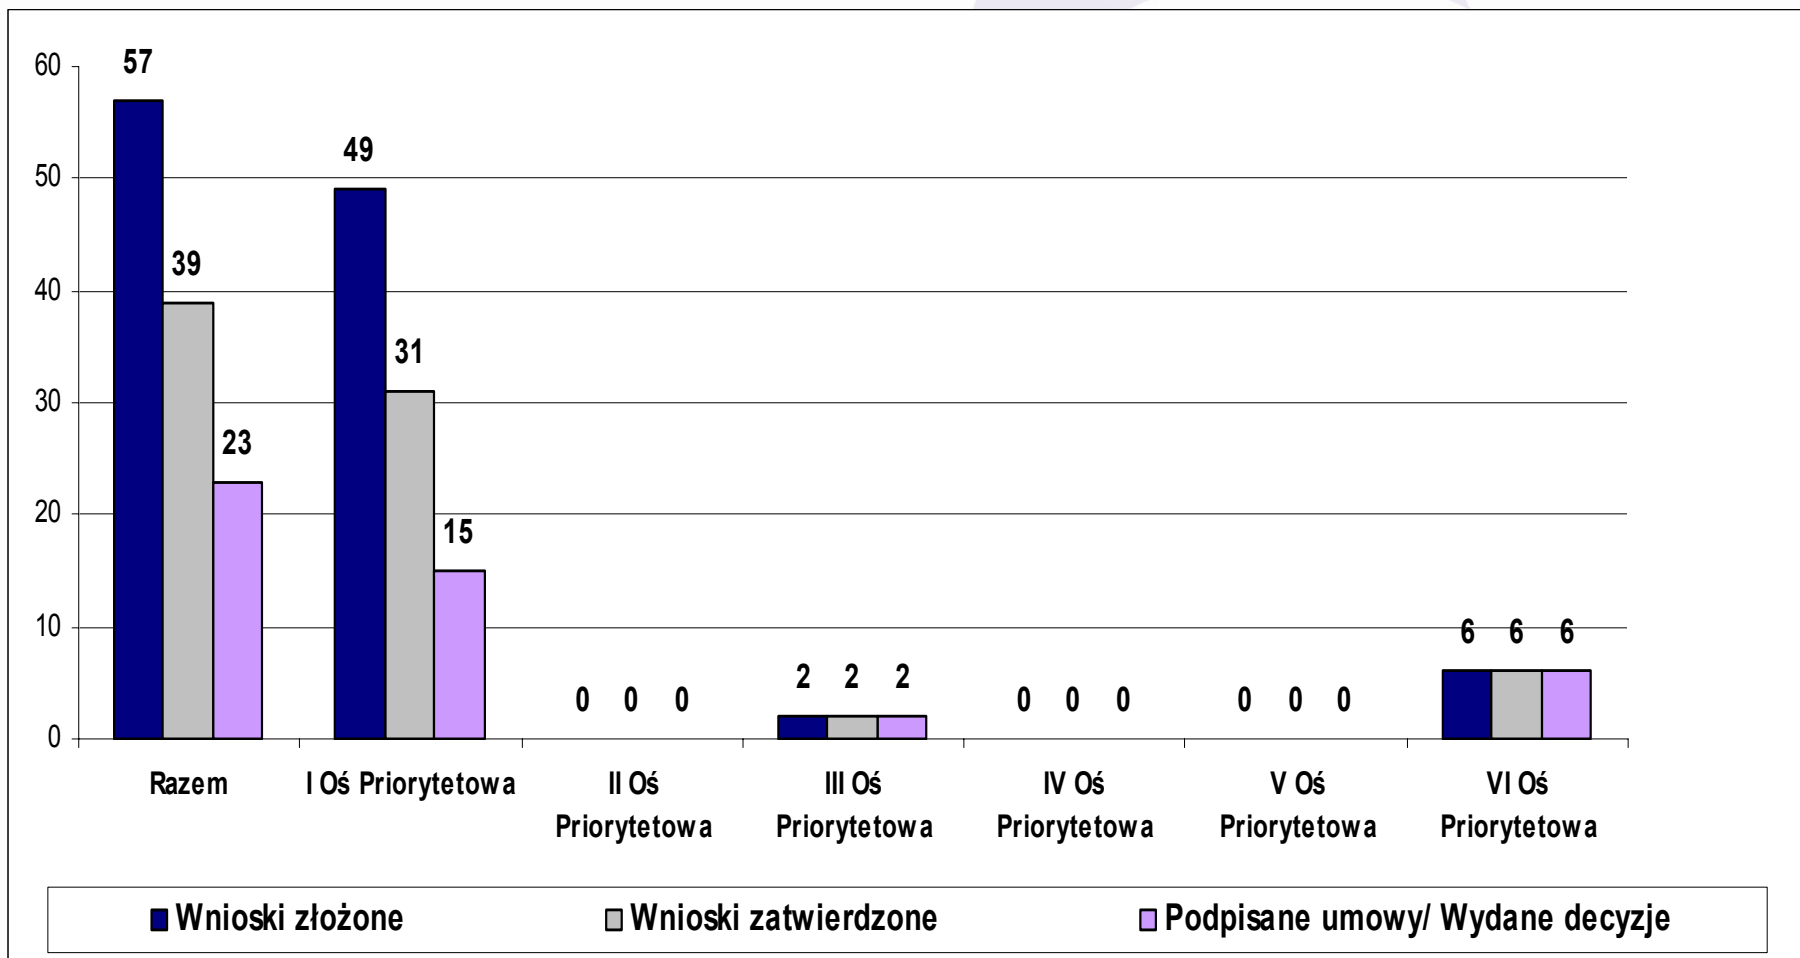


# Wartość złożonych i zatwierdzonych wniosków oraz podpisanych umów od początku realizacji programu wg Osi Priorytetowych (w mln PLN w EFRR) stan na maj 2009 r.

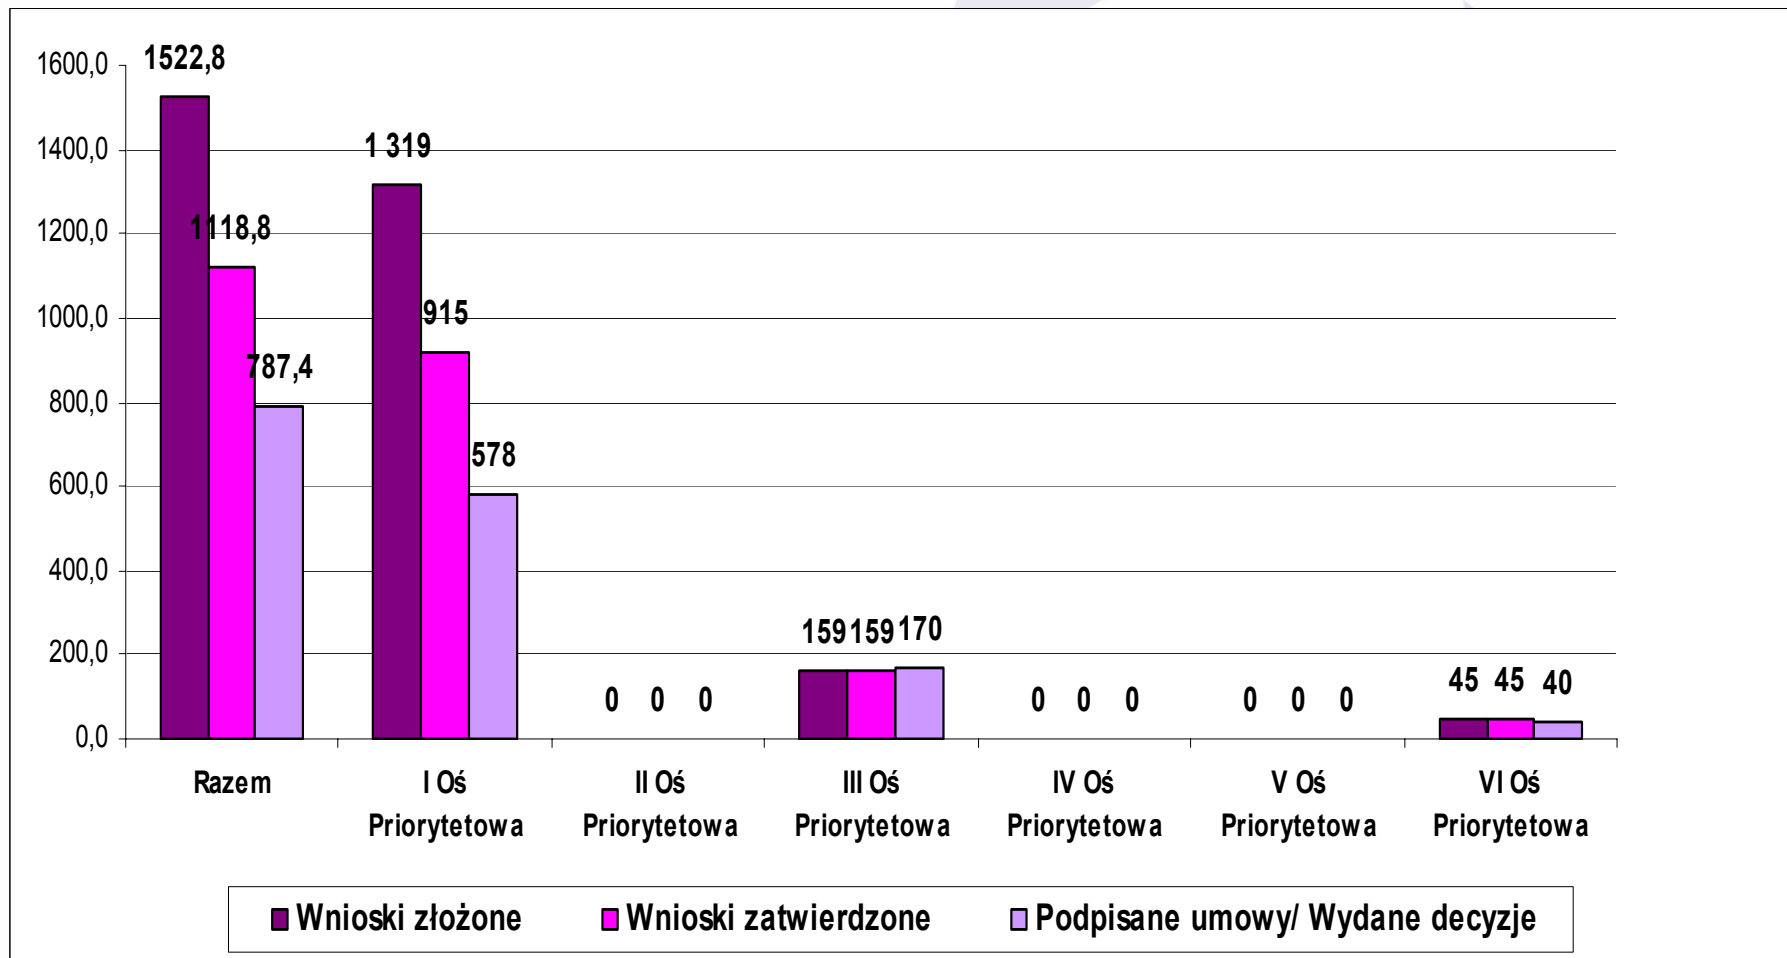

## Liczba złożonych i zatwierdzonych wniosków oraz podpisanych umów od początku realizacji programu wg województw do maja 2009 r. (Osie Priorytetowe I-V)

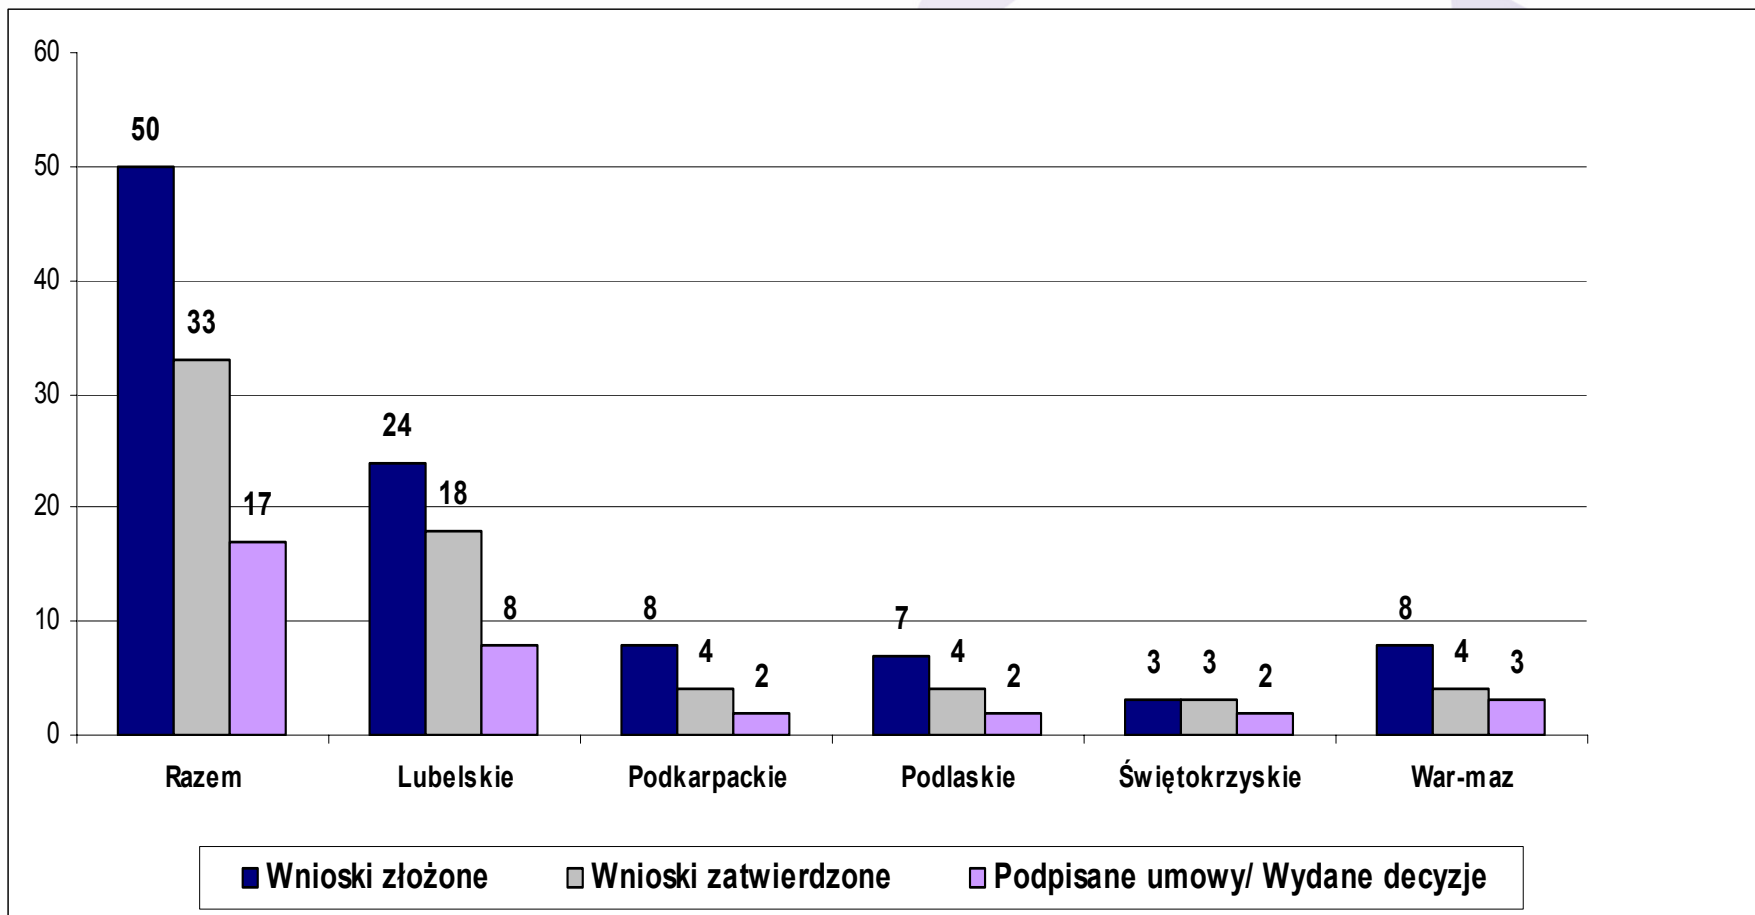

# Wartość złożonych i zatwierdzonych wniosków od początku realizacji programu do końca maja wg województw (w mln PLN z EFRR) (Osie Priorytetowe I-V)

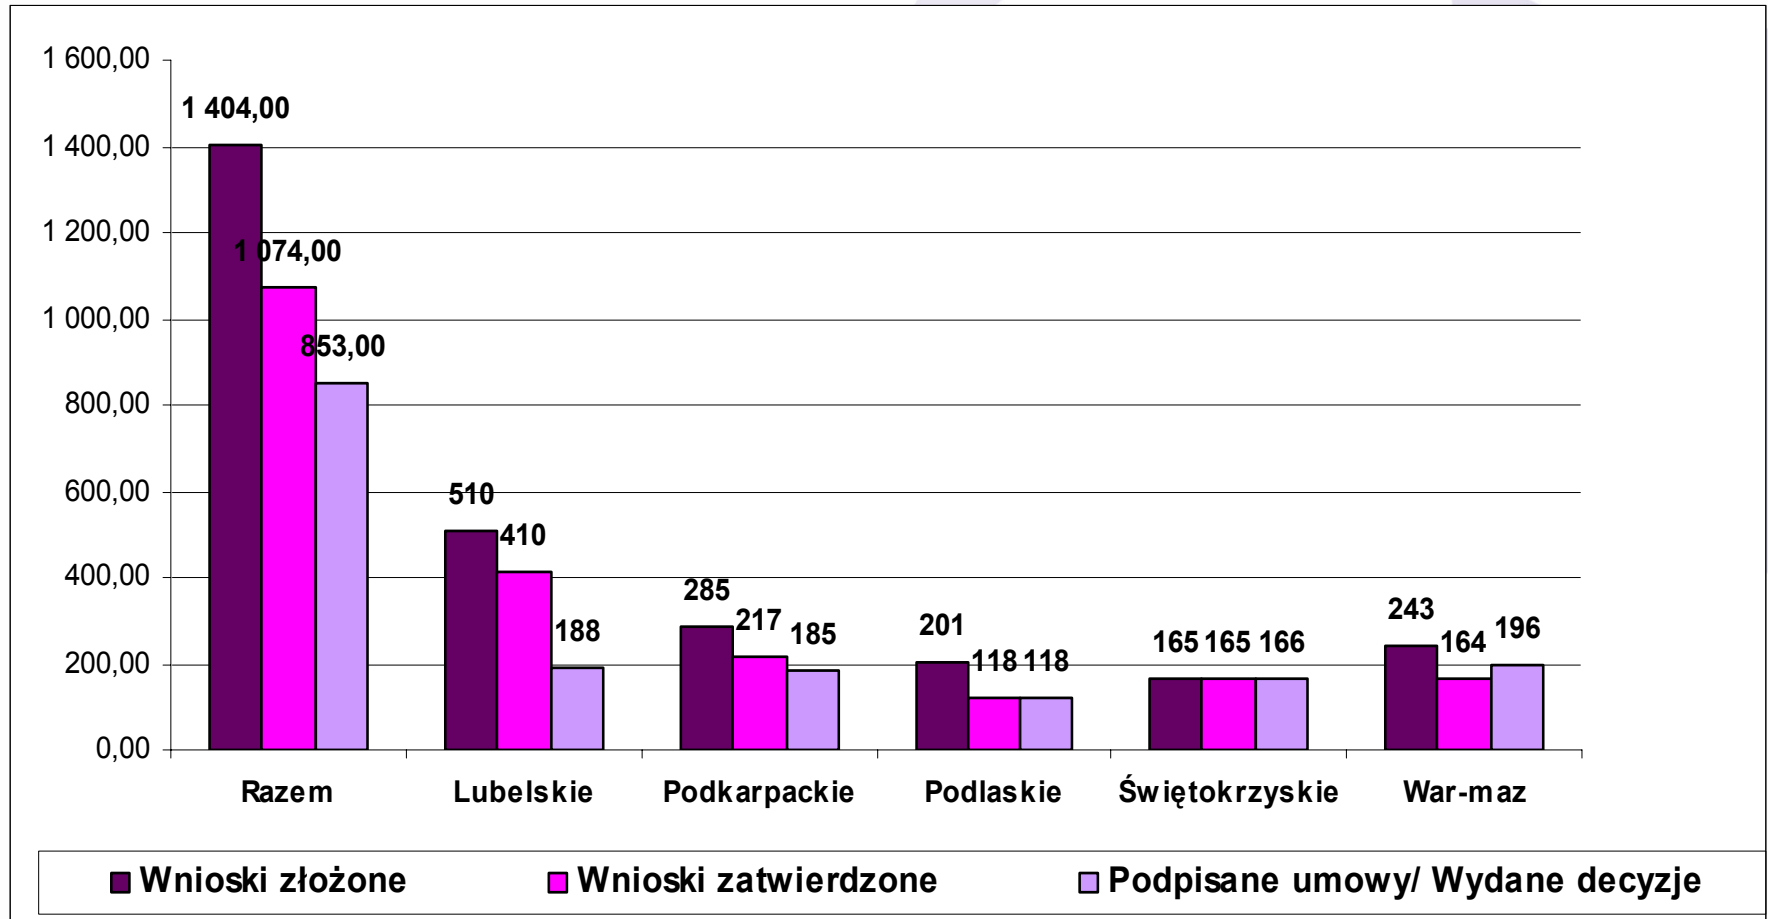

# Oś priorytetowa I

- I. prace nad projektem kompleksowym „**Promocja gospodarcza Polski Wschodniej**”
  - podpisanie pre-umowy pomiędzy IP PO RPW a beneficjentem - Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiZ)
  - wartość projektu wg pre-umowy wynosi 13 165 345,47 EUR z EFRR (54 714 500,00 PLN), co stanowi 1,67 % realizacji zobowiązań UE na poziomie I osi priorytetowej
  - 26 marca 2009 r. PAIiZ złożył wniosek o dofinansowanie
- II. ogłoszenie konkursów:
  - dla działania I.3 (od 6 marca do 30 września br.)
  - dla działania I.4 (od 20 kwietnia do 30 czerwca br.)

# Oś priorytetowa II

- I. prace nad projektem kompleksowym „**Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego**”
  - realizacja inwentaryzacji w wyniku której powstał atlas dostępnych zasobów i planowanych inwestycji komercyjnych pod kątem zasięgu i dostępności, co posłuży do wyznaczenia listy powiatów objętych interwencją.
  - prace nad I etapem studium wykonalności projektu do końca 2008 r. (odebrano w 20 stycznia 2009 r.)
  - powołanie **Grupy Roboczej** ds. Wdrażania Działania II.1 „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” PO RPW, w skład której wchodzi przedstawiciele: IZ PO RPW, IP PO RPW, IZ RPO z Urzędów Marszałkowskich oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

# Oś priorytetowa II

- prace nad II etapem studium wykonalności
  - szczegółowe studia dla obszarów objętych projektem,
- przygotowanie projektu Porozumienia w sprawie podziału kompetencji we wdrażaniu projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" pomiędzy : IZ - IP - Samorządami Województw Polski Wschodniej,
- Konsultacje z KE w zakresie pomocy publicznej

# Oś priorytetowa III

## Prace w I półroczu 2009 r.

- I. złożono 3 wnioski o dofinansowanie dla projektów z działania III.1 i III.2
- II. do 30 czerwca br. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym (działanie III.1)
- III. podpisano 2 umowy:
  - 26 marca br. - Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku -Etap II (działanie III.1)
  - 19 maja br. - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego (działanie III.2)

## Oś priorytetowa IV

I. Prace nad oceną dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie (Studia Wykonalności i Raporty Ocen Oddziaływania na Środowisko) w ramach *Project Pipeline* (9 projektów).

Zgodnie z harmonogramem do końca czerwca 2009 r. beneficjenci zadeklarowali złożenie 2 wniosków.

# Oś priorytetowa V

I. Trwają prace nad 2 projektami kompleksowymi:

## 1. „Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki”

- podpisanie pre-umowy między IP PO RPW a beneficjentem – Polska Organizacją Turystyki (POT) w dniu 21.05.2008 r.
- wartość projektu wg pre-umowy wynosi 4 169 902,33 EUR z EFRR (17 282 000,00 PLN), co stanowi 8,78% realizacji zobowiązań UE na poziomie osi priorytetowej V.
- złożenie wniosku o dofinansowanie planowane do końca czerwca 2009 r.

# Oś priorytetowa V

Polska Organizacja Turystyki zrealizowała:

- Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej (część analityczna)
- Badanie postaw i opinii wobec potencjału turystycznego Polski Wschodniej
- Rozpoczęcie procesu wyłaniania wykonawcy koncepcji kreatywnej i kreacji multimedialnej kampanii promującej atrakcyjność turystyczną wschodnich województw Polski Wschodniej (wraz z opcją wdrożenia kampanii)

## 2. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”

- podpisano pięć trójstronnych porozumień określających podział kompetencji między IZ PO RPW, beneficjentami (5 województw Polski Wschodniej) oraz IP PO RPW
- na podstawie ww. porozumień powołano Grupę Roboczą ds. realizacji działania, w ramach której przeanalizowano:
  - przebieg tras wraz ze sprawozdaniem z konsultacji lokalnych dotyczących wytyczania tras,
  - informacje o udostępnionych atrakcjach turystycznych na trasach rowerowych
- w efekcie prac Grupy:
  - przygotowano ewidencję lokalnych tras i ścieżek w poszczególnych województwach
  - skonsultowano „Standardy techniczne budowy i oznakowania szlaków rowerowych”

# Oś priorytetowa V

- Przygotowano następujące dokumenty:
  - „Zalecenia dotyczące Standardów technicznych budowy i oznakowania tras rowerowych w ramach Działania V.2 PO RPW”
  - „Zarys modelu przygotowania i realizacji projektów w ramach Działania V.2 PO RPW”
- Opracowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przez MRR przetargu na realizację **studium wykonalności** dla projektu oraz wstępne założenia do portalu internetowego oraz koncepcji działu edukacyjnego portalu „Rowerowa Polska Wschodnia”

# Oś priorytetowa VI

## I. Realizacja Roczego Planu Działania IZ i IP PO RPW poprzez:

- realizację działań informacyjno-promocyjnych
- pokrycie kosztów ewaluacji
- podnoszenie kwalifikacji pracowników
- pokrycie wydatków na funkcjonowania IZ i IP (np. wynajmem powierzchni biurowej)
- pokrycie kosztów realizacji PO RPW (wykonanie ekspertyz, analiz, koszty tłumaczeń, obsługa prawna, organizacja Komitetu Monitorującego)

# Oś priorytetowa VI

W okresie sprawozdawczym odnotowano pierwsze efekty rzeczowe

Nazwa wskaźnika	Wartość osiągnięta od początku programu	Wykonanie wartości docelowej na 2013 r.
Liczba spotkań, seminariów, szkoleń i konferencji (szt.)	86	30%
Liczba wykonanych ekspertyz, analiz, badań, studiów i ocen (szt.)	14	6%
Liczba stanowisk współfinansowanych z pomocy technicznej (szt.)	52,53	95,5%
Liczba publikacji i materiałów promocyjnych ze środków PO RPW (szt.)	17538	3,5%

# III. Zidentyfikowane problemy we wdrażaniu PO RPW

# III. Zidentyfikowane problemy we wdrażaniu PO RPW

Zmiana polskiego systemu ocen oddziaływania na środowisko wpłynęła na przygotowanie projektów w ramach działań I.1, III.1 i IV.1

## **Środki zaradcze:**

szkolenia dla beneficjentów działań III.1, IV.1 oraz V.2.

# IV. Uproszczenia w systemie wdrażania PO RPW

## IV. Uproszczenia w systemie wdrażania

- Dopuszczenie przedkładania tzw. dużych projektów realizowanych w formule „żółtego” i „czerwonego” FIDIC-a do zatwierdzenia KE, w których nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę
- Dopuszczenie przedkładania wniosku o dofinansowanie do oceny przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
- Dopuszczenie certyfikowania do KE wydatków kwalifikowalnych beneficjentów w ramach tzw. dużych projektów przed faktycznym zatwierdzeniem tych projektów przez KE

## IV. Uproszczenia w systemie wdrażania (cd.)

- Wprowadzenie zasad przyspieszających zatwierdzanie i rozliczanie projektów w ramach PO RPW:
  - maksymalny i nieprzekraczalny termin na ocenę wniosków o dofinansowanie od momentu zakończenia konkursu do momentu ogłoszenia wyników, tj. **90 dni** kalendarzowych
  - beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w danym kwartale w bieżącym lub maksymalnie kolejnym wniosku beneficjenta o płatność

## IV. Uproszczenia w systemie wdrażania (cd.)

- Wprowadzenie zasad przyspieszających zatwierdzanie i rozliczanie projektów w ramach PO RPW:
  - Ocena wniosków beneficjenta o płatność w terminie maksymalnie **60 dni** kalendarzowych od momentu jego złożenia przez beneficjenta
  - Rozliczenie wniosku beneficjenta o płatność oraz załączenie go do deklaracji i poświadczenia wydatków z IZ do Instytucji Certyfikującej w terminie **60 dni** kalendarzowych od dnia wprowadzenia wniosku o płatność do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13)

## IV. Uproszczenia w systemie wdrażania (cd.)

Umożliwienie beneficjentom przekazywania i rozliczania w pierwszej kolejności środków UE, a dopiero później wkładu własnego. Rozwiązanie to pozwoli wykorzystać środki unijne i zminimalizuje konieczność pożyczania bądź wykorzystywania środków własnych na początku realizacji projektu.

## IV. Uproszczenia w systemie wdrażania (dok.)

Wprowadzenie zmiany we *Wzorce poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC* w celu umożliwienia ujmowania w poświadczeniach zaliczek przekazanych przez beneficjentów wykonawcom

*Dziękuję za uwagę*
